

DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Obalno-kraška

Število projektov v dogovoru:	14
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	1
Višina dodeljenih sredstev:	22.025.858,95 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	689.320,00 EUR

Črpanje (real/plan):

3%

Projekti zelo zamujajo

36% v časovnici

15.01.2026

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real
1.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	689.320,00
2.	RSO2.5 - OČOV	3	7.520.160,78	0,00
3.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	5	6.437.558,11	0,00
4.	RSO3.2 - KOLESARKE	3	6.181.068,06	0,00
5.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	348.800,00	0,00
SKUPAJ		14	22.025.858,95	689.320,00

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Hrpelje-Kozina	1	2.163.050,56	0,00
Mestna občina Koper	1	4.061.275,06	0,00
Mestna občina Koper, Občina Ankaran	1	1.295.835,16	0,00
Občina Izola	2	2.061.315,96	0,00
Občina Komen	1	2.478.901,41	0,00
Občina Piran	3	3.754.728,80	0,00
Občina Sežana	2	4.323.680,00	0,00
REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER	1	1.538.272,00	689.320,00
RRC Koper	2	348.800,00	0,00
SKUPAJ	14	22.025.858,95	689.320,00

Predvideno črpanje po letih

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	168.395,80	191.056,20	359.452,00	121.900,80	182.851,20	304.752,00	84,8 %
2025	966.426,80	384.892,97	1.351.319,77	153.827,20	230.740,80	384.568,00	28,5 %
SKUPAJ	15.776.612,37	6.249.246,58	22.025.858,95	275.728,00	413.592,00	689.320,00	3,1 %

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2026	6.266.204,39	2.412.537,75	8.678.742,14	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	4.137.619,62	1.944.274,63	6.081.894,25	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	2.564.990,31	920.424,47	3.485.414,78	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	1.672.975,45	396.060,56	2.069.036,01	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	15.776.612,37	6.249.246,58	22.025.858,95	275.728,00	413.592,00	689.320,00	3,1 %

Projekt 1: Ozelenitev SV dela Izole



Občina izvajanja projekta: Izola
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.595.346,68 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je vzpostaviti zeleni koridor v SV delu mesta Izole, da bi zmanjšali “vroče točke” v mestu in nadomestiti določena drevesa z drugimi na območju blokovskih in drugih naselij.

Zamuda pri projektu	
Datum:	13.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamik zaradi priprave PZI in izpolnjevanja vloge NPO (nova navodila za pripravo proj. dokumentacije).

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	797.673,34	0,00	0,00 %
SLO	797.673,34	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.595.346,68 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Izbor izvajalca del po potrditvi dokumentacije, predvidoma do 28. 2. 2026. Izvedba del predvidoma od 1. 3. 2026 do 31. 12. 2027. Popolna projektna dokumentacija in vloga NPO predvidoma oddano do 31. 12. 2025.
- 13.01.2026:
Doponjevanje PZI in vloge NPO. Predvidena oddaja do konca februarja 2026. Predvidena črpanja se v 2025 premakne v 2026, ostalo predvidoma znotraj predvidenega obsega.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano


V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Projekt 2: Športni park Portorož



Občina izvajanja projekta: Piran
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.156.409,93 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen ureditve parka je zagotoviti kakovostno izkušnjo tako za prebivalce urbanih naselij Portorož in Lucija, ostalih naselij Občine Piran kot tudi za obiskovalce in turiste. Zaradi specifične vsebine bo park privlačen za športnike in rekreativce, hkrati pa bo služil kot prostor za rekreacijo ter medgeneracijsko druženje.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	578.204,96	0,00	0,00 %
SLO	578.204,97	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.156.409,93 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Predviden zamik M2 v januar, ker čakajo odločbo MNVP. Izbor izvajalca zaključen, podpisana pogodba z izvajalcem. 3. 11. 2025 začetek del, zaključek predviden 30. 3. 2026. Predvideno črpanje sredstev v začetku leta 2026.
- 13.01.2026: Vloga NPO oddana na PT v začetku septembra 2025, prejeli v dopolnitev. Popravek poslali v ponoven pregled. Predvidena oddaja popolne vloge NPO do konca januarja 2026. Čakajo še soglasje DRSV. Projekt je v fazi zaključevanja z deli. Črpanje v skladu s predvideno napovedjo.

Časovni vidik izvedbe projekta


Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M9 50% izvedbe
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (30.01.2026)

Projekt 3: Zelene oaze mesta Sežana



Občina izvajanja projekta: Sežana

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 2.720.600,00 €

Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Za zagotavljanje kakovostnih zelenih površin v Sežani je pomembno njihovo celovito urejanje. Prebivalcem želimo zagotoviti dovolj zelenih površin, ki bodo kakovostne, večfunkcionalne in medsebojno povezane ter slednje tudi dobro upravljati in vzdrževati. Projekt “Zelene oaze mesta Sežana” pomeni zeleno preobrazbo mesta, ki vključuje predvsem hortikulturno ureditev ter povečanje privlačnosti z izboljšanjem dostopnosti in nadgradnjo uporabnosti šestih zelenih površin v Sežani, pri čemer se bomo v prvi fazi, ki je predmet tega projekta, osredotočili na pet lokacij. Projekt vključuje celotno ureditev parka Stari grad, hortikulturno ureditev Spominskega parka, hortikulturno ureditev in nadgradnjo uporabnosti parka na Lenivcu, celotno ureditev parka pri Vinakras in obnovo rastlinjaka v Botaničnem vrtu Sežana. Obenem bo vzpostavljena “Sežanska oz. mestna zelena pot”, ki bo v povezovala vseh šest zelenih površin. Z ekološkega vidika bo projekt prispeval k izboljšanju kakovosti človekovega okolja (varovanje in zagotavljanje kakovosti zraka, zvočnega okolja in ugodnih klimatskih razmer v mestu) in naravnega okolja v Sežani (zagotavljanje biodiverzitete ter ustreznih pogojev za ohranjanje naravnih kakovosti območij ter ustreznih življenjskih okolij, habitatov rastlin in živali). Predvsem želimo prispevati k ustvarjanju pogojev za ekološko ravnanje v širšem prostoru Sežane, za kakovost bivalnega okolja ter drugih z urbano ekologijo povezanih procesov. S socialnega vidika bo projekt prispeval k povečanju izkoriščanja koristi zelenih površin do ljudi za zadovoljitev socialnih, rekreacijskih, kulturnih, duhovnih in drugih potreb, povezanih z zadovoljstvom, zdravjem in dobrim počutjem ter identiteto okolja. Z morfološkega vidika bo projekt prispeval k sooblikovanju mestnega prostora. Predvsem z medsebojno povezanostjo posameznih zelenih površin se bo prispevalo k izoblikovanju prostorske strukture, podobe in identitete Sežane. Z ekonomskega vidika bo projekt prispeval k povečevanju ekonomske privlačnosti in vrednosti tako Sežane kot tudi širšega mestnega okoliša. Urejene zelene površine bodo namreč povečale privlačnost okolja za bivanje, kar lahko vpliva na višjo vrednost nepremičnin. Deli mesta s primerno urejenimi večfunkcijsko uporabnimi zelenimi površinami in odprtimi prostori bodo tudi bolj privlačni za izvajanje poslovnih dejavnosti, saj lahko ustvarjajo večji pretok uporabnikov storitev. Kakovostne zelene površine bodo vplivale tudi na konkurenčnost mesta, saj lahko ponujajo višjo kakovost bivanja in pritegnejo bolj izobraženo delovno silo. Zelene površine pa bodo koristile tudi za posebnim urbanim dejavnostim, npr. turizmu in povezanim aktivnostim (športne dejavnosti, festivali, gastronomija ipd.). Urejena bo površina v izmeri 2,3 ha. Do površine bo imelo neposredno dostop 5.580 prebivalcev, posredno pa veliko več (še najmanj 8.259); skupaj: 13.839 prebivalcev občine Sežana.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.360.300,00	0,00	0,00 %
SLO	1.360.300,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.720.600,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Popolna projektna dokumentacija predvidoma do 31.01.2026 in oddaja vloge NPO predvidoma do 30. 3. 2026. Začetek del 1. 6. 2026. Do 30. 6. 2028 predviden zaključek projekta. Izbor izvajalca do 1. 5. 2026.

- 13.01.2026:
PZI še v izdelavi, ne bo končana do 31.1.2026, predvidoma pridobitev popolne projektne dokumentacije do oddaje vloge NPO 30.3.2026. Črpanje v 2026 se poveča iz 100.000,00 EUR na 323.282,00 EUR - popravek finančnega plana.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 4: Ureditv zunanjega šolskega prostora OŠ Livade Izola za vse



Občina izvajanja projekta: Izola
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 465.969,28 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

S projektom se bo preuredilo zunanji prostor OŠ Livade, na katerem je bilo ugotovljenih več pomanjkljivosti. Vanj se bo umestilo nove vsebine, ki bodo otroke spodbudile h gibanju, k druženju in raziskovanju prostora. Predvidena je postavitve zelene učilnice na prostem z zeleno streho.

Zamuda pri projektu	
Datum:	13.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamik zaradi priprave popolne vloge NPO na PT.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	232.984,64	0,00	0,00 %
SLO	232.984,64	0,00	0,00 %
SKUPAJ	465.969,28 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
PZI pripravljen in se dopolnjuje. Do 30. 11. 2025 predvidena oddaja NPO. GD že pridobljeno. Predvidoma izbor izvajalca do maja 2026, projekt končan do konca leta 2026 (za izvedbo potrebujejo 5 mesecev).
- 13.01.2026:
Oddana nepopolna vloga NPO 9.12.2025, trenutno v pregledu pri PT, pričakujejo dopolitve. Do 30.1.2026 predvidena oddaja popolne vloge.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Oddaja NPO na PT
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

V zamudi

Projekt 5: KP in cesta ob Jernejevem kanalu



Občina izvajanja projekta: Piran
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 2.099.086,65 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

V okviru projekta se bo uredilo odsek državne kolesarske povezave D6 – Pot zdravja in prijateljstva – Parenzana v občini Piran čez rt Seča in vzdolž Jernejevega kanala. Kolesarska povezava na tem delu ne poteka po kolesarski stezi ali pasu, temveč si kolesarji delijo prostor s pešci in motornim prometom. Po zaključku del bo na novo urejenega 2,591 km kolesarske povezave.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.784.223,65	0,00	0,00 %
SLO	314.863,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.099.086,65 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Projektna dokumentacija izdelana 30. 9. 2025. Oddaja NPO predvidoma do 31. 12. 2025. GD ni potrebno. Predviden izbor izvajalca do 1. 1. 2027. Izvedba 1. 1. 2027 – 31. 10. 2027. Finančna konstrukcija se skladno zamakne.
- 13.01.2026:
Predviden zamik črpanja sredstev iz 2026 v leti 2027 in 2028. Vloga NPO oddana predvidoma do 15. februarja 2026. V letu 2026 načrtujejo predvsem odkupe zemljišč. JR za izbor izvajalca v začetku leta 2027, izbor do aprila 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (16.02.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 6: Kolesarska povezava Sežana Lipica – GEOMOB II



Občina izvajanja projekta: Sežana
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.603.080,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Predlagani projekt vključuje vzpostavitev daljinske kolesarske povezave (D7) za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na območju Krasa s povezavo na Ilirsko Bistrico. Projekt je nadgradnja izvedenega projekta GEOMOB – kolesarske povezave na Krasu. V nadaljevalni fazi projekta se planira izvedba kolesarske povezave do Divače in Parka Škocjanske jame ter na čezmejni ravni, saj je naš končni cilj vzpostavitev državnih in regijskih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.362.618,00	0,00	0,00 %
SLO	240.462,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.603.080,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Projektna dokumentacija izdelana 30. 8. 2025, popolna bo potrjena predvidoma do 31. 1. 2026 (po pridobitvi zemljišč in zahtevanih soglasij DRSI in Slovenskih železnic). Vloga NPO bo oddana predvidoma do 28. 2. 2026 (zaplet pri odkupu zemljišč). Izbor izvajalca del predvidoma do 30. 4. 2026. Začetek del 15. 5. 2026, konec 31. 3. 2027. Načrt črpanja sredstev se skladno spremeni/zamakne.
- 13.01.2026: V postopku pridobivanja soglasja DRSI, težave z dogovorom o označevanju kolesarske poti. Sestanek na terenu 14.1.2026, po tem predvidena uskladitev in pridobitev soglasja DRSI. Predvidena časovnica drži. Črpanje sredstev iz 2025 prestavijo predvidoma v 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.02.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 7: Kanalizacija aglomeracija Ankaran – Hrvatini



Občina izvajanja projekta: Ankaran, Koper
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 1.295.835,16 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Zamuda pri projektu	
Datum:	13.01.2026
Zamuda (dni):	90
Obrazložitev:	Zamuda zaradi pridobivanja GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.101.459,89	0,00	0,00 %
SLO	194.375,27	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.295.835,16 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Izbor izvajalca gradbenih del do 31. 12. 2026. Predvidena izvedba del 1. 1. 2027 do 31. 12. 2029. Konec projekta predvidoma do 30. 6. 2029. Finančna konstrukcija zaenkrat ostane nespremenjena. Popolna vloga NPO predvidoma do 31. 7. 2026. Projektna dokumentacija do 31. 12. 2025, popolna vloga GD predvidoma do 31. 1. 2026.
- 13.01.2026:
GD za Koprski del bo pridobljeno predvidoma do maja 2026, GD za del v Ankaranu do septembra 2026. Vloga NPO bo oddana predvidoma do oktobra 2026. Generalna zamuda pri predvideni časovnici: 3 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.02.2026)

Status časovnice projekta: Zabeležena zamuda – projekt še v časovnici

Projekt 8: Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki



Občina izvajanja projekta: Koper
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 4.061.275,06 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Zamuda pri projektu	
Datum:	13.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamuda zaradi pridobivanja služnosti za pridobitev GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	3.452.083,80	0,00	0,00 %
SLO	609.191,26	0,00	0,00 %
SKUPAJ	4.061.275,06 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Datum oddaje popolne projektne dokumentacije in vloge NPO predvidoma do 31. 7. 2026. Izbor izvajalca do 31. 12. 2026.
- 13.01.2026:
GD bo predvidoma pridobljeno do maja 2026, manjka nekaj služnosti. Oddaja vloge NPO predvidoma do oktobra 2026. Generalna zamuda pri časovnici projekta: 2 meseca.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.02.2026)

Status časovnice projekta:Zabeležena zamuda – projekt še v časovnici

Projekt 9: Ureditv kanalizacije na aglomeraciji Hrpelje-Kozina



Občina izvajanja projekta: Hrpelje-Kozina
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 2.163.050,56 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.838.592,98	0,00	0,00 %
SLO	324.457,58	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.163.050,56 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Popolna projektna dokumentacija predvidoma do 31. 12. 2025, GD predvidoma do 31. 12. 2025. Vloga NPO do 31. 3. 2026. Razpis za izbor izvajalca predviden do 15. 1. 2026, izbor izvajalca in podpis pogodbe do 1. 5. 2026. Predviden začetek del 1. 5. 2026, konec do 31. 12. 2027. Črpanje sredstev/finančna konstrukcija se zamakne predvidoma za 1 leto.
- 13.01.2026:
PZI narejen. Manjka popis del za širitev ČN, zaplet zaradi delitve kanalov in pridobivanja GD. Pridobivanje GD za kanal F1 in širitev ČN – oba GD na upravni enoti že od novembra 2025. JR za izbor izvajalca predviden v februarju 2026. Vloga NPO je pripravljena, čakajo le še GD in popis del. Predvidevajo da bo popis del do konca januarja 2026, za pridobitev GD še niso prepričani, ampak predvidevajo da se bo projekt (razen popolne projektne dokumentacije) držal časovnice. Možen nepredviden zamik zaradi pridobivanja GD.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga:

Ni potrjenih nalog.


Naslednja naloga:

M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

V zamudi

Projekt 10: Regijski center mobilnosti Istra-Brkini-Kras



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 268.800,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je vzpostavitev strateškega in ciljno usmerjenega prometnega načrtovanja, celostnega upravljanja prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu na regionalni ravni. S projektom se namerava razvijati in upravljati promet na območju regije z usklajevanjem priprave in izvajanjem projektov med občinami, s sodelovanjem med regijo in državo na področju prometne politike ter z osveščanjem javnosti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	228.480,00	0,00	0,00 %
SLO	40.320,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	268.800,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (14.04.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 11: Regionalna celostna prometna strategija za Obalno-Kraško



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS 31%
Višina sofinanciranja: 80.000,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je vzpostavitev strateškega in ciljno usmerjenega prometnega načrtovanja, celostnega upravljanja prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu na regionalni ravni. Predmet investicije je izdelava Regionalne celostne prometne strategije za Obalno-kraško regijo. Priprava celostne prometne strategije za regijo je ključni korak v smeri celostnega prometnega načrtovanja. Je strateški dokument, s katerim se nakažejo smeri razvoja prometa v regiji v prihodnosti ter določi ukrepe za doseganje trajnostne mobilnosti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 03.11.2025:
A je bila že oddana?

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano


V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (15.05.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 12: Ureditev zelenih površin v Fiesi



Občina izvajanja projekta: Piran
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 499.232,22 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Občina Piran je pristopila k projektu ureditve zelenih površin v Fiesi z željo po izboljšanju kakovosti in uporabnosti območja in z namenom vzpostavitve dodatne zelene infrastrukture, ki bo območje naredila bolj privlačno in z veliko sence, tudi bolj varno za uporabnike. Predvidena je ureditev zelenih površin med morjem in jezerom ter ureditev sprehajalne poti in dostopa v vodo funkcionalno oviranim osebam.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	249.616,11	0,00	0,00 %
SLO	249.616,11	0,00	0,00 %
SKUPAJ	499.232,22 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 03.11.2025:
Ni datumov ne opisa. Nič!
- 04.11.2025:
Vloga NPO oddana v začetku avgusta 2025, septembra prejete pripombe na vlogo, zdaj poteka usklajevanje vloge s pripombami, zato se predvideva zamik časovnice izvedbe in črpanja sredstev. 3. 11. 2025 začetek del, zaključek predviden 30. 3. 2026. Predvideno črpanje sredstev v začetku leta 2026. Izbor izvajalca zaključen, podpisana pogodba z izvajalcem.
- 13.01.2026: Nepopolna vloga NPO oddana septembra 2025, prejeli v dopolnitev. Oddaja popolne vloge predvidoma do konca januarja 2026. Projekt je že v fazi izvajanja del (že proti koncu).

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano


V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M9 50% izvedbe
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (31.12.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 13: Podjetniško usposabljanje v Obalno-Kraški regiji



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Real: 689.320,00 €

Izvajanje

Kratek opis projekta:

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje podjetništva.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	615.308,80	275.728,00	44,81 %
SLO	922.963,20	413.592,00	44,81 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	689.320,00 €	44,81 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek
Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (31.07.2026)

Status časovnice projekta:


V časovnici

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	121.900,80	182.851,20	304.752,00	121.900,80	182.851,20	304.752,00	100,0 %
2025	153.827,20	230.740,80	384.568,00	153.827,20	230.740,80	384.568,00	100,0 %
2026	153.827,20	230.740,80	384.568,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	137.864,00	206.796,00	344.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	47.889,60	71.834,40	119.724,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	615.308,80	922.963,20	1.538.272,00	275.728,00	413.592,00	689.320,00	44,8 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

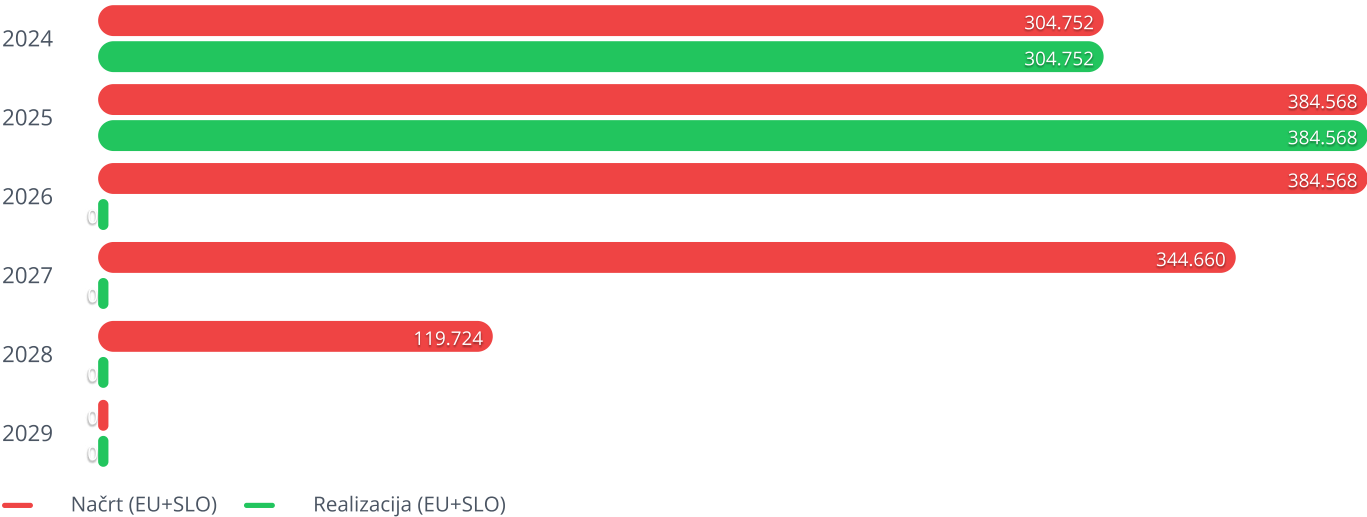


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	10	—	0%

Poročilo je pripravil: Ana Stružnik

Datum in čas priprave: 15.01.2026 13:58

Projekt 14: Kolesarske povezave v Občini Komen – GEOMOB II



Občina izvajanja projekta: Komen
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 2.478.901,41 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Predlagani projekt vključuje vzpostavitev daljinske kolesarske povezave (D7) in regijske kolesarske povezave (R4) za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na območju Krasa s povezavo na Vipavsko dolino. Projekt je nadgradnja izvedenega projekta GEOMOB – kolesarske povezave na Krasu. V 2. fazi projekta se lahko vzpostavi trajnostno mobilnost tudi na območju občin Miren-Kostanjevica in Vipava, medtem ko bi se v sklopu 3. faze prešlo na čezmejno raven, saj je naš končni cilj vzpostavitev državnih in regijskih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju.

Zamuda pri projektu	
Datum:	13.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamik zaradi pridobivanja služnosti in popolne projektne dokumentacije za vse 3 odseke.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	2.107.066,20	0,00	0,00 %
SLO	371.835,21	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.478.901,41 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 04.11.2025:
Popolna projektna dokumentacija je izdelana (manjkajo soglasja – posegi v sosednja zemljišča), predvidoma potrjena do 31. 12. 2025, oddaja vloge NPO predvidoma do 31. 1. 2026. Izbor izvajalca predviden do 1. 4. 2026. Izvedba del od 1. 4. 2026 do 31. 12. 2027.
- 13.01.2026:
2 od 3 odsekov sta dokončana, čakajo pridobitev služnosti za 3. odsek in pozitivno mnenje DRSI (sestane 14.1.2026). Do konca februarja 2026 predvidena pridobitev popolne projektne dokumentacije, oddaja vloge NPO do konca marca 2026 – generalni zamik za 2 meseca. JR za izbor izvajalca v predvidenem roku kljub generalnemu zamiku. Sprememba črpanja sredstev po letih.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

V zamudi

Dodatne opombe:

Ni opomb.

Skrbnik regije

Odgovorna oseba
