

DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Osrednjeslovenska

Število projektov v dogovoru:	31
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	1
Višina dodeljenih sredstev:	53.059.373,77 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	689.320,00 EUR

Črpanje (real/plan):

1%

Projekti zelo zamujajo

52% v časovnici

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real
1.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	689.320,00
2.	RSO2.5 - OČOV	3	15.131.703,87	0,00
3.	RSO2.5 - VODOVODI	4	5.271.028,29	0,00
4.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	12	10.147.122,34	0,00
5.	RSO3.2 - KOLESARKE	9	20.142.429,27	0,00
6.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	828.818,00	0,00
SKUPAJ		31	53.059.373,77	689.320,00

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
DRSI	3	2.836.757,07	0,00
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	1	9.433.017,00	0,00
Mestna občina Ljubljana	1	732.043,14	0,00
MO Ljubljana	2	14.042.692,44	0,00
OBČINA DOL	1	4.000.000,00	0,00
OBČINA VRHNIKA	1	1.698.686,87	0,00
Občina Brezovica	2	1.091.030,82	0,00
Občina Dobrova Polhov Gradec	1	240.000,00	0,00
Občina Domžale	1	3.417.258,00	0,00
Občina Grosuplje	1	618.621,90	0,00
Občina Ig	1	1.559.952,04	0,00
Občina Ivančna Gorica	1	1.691.453,50	0,00
Občina Kamnik	2	2.062.689,00	0,00
Občina Komenda	1	621.491,98	0,00

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Občina Logatec	2	1.415.909,98	0,00
Občina Lukovica	1	836.763,84	0,00
Občina Medvode	1	1.621.335,00	0,00
Občina Mengeš	1	811.199,42	0,00
Občina Moravče	1	600.927,69	0,00
Občina Trzin	1	378.546,88	0,00
Občina Velike Lašče	1	435.931,68	0,00
Občina Šmartno pri Litiji	1	545.975,52	0,00
RRA LUR	3	2.367.090,00	689.320,00
SKUPAJ	31	53.059.373,77	689.320,00

Predvideno črpanje po letih

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	235.420,39	237.456,78	472.877,17	148.022,40	222.033,60	370.056,00	78,3 %
2025	317.978,55	225.135,98	543.114,53	127.705,60	191.558,40	319.264,00	58,8 %
2026	7.904.223,85	2.626.071,15	10.530.295,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	16.488.427,34	4.069.814,27	20.558.241,61	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	11.421.938,09	2.942.055,49	14.363.993,58	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	4.488.611,84	2.102.240,04	6.590.851,88	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	40.856.600,06	12.202.773,71	53.059.373,77	275.728,00	413.592,00	689.320,00	1,3 %

Projekt 1: Glavna kolesarska povezava G9 Turjak-Velike Lašče-DEL



Občina izvajanja projekta: Velike Lašče
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 435.931,68 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Na območju občine Velike Lašče je načrtovana nova kolesarska povezava v sklopu sprejetega seznama državnih kolesarskih povezav (Ur.l. RS ŠT. 29/18). Trenutno kolesarski promet na območju občine Velike Lašče poteka po glavni državni cesti G2-106, po lokalnih cestah in po neurejenih javnih poteh. Na obravnavanem območju obstaja nekaj registriranih lokalnih krožnih kolesarskih povezav, vendar ni nobena povezana na nivoju regije. Predvidena kolesarska povezava v občini Velike Lašče predstavlja drugi sklop celotne kolesarske povezave Škofljica -Petrina in zagotavlja kolesarsko povezanost občine Velike Lašče z občinami Škofljica Ribnica in Dobropolje in okolice z naselji Velike Lašče, Turjak, Rašica, Male Lašče ob glavni cesti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	370.541,93	0,00	0,00 %
SLO	65.389,75	0,00	0,00 %
SKUPAJ	435.931,68 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Projektna dokumentacija v izdelavi, čaka še na uskladitve. Vloga NPO do 30.9.2026. Gradnja predvidena v letih 2028 in 2029.
- 19.01.2026: PZI je pripravljen, začeli bodo z odkupom zemljišč. Usklajevanje z DRSI poteka od marca 2025 za odsek kolesarske povezave v dolžini 100 m, rešitve še niso našli. Leta 2019 že pripravljena bolj obsežna projektna naloga, zadaj pripravljena tudi bolj detajlna projektna naloga za ta projekt. Čim prej sklicati sestanek med občino in MZI, da se razčistijo odprte zadeve glede projektne dokumentacije in izvajanja projekta.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.10.2025)

Status časovnice projekta:

V zamudi

Projekt 2: KP G10, Ljubljana Škofljica



Občina izvajanja projekta: Škofljica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.124.260,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Umestitev kolesarske povezave od meje z Mol do meje z občino Grosuplje. Celotna kolesarska povezava je predvidena od obstoječe navezave na kolesarske površine na Dolenjski cesti v Ljubljani do meje z občino Grosuplje na Šmarski cesti. Dolžina celotne trase znaša cca. 5,8 km. Kolesarska povezava poteka po že obstoječi in kategorizirani prometni infrastrukturi (lokalne ceste, državna cesta), manjši del kolesarske povezave pa poteka po nekategoriziranih odsekih cest. Po poteku jo razdelimo v 3 glavne odseke: Ljubljana – Lavrica – Škofljica, zahodno od proge – 2,3 km; Škofljica, vzhodno od proge – 1,8 km in Škofljica – občina Grosuplje (smer Šmarje – Sap) – 1,7 km. Kolesarske površine bodo sestavljale kolesarske poti (52%), kolesarske steze (8%), kolesarski pasovi na voziščih (22%) in souporabo prometnega pasu po občinski javni cesti (19%). Samostojne kolesarske površine (kol. pot, kol. steza, kol. pas) bodo sestavljale 81 % povezave. Sestavni del kolesarskih površin so tudi parkirišča in počivališča za kolesa in njihova oprema ter prometna signalizacija, števec kolesarjev (štetje kolesarjev v obe smeri) in prometna oprema za kolesarje. Ne bo vodena po javnih cestah, razen tam, kjer je predvidna souporaba prometnega pasu na občinski cest (kjer je PLDP manjši od 2.500 km, dovoljena hitrost pa ne bo večja od 70%) kar predstavlja 1,1 km oz. 19% celotne povezave. 5,8 KM, 5.000 potnikov/leto.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	955.621,00	0,00	0,00 %
SLO	168.639,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.124.260,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 19.01.2026: Težava z lastništvom zaradi pridobivanja soglasja Slovenskih železnic. V procesu iskanja druge rešitve in načrtovanje nove trase kolesarske povezave. Projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (21.09.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 3: Mreža zelenih površin Šmartno



Občina izvajanja projekta: Šmartno pri Litiji
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 545.975,52 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Občina Šmartno pri Litiji načrtuje celovito ureditev javnih zelenih površin v občinskem središču, ki ki je razdeljena na štiri območja: Območje 1: center Območje 2: zelena povezljivost Območje 3: zelena pot Območje 4: medgeneracijski park Tisje

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	272.987,76	0,00	0,00 %
SLO	272.987,76	0,00	0,00 %
SKUPAJ	545.975,52 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO 31.3.2026, ostalo nespremenjeno.
- 19.01.2026: Projekt zaenkrat v predvidenem terminskem planu razen pridobivanja popolne projektne dokumentacije.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano


V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 4: REGIJSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 120.000,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:
REGIJSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	102.000,00	0,00	0,00 %
SLO	18.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	120.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: 17.11.2026 vloga NPO, JR za izbor izvajalca, do 1.2.2026 izbran.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (18.11.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 5: Kolesarske poti v Občini Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični



Občina izvajanja projekta: Ivančna Gorica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.691.453,50 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Vzpostavitev kolesarske povezave med naseljema Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični ob regionalni cesti R2-448/1196 Ivančna Gorica-Grm je načrtovana tako, da povezuje obstoječe in predvidene odseke kolesarskih povezav v sklenjeno in varno omrežje teh povezav. Z izgradnjo kolesarske povezave se izboljšuje prometna varnost na obravnavanem odseku. Prav tako se izboljšuje trajnostno mobilnost in povezljivost med naselji Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.437.735,48	0,00	0,00 %
SLO	253.718,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.691.453,50 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 19.01.2026: Izdelana je projektna dokumentacija, ki vpliva na prilagoditev regionalne ceste, kar morajo še uskladiti z DRSI. Popolna projektna dokumentacija bo pridobljena predvidoma do 30.6.2026. Izdelati investicijski program, izvedba projekta v 2027 in 2028.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 6: Rekonstrukcija kolesarskih površin Ob Ljubljani



Občina izvajanja projekta: Ljubljana
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 5.421.955,63 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen operacije je spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti na območju MOL. Osrednji namen projekta je izboljšati povezave za kolesarje in pešce, kar bo olajšalo uporabo teh poti kot najhitrejših, udobnejših in najbolj varnih prometnih rešitev ter zmanjšalo delež motornega prometa na tem območju. Lokacija izvedbe investicije sta cesti Poljanski nasip in Ob Ljubljani na odseku od Cukrarne do Kajuhove ulice. 2 km, 90.000 potnikov/leto.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	4.608.662,28	0,00	0,00 %
SLO	813.293,35	0,00	0,00 %
SKUPAJ	5.421.955,63 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025:
PZI v izdelavi. Vloga NPO bo oddana predvidoma do 30.4.2026. JR za izvedbo 1.4.2026. Izbor 1.6.2026, izvedba od tega datuma do 31.12.2027.
- 19.01.2026:
Popis del in PZI v pripravi, projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana, razen začetek del se premakne v avgust 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 7: Ureditev državne kolesarske povezave D1 Ob Zaloški cesti, Lj.



Občina izvajanja projekta: Ljubljana

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 8.620.736,81 €

Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je vzpostavitev privlačnejših in varnejših kolesarskih povezav in pločnikov ob rekonstrukciji dotrajanega cestišča. Cilj je spodbuditi spremembo potovalnih navad tako, da se vsaj del poti, ki se opravljajo z osebnimi avtomobili, preusmeri na kolo, električno kolo ali na večmodalnost (peš, kolo ali avtobus). Poseg predvideva ureditev kolesarske poti in ureditev površin za pešce na odseku ob Zaloški cesti, med Kajuhovo cesto in AC priključkom Ljubljana – vzhod, kot tudi gradbeno in prometno rekonstrukcijo Zaloške ceste.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	7.327.626,62	0,00	0,00 %
SLO	1.293.110,19	0,00	0,00 %
SKUPAJ	8.620.736,81 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Projektna dokumentacija in vloga NPO do 30.4.2026. Izvedba del 1.5.2026 in do 31.5.2028.
- 19.01.2026: Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 8: Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Medvode)



Občina izvajanja projekta: Medvode
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.621.335,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Z novogradnjo javnega vodovoda bodo na vodovodnem sistemu izvedene bistvene izboljšave, ki bodo prispevale k zmanjšanju vodnih izgub za več kot 20% na celotnem javnem vodovodu od zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI, kot tudi k izboljšani preskrbljenost prebivalstva, gospodarskih in družbenih organizacij s pitno vodo v količinskem in kakovostnem smislu). Vodovod bo pravilno dimenzioniran in izveden iz primernih materialov – zamenjava azbestnih cevi, s čimer se bo zagotovila zdravstveno in hidravlično ustrezna pitna voda. S projektom bo zagotovljen dvig kakovosti bivanja občanov z dolgoročno oskrbo z neoporečno čisto pitno vodo. 6,326 km, 14.500 prebivalcev priklopljenih.

Zamuda pri projektu	
Datum:	19.01.2026
Zamuda (dni):	90
Obrazložitev:	Zamuda zaradi pridobivanja GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.377.982,00	0,00	0,00 %
SLO	243.353,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.621.335,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Do 15.12.2025 vložena zadnja vloga za GD. Vloga NPO bo predvidoma oddana do 28.2.2026. JR za izbor izvajalca del v januaru 2026. Izbor izvajalca in izvedba projekta 1.4.2026. Konec izvedbe do konca leta 2027.
- 19.01.2026:
Projekt ločen na dva odseka - odsek Zbilje in odsek Smlednik. GD za en odsek bo vloženo do konca januarja 2027, drugo GD bo vloženo do konca februarja 2026. Vloga NPO bo predvidoma oddana do konca maja 2027. Zabeležen generalni zamik za 3 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta:

Zabeležena zamuda – projekt še v časovnici

Projekt 9: Športni prak Brinje



Občina izvajanja projekta: Grosuplje
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 618.621,90 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture in javno dostopnih zelenih površin v urbanih naseljih, kar bi dosegli z izgradnjo Športnega parka Brinje. Območje, kjer je predvidena gradnja novega Športnega parka, se nahaja v naselju ob večstanovanjskih hišah, blokih in številnih novogradnjah ter tik ob Osnovni šoli Brinje. Z izvedeno investicijo bomo zagotovili trajnostno dostopnost, saj ustrezno urejena športna infrastruktura izrazito pozitivno vpliva na bolj zdrav življenjski slog in izboljšuje kakovost bivanja prebivalcev območja kjer se nahaja ter deluje tudi širše. S predvideno investicijo bi izboljšali samo pojavnost zelene infrastrukture in ozelenitve ter izboljšali dostop prebivalcev do zelene infrastrukture s posebnim poudarkom na dostopnosti za različne ciljne skupine (starejši, mlajši, najmlajši in gibalno ovirani). Cilj investicije je:- ozeleniti šolsko igrišče (skupno 3.907 m2) ,- postaviti otroška igrala, urbano opremo, zeleno nadstrešnico za vadbo, učilnico na prostem in šolski vrt med krošnjami ter prenoviti celoten izgled obšolskega igrišča na način na naravi temelječih in okolju prijaznih rešitev.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	309.310,95	0,00	0,00 %
SLO	309.310,95	0,00	0,00 %
SKUPAJ	618.621,90 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo predvidoma oddana do 31.1.2026. Izvedba: 1.4.2027 do 1.9.2027.
- 19.01.2026:
Vloga NPO bo oddana v tem tednu, pridobljena vsa soglasja. Projekt v časovnici, ni predvidenih zamud.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Oddaja NPO na PT
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (27.02.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 10: Celovita ureditev centra Ig



Občina izvajanja projekta: Ig
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.559.952,04 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt vključuje ureditev površin v središču naselja z ukrepi zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti. V sklopu zelene infarstrukture se ureja: park z otroškimi igriščem, trg in zelene površine ob občinski stavbi, drevored skozi središče do novega parka in ozelenitev obstoječih parkirišč pri šoli in vertikalna ozelenitev. Ukrepi trajnostne mobilnosti izboljšujejo prometno ureditev, povečujejo varnost, dajejo prednost pešcem, kolesarjem in JPP (preureditev avtobusnega postajališča).

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	779.976,02	0,00	0,00 %
SLO	779.976,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.559.952,04 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo oddana popolna do 31.1.2026. Zaradi odstopanja vrednosti projekta od zneska v prijavljenem projektu na DRR, bo potrebno ponovno uvrstiti projekt v dogovor (sprememba).
- 19.01.2026:
PZI in GD je pridobljeno, projekt stoji zaradi ocene investicije, načeloma pa projekt ostaja v predvideni časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (01.06.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 11: Urejanje zelenih površin v mestnem jedru Kamnika



Občina izvajanja projekta: Kamnik
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 300.000,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bomo uredili območje gradu Zaprice – vrtove, muzej na prostem in trim stezo.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	150.000,00	0,00	0,00 %
SLO	150.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	300.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Izbor izvajalca do 1.5.2026 in začetek z deli. Zaključen projekt najkasneje do 28.4.2028.
- 19.01.2026: PZI v izdelavi, pridobivajo soglasje ZVKD, poteka še odkupovanje zemljišč. Razen popolne projektne dokumentacije, projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (21.02.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 12: Ureditev in širitev pokopališča v Komendi



Občina izvajanja projekta: Komenda
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 621.491,98 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zasnova ureditev širitve obstoječega pokopališča v obliki parkovne ureditve. S parkovno ureditvijo pokopališča se bo v največjem možnem obsegu ohranjala obstoječa silhueta območja širitve, na ta način se bo ohranjala tudi identiteta prostora, ki spada pod območje kulturne dediščine. Parkovna ureditev predvideva ureditev prostora na način, da bo poleg specifičnih pokopaliških funkcij vključeval tudi elemente, ki bodo omogočali izvajanje drugih programov, ki jih je mogoče izvajati v območju pokopališča (na območju obstoječega dela in na območju širitve) – tj. sprehajanje, druženje (npr. srečanja duhovnih skupin, odprta čitalnica – duhovna knjižnica, prostor za sprostitev, ipd.). Za doseganje ciljev bo poudarek na vključevanju visokega deleža krajinskih elementov, ki bodo zagotavljali mikroklimatsko ugodje, udobje ter spodbujali raznolikost s posnemanjem značaja slovenskega travnika.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	310.745,99	0,00	0,00 %
SLO	310.745,99	0,00	0,00 %
SKUPAJ	621.491,98 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO oddana predvidoma do 1.2.2026 (zamuda zaradi pridobivanja soglasja ZVKD).
- 19.01.2026:
Vloga za pridobitev GD oddana 14.11.2025, potrebne še dopolnitve, pridobljeno soglasje ZVKD. Vloga NPO je v pripravi. JR za obe fazi izvedbe je v pripravi in predvidevajo izvedbo razpisa po pridobitvi PZI in GD. Predvidoma pridobljena popolna projektna dokumentacija do oddaje vloge za NPO - vloga je skoraj pripravljena, čakajo le še pridobitev GD.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 13: Kolesarska povezava R10 v Občini Horjul



Občina izvajanja projekta: Horjul
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.262.677,30 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt obravnava ureditev dvosmerne kolesarske steze na levi strani vozišča ceste in ustrezna navezava obstoječih površin za pešce ob regionalni cesti R2-407/1145 Ljubljana – Vrhnika od km 4,500 do km 5,500, torej od naselja Vrzdenc do naselja Ljubgojna.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.073.275,71	0,00	0,00 %
SLO	189.401,59	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.262.677,30 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Projektna dokumentacija je pridobljena. Oddaja vloge NPO do 1.2.2026, pred novim letom JR za izbor izvajalca. DIIP v izdelavi, pričakovan do konca decembra 2025. Izvedba v 2026 in prvi polovici 2027.
- 19.01.2026: Popolna projektna dokumentacija pridobljena, zemljišča so pridobljena, vloga NPO v pripravi in bo do predvidenega datuma oddana na PT. Po pridobitvi odločitve o podpori se izvede JR za izbor izvajalca. Projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (02.03.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 14: Državna kol. povezava R33Odsek Dob-Lukovica-Krašnja

0

NAPREDEK

Občina izvajanja projekta: Lukovica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 836.763,84 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt predvideva ureditev državne kolesarske povezave R33 Trzin – Domžale – Lukovica – Trojane, na odseku Dob – Lukovica – Krašnja. Skupna dolžina s projektom predvidene ureditve kolesarske povezave znaša cca 4.640 metrov in je razdeljena na štiri pododseke: Pododsek 1: novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze z vmesno zelenico ob državni cesti R2-447, od križišča R2-447 in Kranjske ceste do profila D26+10 oz. R2-447/0292 v km 20.400, L = 1.200 m, DRSI_POT; Pododsek 2: označitev s prometno signalizacijo po obstoječih lokalnih cestah, L = 980 m, od tega 140 m DRSI_POT; 840 m OBC_JP; Pododsek 3: novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze ob državni cesti R2-447 do križišča za Brdo pri Lukovici z ureditvijo prehoda čez državno cesto, L = 420 m; DRSI_POT; Pododsek 4: označitev s prometno signalizacijo po obstoječih lokalnih cestah, razširitev pločnika in ureditev prehoda čez državno cesto, L = 2.040 m, od tega 600 m OBC_PAS; 1.440 m OBC_JP.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	711.249,27	0,00	0,00 %
SLO	125.514,57	0,00	0,00 %
SKUPAJ	836.763,84 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: GD ni potrebno. Čakajo na recenzijo iz DRSI, da lahko pripravijo vlogo NPO (predvidoma do 1.6.2026). Če sklepamo, da bo vse potekalo brez dodatnih komplikacij bi črpanje lahko potekalo že v 2026.
- 19.01.2026: Še vedno čakajo na recenzijo DRSI, že bili na sestanku pri direktorici DRSI, točno stanje in zamude bodo zabeležene na naslednjem teritorialnem dialogi 17.3.2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 15: Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019



Občina izvajanja projekta: Ljubljana
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 9.433.017,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Opremljanje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 z manjkajočo kanalizacijo in pripadajočimi objekti.

Zamuda pri projektu	
Datum:	19.01.2026
Zamuda (dni):	270
Obrazložitev:	Zamik zaradi povečanja vrednosti projekta za več kot 20%.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	8.018.064,44	0,00	0,00 %
SLO	1.414.952,56	0,00	0,00 %
SKUPAJ	9.433.017,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Zaradi spremembe obsega projekta bo vloga NPO predvidoma oddana do 1.10.2026. Zamika se projekt in finančni plan.
- 19.01.2026:
Projekt se je finančno povečal za več kot 20%, 22.12.2025 oddana nova vloga za uvstitev projekta v Dogovor na MKRR, vloga je bila posredovana na MNVP. Generalna zamuda 9 mesecev. Do 30.9.2026 popolna projektna dokumentacija, 30.3.2027 začetek del.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 16: Vodovod Logatec – Ograje, Laze – Ravnik, Hrušica (predlog naziva: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane – 4. sklop)

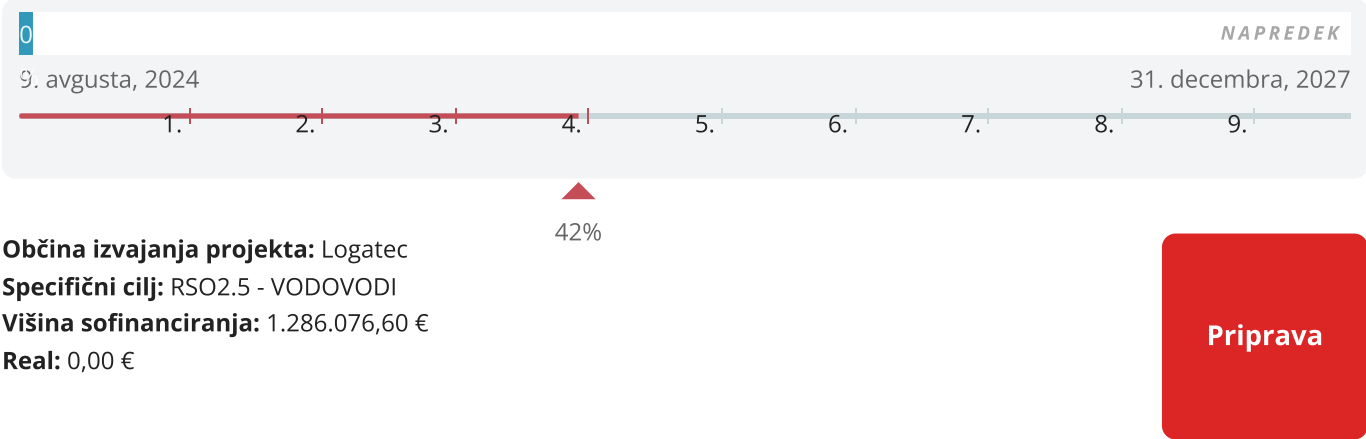

Kratek opis projekta:

Namen projekta je urejanje javnega vodovoda Logatec, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev z vidika zmanjševanja vodnih izgub. Predvidena je obnova vodovoda skozi center Rovt z dograditvijo vodovoda Ograje, obnova južnega kraka Laze – Jakovica z dograditvijo vodovoda Ravnik – Laze. Na ta način se bo obnovila zastarela infrastruktura, izboljšal dostop do pitne vode in dogradila manjkajoča vodovodna infrastruktura oz. njen del. V primeru dograditve vodovoda Ograje se bo zagotovil rezervni vir. 4,740km, 1 zajetje, 504 prebivalcev priključenih.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.093.165,11	0,00	0,00 %
SLO	192.911,49	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.286.076,60 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 19.01.2026: Zadeva je usklajena z Elektro Ljubljana, ni predvidenih sprememb v časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.07.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 17: KP Notranje Gorice – Podpeč



Občina izvajanja projekta: Brezovica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 298.830,74 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Izgradnja dela državne kolesarske povezave R8 Cerklje na Gorenjskem-Vodice-Šentvid-Brezovica pri Ljubljani-Podpeč, in sicer na odseku med naseljema Notranje Gorice in Podpeč v skupni dolžini 1.790 metrov

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	254.006,13	0,00	0,00 %
SLO	44.824,61	0,00	0,00 %
SKUPAJ	298.830,74 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Popolna proj. dok. končana. Vloga NPO najkasneje 30.3.2026. Možnost izvedbe celotnega projekta v letu 2026.
- 19.01.2026:
Usklajevanje premostitve z ZRSVN, po uskladitvi predvidena oddaja vloge NPO. Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu. Povečanje kazalnikov s tretjo dopolnitvijo Dogovora.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (31.03.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 18: Učna in doživljajska pot Logaščica – Park Jačka



Občina izvajanja projekta: Logatec
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 129.833,38 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Območje Logaščice, ki pripada porečju Ljubljane, potok pa ponikne sredi Logatca v ponoru Jačka, je zaradi svoje lege in bližine mesta, izjemno pomembno za prebivalce in obiskovalce z vidika naravnih in kulturnih danosti ter nudi možnost nadaljnega razvoja območja za rekreacijo in drugih oblik preživljanja prostega časa v naravi. Občina Logatec želi v ta namen vzpostaviti učno in doživljajsko pot Logaščica ter približati potok prebivalcem preko sistema povezovalnih pešpoti, usmerjevalnih in informativnih tabel ter novih programskih območij. Namen projekta je približati vodo prebivalcem, jih zaščititi pred poletno vročino uvajanje zelene infrastrukture v urbana okolja, ščitenje prebivalcev pred škodljivimi vplivi onesnaženja, neugodnimi vremenskimi vplivi, in zagotavljanje prostora za druženje in sproščanje v naravi. Zagotavlja visokokakovostno bivalno okolje, ohranjanje, prenova in razvoj zelenih površin v mestih, izkoriščanje možnosti mešane rabe gozdnih, obvodnih in kmetijskih površin v urbanih naseljih za rekreacijske in sprostitevne namene.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	64.916,69	0,00	0,00 %
SLO	64.916,69	0,00	0,00 %
SKUPAJ	129.833,38 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 19.01.2026: Izvedba projekta planirana v 2027, zadržki do projekta v občinskem svetu. Marca bo znano točno stanje.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.06.2024)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 19: Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol



Občina izvajanja projekta: Mengeš
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 811.199,42 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Ureditev varne peš povezave ob Pšati med Mengšom in Topolami z novimi premostitvami in ureditvami počivališ ter drevorednih potez; Ureditev odprtih javnih zelenih površin, preureditev dela osrednjih parkovnih površin z renaturacijo dela vodotoka, nove zasaditve in novi izobraževalni programi (točke učne poti); Preureditev zunanih površin nekdanjega vrtca za potrebe novega programa (društvenega doma).

Zamuda pri projektu	
Datum:	19.01.2026
Zamuda (dni):	90
Obrazložitev:	Zamik zaradi pridobivanja projektne dokumentacije in GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	405.599,71	0,00	0,00 %
SLO	405.599,71	0,00	0,00 %
SKUPAJ	811.199,42 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Popolna projektna dokumentacija do 30.4.2026. Vloga NPO 30.6.2026. Izvedba v 2027, 2028 (po planu).
- 19.01.2026: Sprememba v časovnici - projektna dokumentacija do 30.6.2026, GD 30.8.2026, vloga NPO 30.9.2026. Generalni zamik 3 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta: Zabeležena zamuda – projekt še v časovnici

Projekt 20: DRR Zelena infrastruktura



Občina izvajanja projekta: Trzin
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 378.546,88 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Ključna aktivnost v okviru projekta je izboljšanje zelenih površin, v okolici Osnovne šole Trzin in stanovanjskega območja T3 in sicer: – ureditev zaokroženega območja zelenih površin v skupnem obsegu več kot 1,0 ha v osrednjem delu Trzina, - zelena infrastruktura v okolici OŠ Trzin in stanovanjskega naselja T3 z vključevanjem načela novega evropskega Bauhausa, -vzpostavitev zelene intenzivno debeloslojne strehe na novi kolesarnici osnovne šole,-prenova otroškega igrišča T3 in nadgradnja z umestitvijo prostora za druženje in sprostitvev, -prenova igrišča pri vrtcu, zelena učilnica in nadgradnja šolskega urbanega vrta ter postavitev čebelnjaka za izobraževalne, raziskovalne in kulturne namene, -celostna ureditev vzhodnega dela pešpoti ob potoku Pšata in severnega dela šolskega igrišča z umestitvijo urbane opreme, pasjega parka ipd., -ureditev zelenega kareja med šolskim igriščem in športno dvorano, -ureditev »urbane preproge« OŠ Trzin kot osrednji del, ki funkcionalno združuje zunanje površine v harmonično celoto.

Povzetek financiranja:


Vir	Načrt	Real	
EU	189.273,44	0,00	0,00 %
SLO	189.273,44	0,00	0,00 %
SKUPAJ	378.546,88 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: PZI predviden do 28.2.2026. 31.3.2026 popolna vloga NPO. Do 4.5.2026 izbran izvajalec in predviden začetek izvedbe del.
- 19.01.2026: Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu. Vsa dokumentacija v pripravi.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

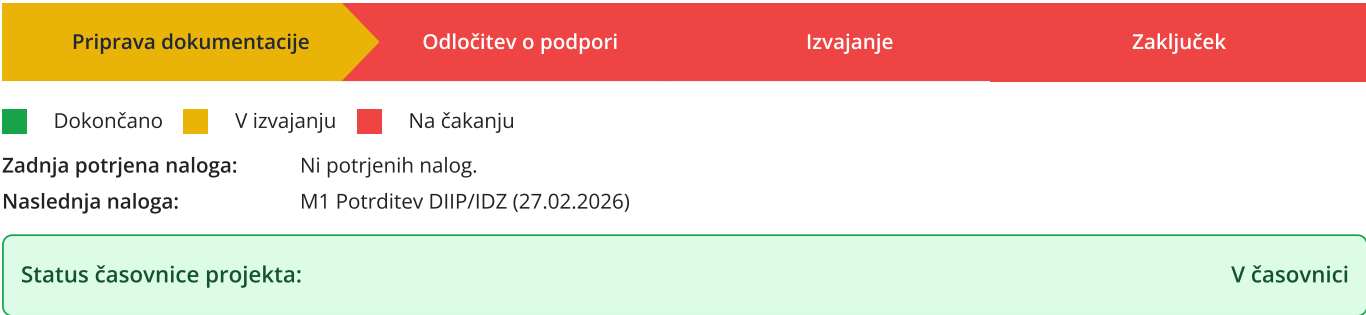

Projekt 21: Kolesarska povezava Breg – Pako



Občina izvajanja projekta: Borovnica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 449.819,77 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Ureditev 1,5 km dolge kolesarske povezave od konca kolesarske povezave Borovnica – Breg (gasilski dom) do meje z občino Brezovica z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste R3-642/1146

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	382.346,81	0,00	0,00 %
SLO	67.472,96	0,00	0,00 %
SKUPAJ	449.819,77 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 19.01.2026:
V kratkem bodo na občini začeli s pridobivanjem zemljišč, osnutki pogodb so pripravljeni. V pripravi sprememba PZI dokumentacije zaradi pobude občanov na enem odseku. Vseeno projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano


V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.09.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 22: Modernizacija vodovodnega sistema v občini Moravče



Občina izvajanja projekta: Moravče
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 600.927,69 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt zajema obnovo primarnega vodovoda med vodohranom Drtija in naseljem Moravče ter rekonstrukcijo vodohrana Drtija. Z obnovo ključne povezave za oskrbo prebivalcev s pitno vodo med vodohranom Drtija in naseljem Moravče ter novogradnjo vodohrana Drtija, bo dosežen cilj zagotoviti zanesljivo dobavo pitne vode obstoječim in novim prebivalcem. Z investicijo bodo bistveno zmanjšane trenutne vodne izgube na omrežju. Z novogradnjo vodohrana bodo izboljšane hidravlične razmere v omrežju. Z investicijo bo zmanjšan kazalnik vodnih izgub ILI na vrednost pod 1,5.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	510.788,54	0,00	0,00 %
SLO	90.139,15	0,00	0,00 %
SKUPAJ	600.927,69 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Popolna vloga NPO najkasneje do 1.5.2026. Ostalo ostaja nespremenjeno.
- 19.01.2026:
Projekt razdeljen v 2 fazi: za 1. fazo je GD pridobljeno, PZI je v izdelavi; za 2. fazo je v izdelavi DGD in pridobivanje GD ter služnosti. Razen popolne projektne dokumentacije ostale faze projekta ostajajo v predvideni časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 23: Ureditev zelenih površin Športnega parka Brezovica



Občina izvajanja projekta: Brezovica
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 792.200,08 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Osnovni namen investicije je zagotoviti zelene površine v neposredni okolici osnovne šole in predvidene izgradnje večnamenske športne dvorane Športnega parka Brezovica kot tudi izvedba zelene strehe na večnamenski dvorani. Zelene površine v okviru tega projekta bodo predstavljale koristi za celoten kraj in občino Brezovica. Glavni cilji projekta so naslednji: ureditev 8.616 m2 zelenih zunanjih površin in izvedba zelene strehe površine 3.018 m2 v športno-rekreacijskem parku; zagotovitev večje samozadostnosti in biotske raznovrstnosti s postavitvijo čebelnjaka; ureditev zelenih površin, ki bodo prebivalcem občine Brezovica nudile prostor za rekreacijo in sprostitev, dodaten nabor športnih dejavnosti ter dvigu kakovosti bivanja; povečanje ponovne uporabe padavinskih voda za zalivanje zelenih površin; razširitev programa interesnih dejavnosti; zasaditev avtohtonih vrst rastlin ter zmanjšanje uporabe invazivnih vrst rastlin in dreves; zagotovitev učinkovitega koriščenja javnih športnih objektov in ravnanje z njimi; razvoj dejavnosti na področju športa, turizma in kulture.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	396.100,04	0,00	0,00 %
SLO	396.100,04	0,00	0,00 %
SKUPAJ	792.200,08 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo oddana najkasneje do 30.9.2026, do takrat tudi popolna proj. dokumentacija. Črpanje sredstev predvideno v letu 2027 in 2028.
- 19.01.2026: Zaenkrat ni predvidene zamude v časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 24: Ozelenitev in oživitev občinskega centra Dobrova



Občina izvajanja projekta: Dobrova - Polhov Gradec
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 240.000,00 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Cilji predlaganega projekta so ozelenitev sedaj mestoma degradiranega urbanega centra Občine Dobrova – Polhov Gradec, s spremembo parkirišč in neuporabnih površin v zelene parkovne površine. Z vzpostavitvijo novih zelenih površin in ozelenitvijo centra, ki v zvezdasti obliki povezuje več delov centra občine in več javnih objektov kjer se zagotavljajo javne storitve (pošta, knjižnica, trgovina, ...) bi dosegli oživitev občinskega centra. Z oživitvijo centra obljublanske občine bi zadržali lokalno prebivalstvo v lokalnem okolju, kjer bi zadovoljevali svoje potrebe. S tem bi pripomogli tudi k zmanjšanju osebne prometa v center Ljubljane.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	120.000,00	0,00	0,00 %
SLO	120.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	240.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: JR za izbor izvajalca del v poteku, izbor izvajalca do 1.1.2026. Obdobje izvedbe predvidoma od 5.1.2026.
- 19.01.2026: Vloga NPO oddana 13.11.2025, čakajo odziv MNVP.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Oddaja NPO na PT
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

V zamudi

Projekt 25: Ureditev osrednje mestne javne površine v Domžalah



Občina izvajanja projekta: Domžale
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 3.417.258,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Ureditev odprtih javnih zelenih površin, ureditev parka, ureditev tržnega prostora, celostna ureditev komunalne infrastrukture – navezava na obstoječe prometno omrežje.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.708.629,00	0,00	0,00 %
SLO	1.708.629,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.417.258,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo oddana do 30.11.2026. Črpanje sredstev in izvedba projekta se začne v 2027 in konča 2029.
- 19.01.2026: V izdelavi dokumentacija za pridobitev GD, ni predvidene spremembe v časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.11.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 26: Ureditev novega vrtičarskega območja Grba III



Občina izvajanja projekta: Ljubljana
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 732.043,14 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

vzpostavitev novega vrtičarskega območja z 50 do 80 vrtilki z vso potrebno urbanp opremo, z večgeneracijskim igriščem

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	366.021,57	0,00	0,00 %
SLO	366.021,57	0,00	0,00 %
SKUPAJ	732.043,14 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Popolna proj. dok. 30.6.2026. Sprememb v časovnici glede projekta niso predvidene.
- 19.01.2026: Zaenkrat je projekt znotraj terminskih planov.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju


Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.08.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 27: Podjetniško usposabljanje v Ljublj. urban. regiji



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Real: 689.320,00 €

Izvajanje

Kratek opis projekta:

Podjetniško usposabljanje

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	615.308,80	275.728,00	44,81 %
SLO	922.963,20	413.592,00	44,81 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	689.320,00 €	44,81 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek

Status časovnice projekta:


Ni podatkov o časovnici.

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	148.022,40	222.033,60	370.056,00	148.022,40	222.033,60	370.056,00	100,0 %
2025	127.705,60	191.558,40	319.264,00	127.705,60	191.558,40	319.264,00	100,0 %
2026	127.705,60	191.558,40	319.264,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	124.803,20	187.204,80	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	87.072,00	130.608,00	217.680,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	615.308,80	922.963,20	1.538.272,00	275.728,00	413.592,00	689.320,00	44,8 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

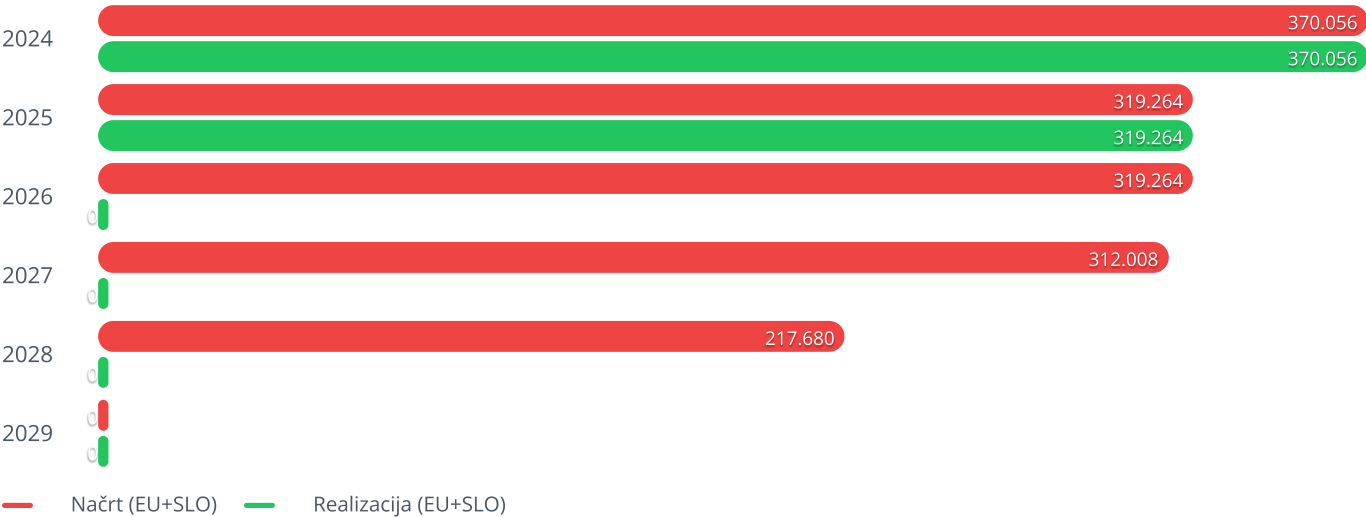

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Projekt 28: Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije (RCM LUR)



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 708.818,00 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:
REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	602.495,29	0,00	0,00 %
SLO	106.322,71	0,00	0,00 %
SKUPAJ	708.818,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: 8.9.2025 oddana vloga NPO, začetek izvajanja 1.5.2024 - odločitve in pogodbe še ni, stroški so nastali, zahtevkov za izplačilo še ne morejo izdati.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Oddaja NPO na PT
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (10.10.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 29: Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu



Občina izvajanja projekta: Dol pri Ljubljani^{34%}
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 4.000.000,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Gradnja Kanalizacije v aglomeraciji 4162 (Zaboršt, Zajelše, Videm, Dol). Cilj projekta je odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Namen projekta je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu. V projektu so predvideni investicijski posegi v naseljih Zaboršt in Zajelše, kjer se bo gradilo ca. 5.334 m kanalizacijskega omrežja, črpališče Zajelše in 300 m tlačnega voda. Drugi del zajema dograditev kanalizacije – sistem »OB«, območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol v dolžini ca. 2.281 m. 7,651 km, 2.139 priklapljenih prebivalcev.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	3.400.000,00	0,00	0,00 %
SLO	600.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Dve GD še pridobivajo, predvidevajo do 31.12.2025. Popolna projekta dokumentacija predvidena do 1.3.2026, vloga NPO predvidoma do 31.3.2026. JR za izbor izvajalca v marcu 2026. Obdobje izvedbe predvidoma od 1.6.2026 (tudi izbran izvajalec), konec del predviden do 30.6.2028.
- 19.01.2026: Popolna projektna dokumentacija zajema 2 GD; za severni in južni del. Za južni del bo vsa dokumentacija pripravljena v predvideni časovnici, za severni del bo predvidoma pridobljena z zamikom (predvsem težava s pridobitvijo GD). PZI za oba dela je v izdelavi.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.03.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 30: Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE



Občina izvajanja projekta: Vrhnika 32%
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 1.698.686,87 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bo izvedena investicija v izgradnjo javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 4823 Vrhnika – Sinja Gorica 2019 in izgradnja kanalizacije in ČN v aglomeraciji ID 4887 Log pri Brezovici 2019 (aglomeraciji nad 2.000 PE), ki ležita na območju Občine Vrhnika (aglomeracija ID 4887 Log pri Brezovici 2019 leži delno tudi v Občini Log – Dragomer). Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih voda se bodo na javno komunalno omrežje (JKO) priključili objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema potrebna v skladu z zakonodajo. 4,372 km, 1 ČN, 500 priklapljenih prebivalcev.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.443.883,84	0,00	0,00 %
SLO	254.803,03	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.698.686,87 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: DGD in PZI sta narejena. Vsa GD in popolna proj. dok. bodo pridobljeni predvidoma do 30.3.2026. Vloga NPO oddana do 1.4.2026. JR za izbor izvajalca predviden 1.6.2026.
- 19.01.2026:
DGD in PZI v pripravi, GD še ni pridobljeno, predvideno pridobljeno v 3 tednih. Razpis za izbor izvajalca predviden jeseni 2026. Načeloma projekt v časovnici in se ne predvideva zamud.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.03.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 31: Rekonstrukcija vodovoda Spodnje Stranje – Stahovica (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Kamnik)



Občina izvajanja projekta: Kamnik
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.762.689,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je obnova salonitnega cevododa od Stahovica do naselja Spodnje Stranje v skupni dolžini cca 2.944 m. Z izvedbo rekonstrukcije se bo povečala varnost oskrbe s pitno vodo, zagotovila kontinuiranost oskrbe s pitno vodo in zmanjšal delež vodnih izgub na vodovodnem sistemu št. 1578 Kamnik – Iverje za več kot 20% od zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI). 2,944 km, 25.000 prebivalcev priključenih.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.498.285,64	0,00	0,00 %
SLO	264.403,36	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.762.689,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 14.11.2025: Vloga NPO predvidoma do 30.10.2026. Obdobje izvedbe se začne predvidoma v začetku leta 2027.
- 19.01.2026:
Težava s pridobitvijo soglasja DRSV in DRSI ter pridobivanjem služnosti. Ne glede na datum pridobitve popolne projektne dokumentacije, oddaja vloge NPO in začetek izvajanja projekta ostaja v predvideni časovnici v 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Dodatne opombe:

Ni opomb.

Skrbnik regije

Odgovorna oseba
