


DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Posavska

Število projektov v dogovoru:	12
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	1
Višina dodeljenih sredstev:	21.785.667,34 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	540.572,00 EUR

Črpanje (real/plan):

2%



Projekti zelo zamujajo

58% v časovnici

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real
1.	RSO1.3 - INKUBATOR	1	3.834.016,08	0,00
2.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	540.572,00
3.	RSO2.5 - VODOVODI	2	7.274.714,15	0,00
4.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	5	5.962.067,31	0,00
5.	RSO3.2 - KOLESARKE	1	2.870.376,79	0,00
6.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	306.221,01	0,00
SKUPAJ		12	21.785.667,34	540.572,00

Pregled projektov po upravičencih


Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Mestna občina Krško	1	3.834.016,08	0,00
Občina Bistrica ob Sotli	1	700.597,40	0,00
Občina Brežice	2	7.162.248,85	0,00
Občina Kostanjevica na Krki	1	723.000,00	0,00
Občina Radeče	1	1.471.312,00	0,00
Občina Sevnica	3	6.050.000,00	0,00
Regionalna razvojna agencija Posavje	3	1.844.493,01	540.572,00
SKUPAJ	12	21.785.667,34	540.572,00

Predvideno črpanje po letih

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	200.447,00	35.373,00	235.820,00	200.447,00	35.373,00	235.820,00	100,0 %
2025	265.206,80	46.801,20	312.008,00	259.039,20	45.712,80	304.752,00	97,7 %
2026	3.327.336,40	587.177,03	3.914.513,43	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	18.517.817,22	3.267.850,12	21.785.667,34	459.486,20	81.085,80	540.572,00	2,5 %

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2027	8.957.164,19	1.580.676,04	10.537.840,23	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	4.546.872,44	802.389,26	5.349.261,70	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	1.220.790,39	215.433,59	1.436.223,98	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	18.517.817,22	3.267.850,12	21.785.667,34	459.486,20	81.085,80	540.572,00	2,5 %

Projekt 1: Optimizacija vodovodnega sistema Sevnica (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Sevnica)



Občina izvajanja projekta: Sevnica
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 2.250.803,01 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zmanjšati predvidoma 22,3% vrzel med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgubvodnih izgub in zagotovitev rezervnih zajetij (aktivnosti vezane na vrtino DB-2/23). Po izvedbi projekta bo 10.720 prebivalcev priključeno na izboljšan javni vodovod in novozgrajenih 16,09 km cevi v distribucijskem sistemu javnega vodovoda.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.913.182,56	0,00	0,00 %
SLO	337.620,45	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.250.803,01 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Stanje ostaja enako (23.1.2026)

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju


Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.10.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 2: Zelene parkovne površine Brežic



Občina izvajanja projekta: Brežice
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 2.138.337,71 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zagotovitev novih ter ureditev obstoječih javno dostopnih zelenih površin za kakovostno preživetje prostega časa v naravi, sprostitev, rekreacijo, krepitev zdravega življenjskega sloga, druženje prebivalcev in spodbujanje socialnih stikov med njimi znotraj urbanega naselja. Fizični cilj investicije je ureditev zelene infrastrukture s površino območja 9,01 ha.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.817.587,05	0,00	0,00 %
SLO	320.750,66	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.138.337,71 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026:
Čaka se soglasje DRSV. Vloga za mnenje je bila oddana v februarju 2025.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju


Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.06.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 3: Zelene površine mesta Sevnica



Občina izvajanja projekta: Sevnica
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 928.820,20 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Cilj projekta je povečati število prebivalcev (za 5.318), ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v urbanih naseljih in povečati zelene površine, ki bodo prenovljene ali novo ustvarjene na območju 2,01 ha.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	789.497,17	0,00	0,00 %
SLO	139.323,03	0,00	0,00 %
SKUPAJ	928.820,20 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Dokumentacija je v pripravi. GD ni potrebno. Trenutno je vse v predvidenem časovnem roku.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju


Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.06.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 4: Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom



Občina izvajanja projekta: Radeče
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.471.312,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt temelji predvsem na zagotovitvi novih zelenih površin in prenovi obstoječih, v izvedbenem smislu pa v naselju Radeče sledi osi od šolskega griča preko trga do desnega brega Save in naprej ob njem do cestnega mosta čez Savo. Predmet urejanje so površine 1,6 ha na več med seboj povezanih lokacijah.

Zamuda pri projektu	
Datum:	23.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamuda pri pridobivanju projektne dokumentacije je vezana na mnenje DRSV.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.250.615,20	0,00	0,00 %
SLO	220.696,80	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.471.312,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Čakajo na soglasje DRSV, že večkrat sestanek in ne morejo uskladiti. projektna dokumentacija 28.2. Vloga PT 30.4. Projektant je naredil po navodilu DRSV, usklajevanje že večkrat ponovno. Dokumentacija vezana na mnenje DRSV.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju


Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.12.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 5: Zelena infrastruktura v Bistrici ob Sotli



Občina izvajanja projekta: Bistrica ob Sotli
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 700.597,40 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Na območju obstoječega mokrišča se bo sanirala in zasadila nova zasaditev, preuredilo celotno zaraščeno in zapuščeno območje, oblikoval teren za dostop in uporabo, uredile se bodo razgledne in izobraževalne površine ter umestila urbana ter parkovna oprema. Na območju obstoječega pokopališča se bo sanirala in zasadila nova zasaditev, preuredila gospodarska javna infrastruktura, oblikoval teren in uredile pohodne površine ter umestila urbana, parkovna oprema, med obema območjema se bo izvedla zelena povezava. Predmet urejanje so zelene površine v velikosti 1,3 ha.

Zamuda pri projektu	
Datum:	23.01.2026
Zamuda (dni):	30
Obrazložitev:	Zamik je posledica pridobivanja projektne dokumentacije in mnenj (DRSV),

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	595.507,79	0,00	0,00 %
SLO	105.089,61	0,00	0,00 %
SKUPAJ	700.597,40 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Vloga na PT na 30.4.2026, projektna dokumentacija ne bo do 2.3.2026. Projekt ima tudi soglasje DRSV (mokrišče), vloge za soglasje DRSV še niso oddali.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.03.2026)

Status časovnice projekta: Zabeležena zamuda – projekt še v časovnici

Projekt 6: KP D2 – Sevnica



Občina izvajanja projekta: Sevnica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 2.870.376,79 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je povečati število prebivalcev, ki živijo v bližini novih ali izboljšanih kolesarskih poti in imajo možnost varne uporabe kolesa za vsakodnevne poti – predvidoma 1. 457 prebivalcev. Cilj je povečati skupno dolžino kolesarskih poti, ki so bile prenovljene ali na novo zgrajene – predvideno 10,6 km.

Zamuda pri projektu	
Datum:	23.01.2026
Zamuda (dni):	180
Obrazložitev:	Zamik je nastal zaradi pridobivanja vseh potrebnih mnenj za DRSV. Vprašanje je ali bo sva potrebna dokumentacija do predvidenega roka oddaje vloge na PT pravočasna. Rok je 30.9.2026.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	2.439.820,27	0,00	0,00 %
SLO	430.556,52	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.870.376,79 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Težava soglasje DRSV, pripravlja se hidrološko hidravlična študija (dodatna zahteva DRSV). Rok za študijo je 30.4., potrditev (postopek, recenzija), rok za izdajo mnenja DRSV 30.7.2026 pPROJEKTNA DOKUMENTACIJA je predvidena 15.8. 2026. Vloga bo oddana do datuma, vendar ne bo popolna. Pol leta zamude.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (27.02.2026)

Status časovnice projekta: Zabeležena zamuda – projekt še v časovnici

Projekt 7: Regionalna celostna prometna strategija Posavje



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 80.000,00 €
Real: 0,00 €

Odložitev

Kratek opis projekta:

Namen izdelave regijske celostne prometne strategije je uvesti regionalno raven upravljanja s trajnostno mobilnostjo in tako zapolniti vrzel med lokalno in nacionalno ravno načrtovanja.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: 28.11.2025
- 23.01.2026: 6.1.2026

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M3 Oddaja na OU
Naslednja naloga: M4 Odložitev o podpori (30.01.2026)

Status časovnice projekta:

V časovnici

Projekt 8: Regijski center mobilnosti Posavje



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 226.221,01 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen vzpostavitve Regijskega centra mobilnosti (RCM) je zagotavljanje storitev, ki spodbujajo razvoj in uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Ti ukrepi prinašajo pozitivne učinke tako z ekonomskega kot okoljskega vidika, ki prispevajo k razvoju občin in uravnoteženi rabi prostora.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	192.287,85	0,00	0,00 %
SLO	33.933,16	0,00	0,00 %
SKUPAJ	226.221,01 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: 15.12.2025

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M5 Pogodba o sofinanciranju (10.12.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 9: Tematski park: Živa podoba – revitalizacija cister



Občina izvajanja projekta: Kostanjevica na Krki
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 723.000,00 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt bi obsegal obnovo zapuščene nekdanje parkovne površine in integracijo v obnovljeni sistem parkovnih površin ob kulturnem spomeniku. Območje revitalizacije je obzidan prostor tik ob samostanu, ki je danes zaradi več desetletne prepustitve naravni sukcesiji povsem zaraščen. Cilji projekta je povečati skupno površino zelenih površin v velikosti 2 ha in prebivalcem urbanih območij Občine Kostanjevica na Krki omogočiti dostop do novih in prenovljenih zelenih površin, kar bo prispevalo k višji kakovosti življenja.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	614.550,00	0,00	0,00 %
SLO	108.450,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	723.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Težava pogodba o služnostni pravici med občino in MK. Projektno dokumentacijo ne bodo začeli pripravljati dokler MNVP ne potrdi pogodbo. Služnostna pravica za obdobje 10 let-pogoj. Potreben je natečaj. Trenutno je projekt še v predvideni časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.06.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 10: Izgradnja proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator



Občina izvajanja projekta: Krško
Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR
Višina sofinanciranja: 3.834.016,08 €
Real: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja objekta za potrebe podjetniškega inkubatorja, s čimer se bodo vzpostavile nove uporabne površine inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij. Cilj: 1 podjetniški inkubator z velikostjo uporabnih površin za inkubirance (pisarne) in velikost površine namenjene proizvodnim prostorom. Neto tlorisna površina objekta je 2.469,57 m2.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	3.258.913,66	0,00	0,00 %
SLO	575.102,42	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.834.016,08 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Oddaja NPO na PT
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (31.12.2025)

Status časovnice projekta: V zamudi

Projekt 11: Optimizacija vodovodnega sistema Brežice (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Brežice)



0%
Občina izvajanja projekta: Brežice
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 5.023.911,14 €
Real: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je zmanjšati predvidoma 22,2% vrzel med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgub ter zagotovitev rezervnega vodnega vira. Po izvedbi projekta bo 18.031 prebivalcev priključeno na izboljššan javni vodovod in novozgrajenih 34,5 km cevi v distribucijskem sistemu javnega vodovoda.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	4.270.324,47	0,00	0,00 %
SLO	753.586,67	0,00	0,00 %
SKUPAJ	5.023.911,14 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 23.01.2026: Več gradbenih dovoljenj za posamezne odseke posebej, 7/10 služnosti pridobljeno, v februarju več vlog GD. Popolna projektna dokumentacija in oddaje vloge na PT 30.6.2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: V časovnici

Projekt 12: Podjetno nad izzive v Posavski regiji



Občina izvajanja projekta: Krško
Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Real: 540.572,00 €

Izvajanje

Kratek opis projekta:

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	
EU	1.307.531,20	459.486,20	35,14 %
SLO	230.740,80	81.085,80	35,14 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	540.572,00 €	35,14 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek
Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (23.08.2026)

Status časovnice projekta:


V časovnici

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	200.447,00	35.373,00	235.820,00	200.447,00	35.373,00	235.820,00	100,0 %
2025	265.206,80	46.801,20	312.008,00	259.039,20	45.712,80	304.752,00	97,7 %
2026	259.039,20	45.712,80	304.752,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	262.123,00	46.257,00	308.380,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	320.715,20	56.596,80	377.312,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.307.531,20	230.740,80	1.538.272,00	459.486,20	81.085,80	540.572,00	35,1 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

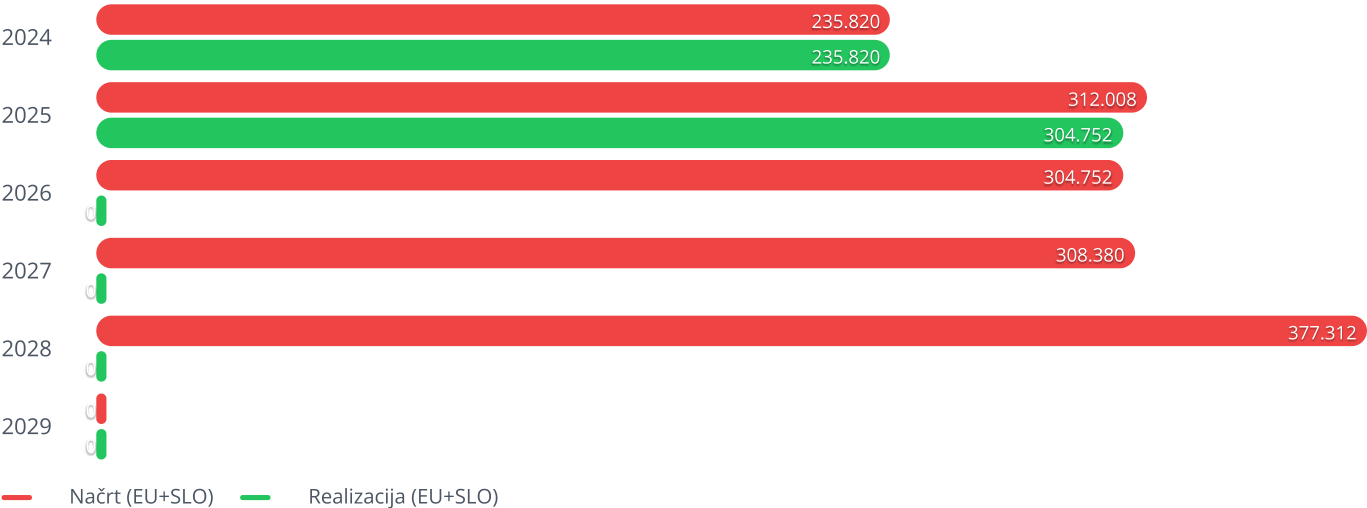


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	0%

Poročilo je pripravil: Ana Stružnik

Datum in čas priprave: 28.01.2026 13:30

Dodatne opombe:

Ni opomb.

Skrbnik regije

Odgovorna oseba
