


DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Primorsko-notranjska

Število projektov v dogovoru:	10
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	3
Višina dodeljenih sredstev:	17.832.132,35 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	689.320,00 EUR

Črpanje (real/plan):

4%



Projekti zelo zamujajo

30% v časovnici

19.05.2026

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real	% real.
1.	RSO1.3 - INKUBATOR	1	4.446.834,36	0,00	0,00 %
2.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	689.320,00	44,81 %
3.	RSO2.5 - OČOV	3	7.245.386,89	0,00	0,00 %
4.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	2	2.211.657,96	0,00	0,00 %
5.	RSO3.2 - KOLESARKE	1	2.070.826,59	0,00	0,00 %
6.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	319.154,55	0,00	0,00 %
SKUPAJ		10	17.832.132,35	689.320,00	3,87 %

Pregled projektov po upravičencih


Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
DRSI	1	2.070.826,59	0,00
Občina Bloke	1	1.235.580,16	0,00
Občina Cerknica	1	2.862.929,64	0,00
Občina Ilirska Bistrica	1	2.506.088,41	0,00
Občina Loška dolina	1	1.876.368,84	0,00
Občina Pivka	1	976.077,80	0,00
Občina Postojna	1	4.446.834,36	0,00
Občina Pivka			
RRA Zeleni kras	3	1.857.426,55	689.320,00
SKUPAJ	10	17.832.132,35	689.320,00

Predvideno črpanje po letih

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	246.704,00	43.536,00	290.240,00	246.704,00	43.536,00	290.240,00	100,0 %
SKUPAJ	15.157.312,50	2.674.819,85	17.832.132,35	585.922,00	103.398,00	689.320,00	3,9 %

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2025	314.547,60	55.508,40	370.056,00	339.218,00	59.862,00	399.080,00	107,8 %
2026	5.596.573,09	987.630,55	6.584.203,64	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	6.691.757,29	1.180.898,34	7.872.655,63	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	2.307.730,52	407.246,56	2.714.977,08	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	15.157.312,50	2.674.819,85	17.832.132,35	585.922,00	103.398,00	689.320,00	3,9 %

Projekt 1: Izgradnja DKP D7, odsek Ilirska Bistrica – Zabiče



Občina izvajanja projekta: Ilirska Bistrica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 2.070.826,59 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Izgradnja Državne Kolesarske povezave D7, odsek Ilirska Bistrica-Zabiče od km 0+388 do km 3+040 za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na območju občine Ilirska Bistrica s povezavo proti Krasu in Kvarnerskemu zalivu. V nadaljevalni fazi se planira izvedba kolesarske povezave od Ilirske Bistrice do Kosez, kjer se prične že obstoječa povezava preko Brkinov do Rodika in naprej proti Sežani. Namen projekta je tudi spreminjanje potovalnih navad v lokalni skupnosti, kar bo doseženo z razvojem ustrezne kolesarske infrastrukture, ki bo omogočala varno kolesarjenje iz vasi v mesto Ilirska Bistrica. V sklopu operacije bo urejenih 1.424 m ločenih kolesarskih poti in 1.256 m sharrowa.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.760.202,60	0,00	0,00 %
SLO	310.623,99	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.070.826,59 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano
 ■ V izvajanju
 ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (18.09.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Projekt 2: RCPS Zeleni kras**Specifični cilj:** RSO3.2 - RCM - RCPS**Višina sofinanciranja:** 80.000,00 €**Realizacija črpanja:** 0,00 €**Izvedba****Kratek opis projekta:**

Namen projekta je izdelava RCPS Gorenjske, ki bo za sedemletno obdobje opredelila ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v regiji. Skozi proces priprave RCPS se bo vzpostavilo strateško in ciljno usmerjeno prometno načrtovanje na regionalni ravni, celostno upravljanje prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja**Naslednja naloga:** M8 Ključni vmesni zahtevki (07.08.2026)

Status časovnice projekta:


Projekt je v časovnici

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	47.600,00	8.400,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	20.400,00	3.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	68.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

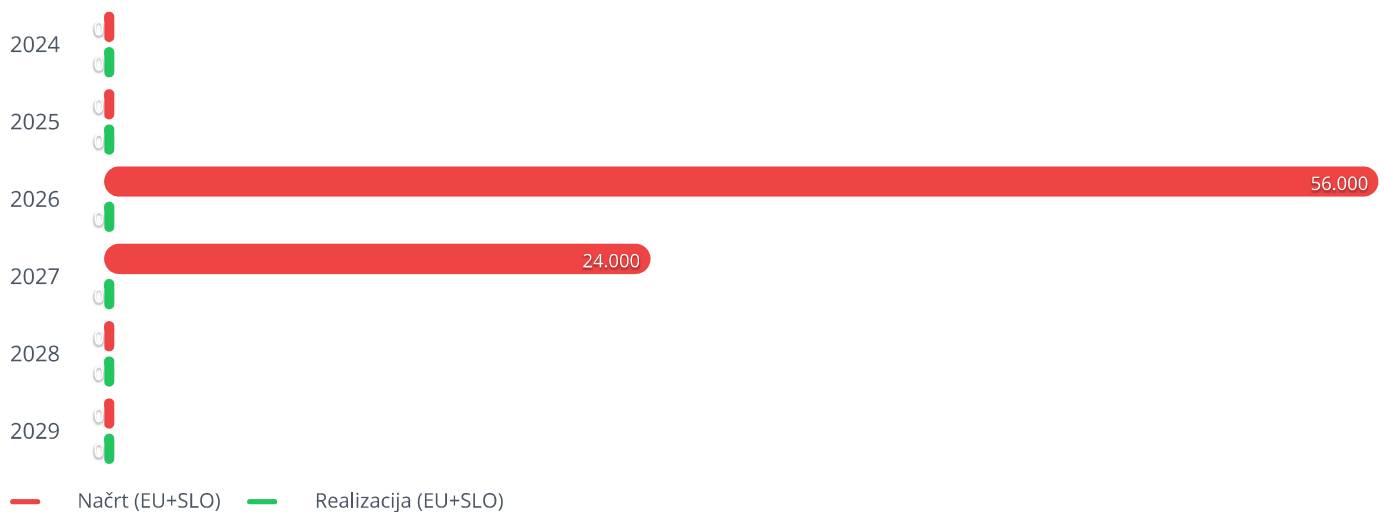

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.


Projekt 3: Mrežni podjetniški inkubator PNR- 4.FAZA

4

NAPREDEK

17. septembra, 2024

24. novembra, 2028

**Občina izvajanja projekta:** Pivka, Postojna

39%

Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR**Višina sofinanciranja:** 4.446.834,36 €**Realizacija črpanja:** 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Ureditev dodatnih prostorov za mrežni podjetniški inkubator ter umestitev dodatnih vsebin, ki bi spodbujale razvoj podjetništva. Prenova in ureditev prostorov na štirih različnih lokacijah: POC Veliki otok, Kutinova hiša v jedru Postojne in dve lokaciji na Kolodvorski cesti v Pivki.

Zamuda pri projektu	
Datum:	17. 3. 2026
Zamuda (dni):	145
Obrazložitev:	Kadrovske težave. Oddaja vloge za NPO 31. 7. 2026.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.779.809,21	0,00	0,00 %
SLO	667.025,15	0,00	0,00 %
SKUPAJ	4.446.834,36 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.**Naslednja naloga:** M1 Potrditev DIIP/IDZ (04.11.2025)**Status časovnice projekta:**

Projekt zamuja (235 dni + 0 dni)

Projekt 4: Opremljanje aglomeracije Rakek 2019



Občina izvajanja projekta: Cerknica
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 2.862.929,64 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Investicijski posegi v naseljih Unec in Slivice, kjer se bo gradilo ca. 9769,10 m kanalizacijskega omrežja, od tega 2.641,20 m tlačnega voda.

Zamuda pri projektu	
Datum:	17. 3. 2026
Zamuda (dni):	30
Obrazložitev:	Ni še gradbenega dovoljenja in končane projektne dokumentacije. Oddaja vloge za NPO predvidoma do 30. 4. 2026.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.433.490,20	0,00	0,00 %
SLO	429.439,44	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.862.929,64 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano
 ■ V izvajanju
 ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (90 dni + 49 dni)

Projekt 5: Nadgradnja ČN Stari trg pri Ložu



Občina izvajanja projekta: Loška dolina

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 1.876.368,84 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Nadgradnja obstoječe čistilne naprave Stari Trg (novogradnja), saj je obstoječa čistilna naprava premajhne kapacitete za količino PE v aglomeraciji. Namen projekta je zagotoviti kapaciteto in stopnjo čiščenja čistilne naprave, ki bo zagotavljala zaščito podtalne vode na področju obravnavanih naselij ter s tem uskladiti stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami.

Zamuda pri projektu	
Datum:	15.01.2026
Zamuda (dni):	45
Obrazložitev:	

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.594.913,51	0,00	0,00 %
SLO	281.455,33	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.876.368,84 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (15.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (45 dni + 110 dni)

Projekt 6: Opremljanje aglomeracije Ilirska Bistrica 2019

2

NAPREDEK

10. oktobra, 2024

19. oktobra, 2029



Občina izvajanja projekta: Ilirska Bistrica ^{31%}

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 2.506.088,41 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Ureditev 5.900 m novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode. Zagotovitev preko 98% priključenosti objektov na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Ilirska Bistrica. Priključitev dodatnih 455 prebivalcev (iz DRR viri) na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Ilirska Bistrica.

Zamuda pri projektu	
Datum:	11.05.2026
Zamuda (dni):	90
Obrazložitev:	Zamik zaradi težav s pridobivanjem projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.130.175,14	0,00	0,00 %
SLO	375.913,27	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.506.088,41 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.02.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (210 dni + 0 dni)

Projekt 7: Ureditev zelene infrastrukture v Pivki



Občina izvajanja projekta: Pivka

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 976.077,80 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Parkovna ureditev, javna igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine ob stavbah in športno rekreacijski park z zasaditvami in urbano opremo v skupni površini predvideno okrog 30.000 m².

Zamuda pri projektu	
Datum:	17. 3. 2026
Zamuda (dni):	150
Obrazložitev:	Gradbeno dovoljenje še ni urejeno ter projektna dokumentacija. Oddaja vloge predvidoma do 31. 7. 2026

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	829.666,13	0,00	0,00 %
SLO	146.411,67	0,00	0,00 %
SKUPAJ	976.077,80 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (15.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (195 dni + 0 dni)

Projekt 8: Podjetno nad izzive v Primorsko-Notranjski regiji - PONI Primorsko-Notranjska



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI

Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €

Realizacija črpanja: 689.320,00 €

Izvedba

Kratek opis projekta:

Projekt PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje podjetništva. Je program 4 mesečnega podjetniškega usposabljanja oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo in jo ob pomoči mentorjev in vsebinskih usposabljanj ter svetovanj spremeniti v tržno zanimive produkte oziroma storitve. Cilj je v projektu usposobiti 106 oseb, od katerih se vsaj 31 (30 %) po zaključku registrira kot pravna oblika.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.307.531,20	585.922,00	44,81 %
SLO	230.740,80	103.398,00	44,81 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	689.320,00 €	44,81 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena

Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (08.03.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	246.704,00	43.536,00	290.240,00	246.704,00	43.536,00	290.240,00	100,0 %
2025	314.547,60	55.508,40	370.056,00	339.218,00	59.862,00	399.080,00	107,8 %
2026	339.218,00	59.862,00	399.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	305.296,20	53.875,80	359.172,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	101.765,40	17.958,60	119.724,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.307.531,20	230.740,80	1.538.272,00	585.922,00	103.398,00	689.320,00	44,8 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)




Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1


Skupni napredek kazalnikov



RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RC004	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RC005	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	 0%

Poročilo je pripravil: Katja Štucin

Datum in čas priprave: 19.05.2026 11:09

Projekt 9: Zelene ureditve v Novi vasi

Občina izvajanja projekta: Bloke

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.235.580,16 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Zasaditev novih avtohtonih in sadnih dreves in postavitve zelene urbane opreme: Klopi, mize in drugi elementi, izdelane iz trajnostnih materialov. Ureditev šolskega eko vrtička z infrastrukturo za upravljanje in uporabo (lesene visoke grede, napeljava za zalivanje). Ureditev parka z novimi učilnicami na prostem. Vzpostavitev novega otroškega igrišča z varnim in stimulativnim okoljem za igro ter razvoj motoričnih in socialnih veščin otrok različnih starostnih skupin. Ureditev travnatega nogometnega igrišča z zelenimi tribunami. Izdelava »pump track« steze. Skupna površina okrog 20.050 m².

Zamuda pri projektu	
Datum:	11.05.2026
Zamuda (dni):	29
Obrazložitev:	Zamuda zaradi težav s pridobivanjem projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.050.243,14	0,00	0,00 %
SLO	185.337,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.235.580,16 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano
 ■ V izvajanju
 ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.03.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (29 dni + 20 dni)

Projekt 10: Regijski center mobilnosti Zeleni kras



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS

Višina sofinanciranja: 239.154,55 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Izvedba

Kratek opis projekta:

Vzpostavitev in delovanje Regijskega centra mobilnosti Zeleni kras, upravljanja trajnostne mobilnosti na regionalni ravni, sodelovanje in podpora nacionalni in lokalni ravni, dvig ozaveščenosti širše javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti in sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	203.281,37	0,00	0,00 %
SLO	35.873,18	0,00	0,00 %
SKUPAJ	239.154,55 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja


Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevki (15.10.2027)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki**Sofinanciranje**

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	120.870,00	21.330,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	65.929,09	11.634,55	77.563,64	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	16.482,28	2.908,63	19.390,91	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	203.281,37	35.873,18	239.154,55	0,00	0,00	0,00	0,0 %

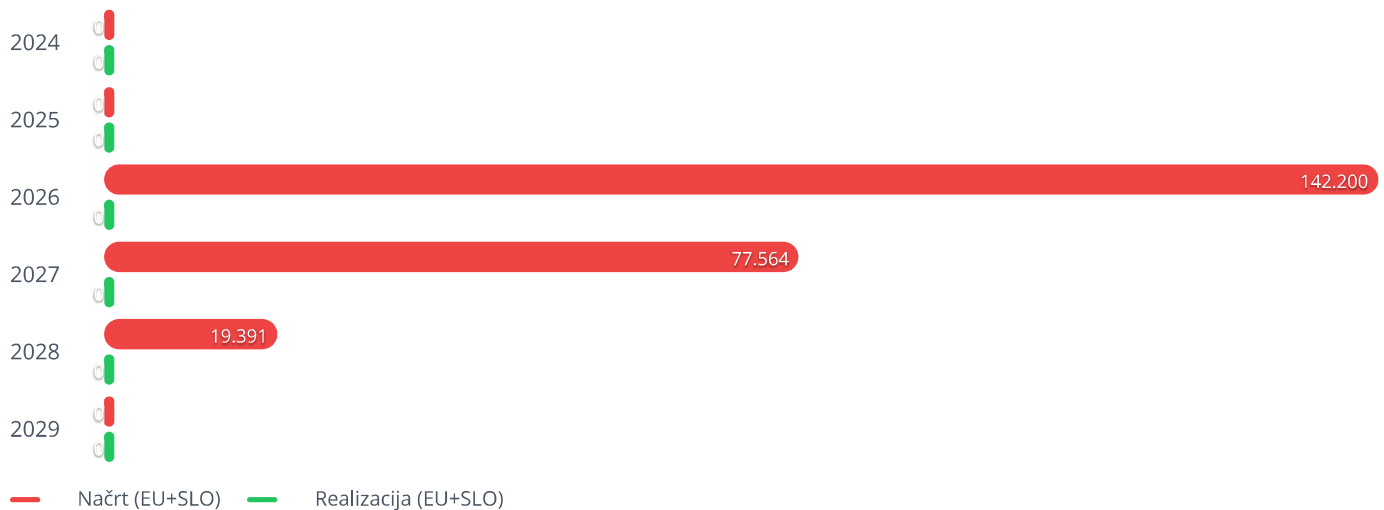Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)**Kazalniki projekta****Kazalniki projekta**

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Dodatne opombe:

Ni opomb.

Skrbnik regije

Odgovorna oseba
