


# DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

## Poročilo o projektih – Razvojna regija Posavska

Število projektov v dogovoru:	12
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	2
Višina dodeljenih sredstev:	21.785.667,34 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	540.572,00 EUR

Črpanje (real/plan):

2%



**Projekti zelo zamujajo**

**50% v časovnici**

19.05.2026

## Kratek povzetek projektov

### Trenutne faze projektov



### Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real	% real.
1.	RSO1.3 - INKUBATOR	1	3.834.016,08	0,00	0,00 %
2.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	540.572,00	35,14 %
3.	RSO2.5 - VODOVODI	2	7.274.714,15	0,00	0,00 %
4.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	5	5.962.067,31	0,00	0,00 %
5.	RSO3.2 - KOLESARKE	1	2.870.376,79	0,00	0,00 %
6.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	306.221,01	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>		<b>12</b>	<b>21.785.667,34</b>	<b>540.572,00</b>	<b>2,48 %</b>

### Pregled projektov po upravičencih


Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Mestna občina Krško	1	3.834.016,08	0,00
Občina Bistrica ob Sotli	1	700.597,40	0,00
Občina Brežice	2	7.162.248,85	0,00
Občina Kostanjevica na Krki	1	723.000,00	0,00
Občina Radeče	1	1.471.312,00	0,00
Občina Sevnica	3	6.050.000,00	0,00
Regionalna razvojna agencija Pc	3	1.844.493,01	540.572,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>12</b>	<b>21.785.667,34</b>	<b>540.572,00</b>

### Predvideno črpanje po letih

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	200.447,00	35.373,00	235.820,00	200.447,00	35.373,00	235.820,00	100,0 %
2025	265.206,80	46.801,20	312.008,00	259.039,20	45.712,80	304.752,00	97,7 %
2026	1.856.849,41	327.679,32	2.184.528,73	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.517.817,22</b>	<b>3.267.850,12</b>	<b>21.785.667,34</b>	<b>459.486,20</b>	<b>81.085,80</b>	<b>540.572,00</b>	<b>2,5 %</b>

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2027	10.427.651,18	1.840.173,75	12.267.824,93	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	4.546.872,44	802.389,26	5.349.261,70	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	1.220.790,39	215.433,59	1.436.223,98	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.517.817,22</b>	<b>3.267.850,12</b>	<b>21.785.667,34</b>	<b>459.486,20</b>	<b>81.085,80</b>	<b>540.572,00</b>	<b>2,5 %</b>

## Projekt 1: Zelena infrastruktura v Bistrici ob Sotli



**Občina izvajanja projekta:** Bistrica ob Sotli

**Specifični cilj:** RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

**Višina sofinanciranja:** 700.597,40 €

**Realizacija črpanja:** 0,00 €

Priprava

### Kratek opis projekta:

Na območju obstoječega mokrišča se bo sanirala in zasadila nova zasaditev, preuredilo celotno zaraščeno in zapuščeno območje, oblikoval teren za dostop in uporabo, uredile se bodo razgledne in izobraževalne površine ter umestila urbana ter parkovna oprema. Na območju obstoječega pokopališča se bo sanirala in zasadila nova zasaditev, preuredila gospodarska javna infrastruktura, oblikoval teren in uredile pohodne površine ter umestila urbana, parkovna oprema, med obema območjema se bo izvedla zelena povezava. Predmet urejanje so zelene površine v velikosti 1,3 ha.

Zamuda pri projektu	
<b>Datum:</b>	15.05.2026
<b>Zamuda (dni):</b>	180
<b>Obrazložitev:</b>	Zamuda je nastala zaradi OPN.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	595.507,79	0,00	0,00 %
SLO	105.089,61	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>700.597,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


**Zadnja potrjena naloga:** Ni potrjenih nalog.

**Naslednja naloga:** M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.03.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (210 dni + 0 dni)

## Projekt 2: Optimizacija vodovodnega sistema Sevnica (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Sevnica)



Občina izvajanja projekta: Sevnica 32%

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 2.250.803,01 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

### Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zmanjšati predvidoma 22,3% vrzel med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgubvodnih izgub in zagotovitev rezervnih zajetij (aktivnosti vezane na vrtno DB-2/23). Po izvedbi projekta bo 10.720 prebivalcev priključeno na izboljšan javni vodovod in novozgrajenih 16,09 km cevi v distribucijskem sistemu javnega vodovoda.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.913.182,56	0,00	0,00 %
SLO	337.620,45	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.250.803,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.10.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

## Projekt 3: Zelene parkovne površine Brežic



Občina izvajanja projekta: Brežice

34%

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 2.138.337,71 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

### Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zagotovitev novih ter ureditev obstoječih javno dostopnih zelenih površin za kakovostno preživljanje prostega časa v naravi, sprostitev, rekreacijo, krepitev zdravega življenjskega sloga, druženje prebivalcev in spodbujanje socialnih stikov med njimi znotraj urbanega naselja. Fizični cilj investicije je ureditev zelene infrastrukture s površino območja 9,01 ha.

Zamuda pri projektu	
Datum:	15.05.2026
Zamuda (dni):	90
Obrazložitev:	Zamuda je posledica sprememba projekta.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.817.587,05	0,00	0,00 %
SLO	320.750,66	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.138.337,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.06.2026)

Status časovnice projekta:

Zaznana zamuda (+90 dni) – projekt je v časovnici

**Projekt 4: Zelene površine mesta Sevnica**

**Občina izvajanja projekta:** Sevnica 31%  
**Specifični cilj:** RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA  
**Višina sofinanciranja:** 928.820,20 €  
**Realizacija črpanja:** 0,00 €

**Priprava****Kratek opis projekta:**

Cilj projekta je povečati število prebivalcev (za 5.318), ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v urbanih naseljih in povečati zelene površine, ki bodo prenovljene ali novo ustvarjene na območju 2,01 ha.

**Povzetek financiranja:**

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	789.497,17	0,00	0,00 %
SLO	139.323,03	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>928.820,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

**Časovni vidik izvedbe projekta**

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

**Zadnja potrjena naloga:** Ni potrjenih nalog.  
**Naslednja naloga:** M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.06.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

## Projekt 5: Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom



Občina izvajanja projekta: Radeče

34%

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.471.312,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

### Kratek opis projekta:

Projekt temelji predvsem na zagotovitvi novih zelenih površin in prenovi obstoječih, v izvedbenem smislu pa v naselju Radeče sledi osi od šolskega griča preko trga do desnega brega Save in naprej ob njem do cestnega mosta čez Savo. Predmet urejanje so površine 1,6 ha na več med seboj povezanih lokacijah.

Zamuda pri projektu	
Datum:	15.05.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamuda nastaja zaradi pridobivanja projektne dokumentacije in soglasij (DRSV),

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.250.615,20	0,00	0,00 %
SLO	220.696,80	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.471.312,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (120 dni + 49 dni)

**Projekt 6: KP D2 – Sevnica**

**Občina izvajanja projekta:** Sevnica<sup>29%</sup>  
**Specifični cilj:** RSO3.2 - KOLESARKE  
**Višina sofinanciranja:** 2.870.376,79 €  
**Realizacija črpanja:** 0,00 €

**Priprava****Kratek opis projekta:**

Namen projekta je povečati število prebivalcev, ki živijo v bližini novih ali izboljšanih kolesarskih poti in imajo možnost varne uporabe kolesa za vsakodnevne poti – predvidoma 1. 457 prebivalcev. Cilj je povečati skupno dolžino kolesarskih poti, ki so bile prenovljene ali na novo zgrajene – predvideno 10,6 km.

Zamuda pri projektu	
<b>Datum:</b>	23.01.2026
<b>Zamuda (dni):</b>	180
<b>Obrazložitev:</b>	Zamik je nastal zaradi pridobivanja vseh potrebnih mnenj za DRSV. Vprašanje je ali bo sva potrebna dokumentacija do predvidenega roka oddaje vloge na PT pravočasna. Rok je 30.9.2026.

**Povzetek financiranja:**

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.439.820,27	0,00	0,00 %
SLO	430.556,52	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.870.376,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

**Časovni vidik izvedbe projekta**

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

**Zadnja potrjena naloga:** Ni potrjenih nalog.  
**Naslednja naloga:** M1 Potrditev DIIP/IDZ (27.02.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (180 dni + 0 dni)

## Projekt 7: Regionalna celostna prometna strategija Posavje



**Specifični cilj:** RSO3.2 - RCM - RCPS  
**Višina sofinanciranja:** 80.000,00 €  
**Realizacija črpanja:** 0,00 €

Izvedba

### Kratek opis projekta:

Namen izdelave regijske celostne prometne strategije je uvesti regionalno raven upravljanja s trajnostno mobilnostjo in tako zapolniti vrzel med lokalno in nacionalno ravno načrtovanja.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

**Zadnja potrjena naloga:** M7 Začetek izvajanja

**Naslednja naloga:** M8 Ključni vmesni zahtevki (30.09.2026)

Status časovnice projekta:


Projekt je v časovnici

## Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

### Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	27.200,00	4.800,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	40.800,00	7.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>68.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>


### Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

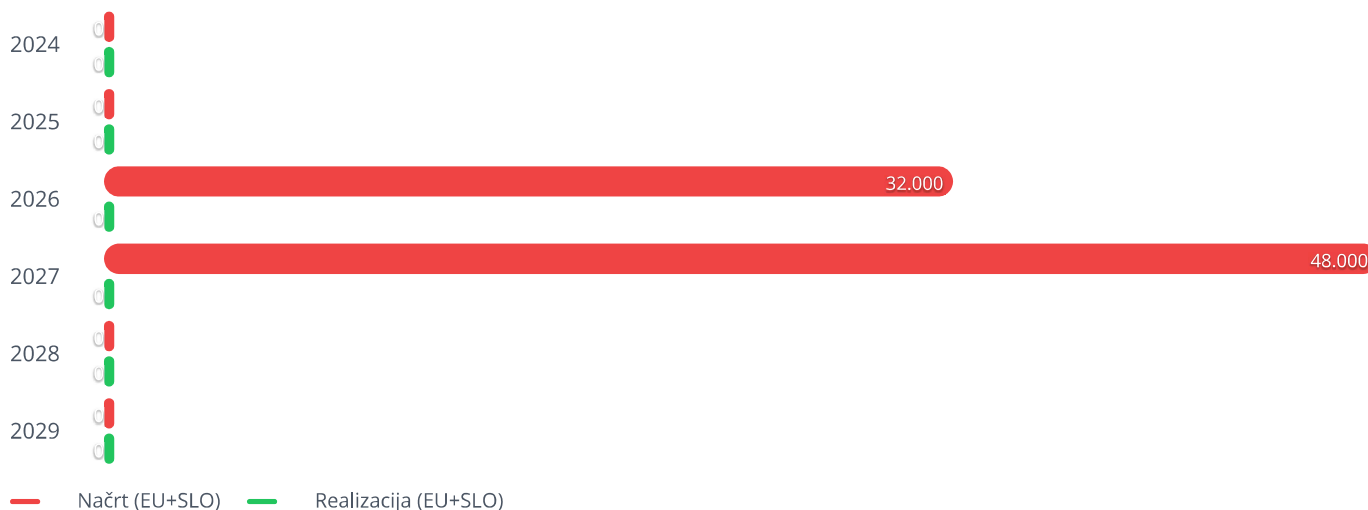

### Kazalniki projekta

#### Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

**Projekt 8: Regijski center mobilnosti POSAVJE**

**Specifični cilj:** RSO3.2 - RCM - RCPS

**Višina sofinanciranja:** 226.221,01 €

**Realizacija črpanja:** 0,00 €

46%

**Odločitev**

**Kratek opis projekta:**

Namen vzpostavitve Regijskega centra mobilnosti (RCM) je zagotavljanje storitev, ki spodbujajo razvoj in uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Ti ukrepi prinašajo pozitivne učinke tako z ekonomskega kot okoljskega vidika, ki prispevajo k razvoju občin in uravnoteženi rabi prostora.

**Povzetek financiranja:**

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	192.287,85	0,00	0,00 %
SLO	33.933,16	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>226.221,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

**Časovni vidik izvedbe projekta**

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

**Zadnja potrjena naloga:** M7 Začetek izvajanja

**Naslednja naloga:** M5 Pogodba o sofinanciranju (10.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

## Projekt 9: Tematski park: Živa podoba – revitalizacija cister



**Občina izvajanja projekta:** Kostanjevica na Krki <sup>37%</sup>

**Specifični cilj:** RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

**Višina sofinanciranja:** 723.000,00 €

**Realizacija črpanja:** 0,00 €

Priprava

### Kratek opis projekta:

Projekt bi obsegal obnovo zapuščene nekdanje parkovne površine in integracijo v obnovljeni sistem parkovnih površin ob kulturnem spomeniku. Območje revitalizacije je obzidan prostor tik ob samostanu, ki je danes zaradi več desetletne prepustitve naravni sukcesiji povsem zaraščen. Cilji projekta je povečati skupno površino zelenih površin v velikosti 2 ha in prebivalcem urbanih območij Občine Kostanjevica na Krki omogočiti dostop do novih in prenovljenih zelenih površin, kar bo prispevalo k višji kakovosti življenja.

Zamuda pri projektu	
<b>Datum:</b>	15.05.2026
<b>Zamuda (dni):</b>	90
<b>Obrazložitev:</b>	Zamik je nastal zaradi Ministrstva za kulturo in podpisa pogodbe z njimi.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	614.550,00	0,00	0,00 %
SLO	108.450,00	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>723.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.06.2026)

Status časovnice projekta:

Zaznana zamuda (+90 dni) – projekt je v časovnici

## Projekt 10: Izgradnja proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator v Mestni občini Krško



Občina izvajanja projekta: Krško 30%  
 Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR  
 Višina sofinanciranja: 3.834.016,08 €  
 Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

### Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja objekta za potrebe podjetniškega inkubatorja, s čimer se bodo vzpostavile nove uporabne površine inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij. Cilj: 1 podjetniški inkubator z velikostjo uporabnih površin za inkubirance (pisarne) in velikost površine namenjene proizvodnim prostorom. Neto tlorisna površina objekta je 2.469,57 m<sup>2</sup>.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.258.913,66	0,00	0,00 %
SLO	575.102,42	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.834.016,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano   ■ V izvajanju   ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: M4 Odločitev o podpori

Naslednja naloga: M5 Pogodba o sofinanciranju (27.02.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

## Projekt 11: Optimizacija vodovodnega sistema Brežice (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Brežice)



0%  
**Občina izvajanja projekta:** Brežice  
**Specifični cilj:** RSO2.5 - VODOVODI  
**Višina sofinanciranja:** 5.023.911,14 €  
**Realizacija črpanja:** 0,00 €

Priprava

### Kratek opis projekta:

Namen projekta je zmanjšati predvidoma 22,2% vrzel med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgub ter zagotovitev rezervnega vodnega vira. Po izvedbi projekta bo 18.031 prebivalcev priključeno na izboljššan javni vodovod in novozgrajenih 34,5 km cevi v distribucijskem sistemu javnega vodovoda.

Zamuda pri projektu	
<b>Datum:</b>	15.05.2026
<b>Zamuda (dni):</b>	120
<b>Obrazložitev:</b>	Zamik je nastal zaradi pridobivanja projektne dokumentacije.

### Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	4.270.324,47	0,00	0,00 %
SLO	753.586,67	0,00	0,00 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.023.911,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.  
 Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (120 dni + 0 dni)

**Projekt 12: Podjetno nad izzive v Posavski regiji – PONI Posavje****Specifični cilj:** RSO1.3 - PONI**Višina sofinanciranja:** 1.538.272,00 €**Realizacija črpanja:** 540.572,00 €**Izvedba****Kratek opis projekta:**

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje

**Povzetek financiranja:**

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.307.531,20	459.486,20	35,14 %
SLO	230.740,80	81.085,80	35,14 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.538.272,00 €</b>	<b>540.572,00 €</b>	<b>35,14 %</b>

**Časovni vidik izvedbe projekta**

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

**Zadnja potrjena naloga:** M2 Zaključena**Naslednja naloga:** M9 50% izvedbe (23.08.2026)

Status časovnice projekta:


Projekt je v časovnici

## Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

## Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	200.447,00	35.373,00	235.820,00	200.447,00	35.373,00	235.820,00	100,0 %
2025	265.206,80	46.801,20	312.008,00	259.039,20	45.712,80	304.752,00	97,7 %
2026	259.039,20	45.712,80	304.752,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	262.123,00	46.257,00	308.380,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	320.715,20	56.596,80	377.312,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.307.531,20</b>	<b>230.740,80</b>	<b>1.538.272,00</b>	<b>459.486,20</b>	<b>81.085,80</b>	<b>540.572,00</b>	<b>35,1 %</b>

## Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

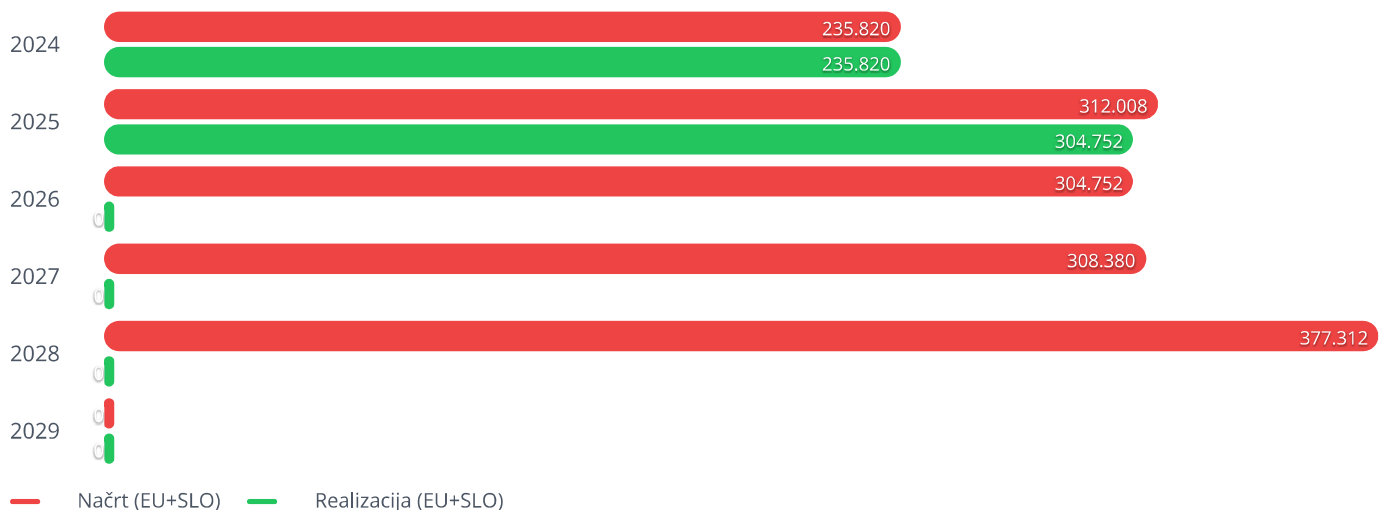


## Kazalniki projekta

## Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

## Skupni napredek kazalnikov



## RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
<b>RC004</b>	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
<b>RC005</b>	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	<div style="width: 0%;"></div> 0%

Poročilo je pripravil: Gabrijela Jerič Jevšenak

Datum in čas priprave: 19.05.2026 09:33

### Dodatne opombe:

*Ni opomb.*

Skrbnik regije

Odgovorna oseba
