



DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Osrednjeslovenska

Število projektov v dogovoru:	32
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	3
Višina dodeljenih sredstev:	53.059.373,77 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	689.320,00 EUR

Črpanje (real/plan):

1%

Projekti zelo zamujajo

22% v časovnici

Kako brati poročilo

Poročilo prikazuje trenutno stanje projektov, fazo izvedbe, finančne podatke, kazalnike in napovedi na podlagi podatkov, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov.

Pomen faz projekta

Faza	Pomen
Priprava dokumentacije	Priprava investicijske in projektne dokumentacije ter oddaja vloge.
Odločitev	Projekt je v obravnavi pri posredniškem telesu, organu upravljanja ali v pripravi pogodbe.
Izvajanje	Pogodba o sofinanciranju je podpisana in projekt se izvaja.
Zaključek	Projekt je izvedbeno oziroma finančno zaključen.

Pomen barv

- Upravičenec / priprava dokumentacije
- PT obravnava
- OU odločanje
- PT pogodba
- Izvajanje
- Zaključeno

Napovedi in finančni podatki

Predvideni datumi prehodov med fazami in napovedi koriščenja sredstev so analitične ocene, pripravljene na podlagi evidentiranih podatkov o projektih, pogodbeni dinamiki, realizaciji in napredovanju projektov.

Kazalo projektov

1. Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR — RSO1.3 - PONI
2. Rekonstrukcija vodovoda Spodnje Stranje – Stahovica (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Kamnik) — Kamnik · RSO2.5 - VODOVODI
3. Vodovod Logatec – Ograje, Laze – Ravnik, Hrušica (predlog naziva: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 4. sklop) — Logatec · RSO2.5 - VODOVODI
4. Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Medvode) — Medvode · RSO2.5 - VODOVODI
5. Modernizacija vodovodnega sistema v občini Moravče — Moravče · RSO2.5 - VODOVODI
6. Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu — Dol pri Ljubljani · RSO2.5 - OČOV
7. Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019 — Ljubljana · RSO2.5 - OČOV
8. Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE — Vrhnika · RSO2.5 - OČOV
9. Ureditev zelenih površin Športnega parka Brezovica — Brezovica · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
10. Ozelenitev in oživitev občinskega centra Dobrova — Dobrova - Polhov Gradec · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
11. Ureditev osrednje mestne javne površine v Domžalah — Domžale · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
12. Športni park Brinje — Grosuplje · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
13. Celovita ureditev centra Ig — Ig · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
14. Urejanje zelenih površin v mestnem jedru Kamnika — Kamnik · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
15. Ureditev in širitev pokopališča v Komendi — Komenda · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
16. Ureditev novega vrtičkarskega območja Grba III — Ljubljana · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
17. Učna in doživljajska pot Logašica – Park Jačka — Logatec · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

18. **Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol** — Mengeš · RSO2.7 - ZELENNA INFRASTRUKTURA
19. **Mreža zelenih površin Šmartno** — Šmartno pri Litiji · RSO2.7 - ZELENNA INFRASTRUKTURA
20. **DRR Zelena infrastruktura** — Trzin · RSO2.7 - ZELENNA INFRASTRUKTURA
21. **Kolesarska povezava Breg – Pako** — Borovnica · RSO3.2 - KOLESARKE
22. **KP Notranje Gorice – Podpeč** — Brezovica · RSO3.2 - KOLESARKE
23. **Rekonstrukcija ceste Lobček – Plešivica in gradnja državnega kolesarskega omrežja – G10** — Grosuplje · RSO3.2 - KOLESARKE
24. **Kolesarska povezava R10 v Občini Horjul** — Horjul · RSO3.2 - KOLESARKE
25. **Kolesarske poti v Občini Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični** — Ivančna Gorica · RSO3.2 - KOLESARKE
26. **Rekonstrukcija kolesarskih površin Ob Ljubljani** — Ljubljana · RSO3.2 - KOLESARKE
27. **Ureditev državne kolesarske povezave D1 Ob Zaloški cesti, Lj.** — Ljubljana · RSO3.2 - KOLESARKE
28. **Državna kol. povezava R33Odsek Dob-Lukovica-Krašnja** — Lukovica · RSO3.2 - KOLESARKE
29. **KP G10, Ljubljana Škofljica** — Škofljica · RSO3.2 - KOLESARKE
30. **Glavna kolesarska povezava G9 Turjak-Velike Lašče-DEL** — Velike Lašče · RSO3.2 - KOLESARKE
31. **Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije** — RSO3.2 - RCM - RCPS
32. **Regionalna celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije** — RSO3.2 - RCM - RCPS

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real	% real.
1.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	689.320,00	44,81 %
2.	RSO2.5 - OČOV	3	15.131.703,87	0,00	0,00 %
3.	RSO2.5 - VODOVODI	4	5.271.028,29	0,00	0,00 %
4.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	12	10.147.122,34	0,00	0,00 %
5.	RSO3.2 - KOLESARKE	10	20.142.429,27	0,00	0,00 %
6.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	828.818,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ		32	53.059.373,77	689.320,00	1,30 %

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
DRSI	3	2.836.757,07	0,00
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	1	9.433.017,00	0,00
Mestna občina Ljubljana	1	732.043,14	0,00
MO Ljubljana	2	14.042.692,44	0,00
OBČINA DOL	1	4.000.000,00	0,00
OBČINA VRHNIKA	1	1.698.686,87	0,00
Občina Brezovica	2	1.091.030,82	0,00
Občina Dobrova Polhov Gradec	1	240.000,00	0,00
Občina Domžale	1	3.417.258,00	0,00
Občina Grosuplje	2	618.621,90	0,00
Občina Ig	1	1.559.952,04	0,00
Občina Ivančna Gorica	1	1.691.453,50	0,00
Občina Kamnik	2	2.062.689,00	0,00

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Občina Komenda	1	621.491,98	0,00
Občina Logatec	2	1.415.909,98	0,00
Občina Lukovica	1	836.763,84	0,00
Občina Medvode	1	1.621.335,00	0,00
Občina Mengeš	1	811.199,42	0,00
Občina Moravče	1	600.927,69	0,00
Občina Trzin	1	378.546,88	0,00
Občina Velike Lašče	1	435.931,68	0,00
Občina Šmartno pri Litiji	1	545.975,52	0,00
RRA LUR	3	2.367.090,00	689.320,00
SKUPAJ	32	53.059.373,77	689.320,00

Načrt in realizacija koriščenja sredstev

Leto	Dinamika EU	Dinamika SLO	Dinamika EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	148.022,40	222.033,60	370.056,00	148.022,40	222.033,60	370.056,00	100,0 %
2025	127.705,60	191.558,40	319.264,00	127.705,60	191.558,40	319.264,00	100,0 %
2026	8.181.894,79	2.675.071,91	10.856.966,70	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	16.488.427,35	4.069.814,26	20.558.241,61	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	11.421.938,09	2.942.055,49	14.363.993,58	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	4.488.611,84	2.102.240,04	6.590.851,88	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	40.856.600,07	12.202.773,70	53.059.373,77	275.728,00	413.592,00	689.320,00	1,3 %

Kazalniki

Kazalniki


Vključeni projekti 32

Projekti z vnesenimi kazalniki 30 / 32

Skupni napredek kazalnikov




RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež dos
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	


Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež dos
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	

RSO25




Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (s
RCO30	Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda	km	—	14
RCO31	Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode	km	—	26
RCO32	Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode	PE	—	500
RCR41	Prebivalci na izboljššanem javnem vodovodu	osebe	—	4446
RCR42	Prebivalci, priključeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode	osebe	—	4242

RSO27




Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Do
INNOV	Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest	število	—	9	
RCO36	Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo	ha	1	18	
RCO37	Površina območij Natura 2000 z izvedenimi ukrepi	ha	—	1	
RCR95	Prebivalci z dostopom do nove ali izboljšane zelene infrastrukture	osebe	—	36410	

RSO32



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029
RCO58	Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo	km	2	3
RCRXX	Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo	uporabniki	—	269

Projekt 1: Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Real črpanja: 689.320,00 €

IZVEDBA

776 dni

Kratek opis projekta:

Podjetniško usposabljanje

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	615.308,80	275.728,00	44,81 %
SLO	922.963,20	413.592,00	44,81 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	689.320,00 €	44,81 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena
Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (15.07.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici


Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	15.11.2028	09.03.2031

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	148.022,40	222.033,60	370.056,00	148.022,40	222.033,60	370.056,00	100,0 %
2025	127.705,60	191.558,40	319.264,00	127.705,60	191.558,40	319.264,00	100,0 %
2026	127.705,60	191.558,40	319.264,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	124.803,20	187.204,80	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	87.072,00	130.608,00	217.680,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	615.308,80	922.963,20	1.538.272,00	275.728,00	413.592,00	689.320,00	44,8 %

Načrt in realizacija po letih

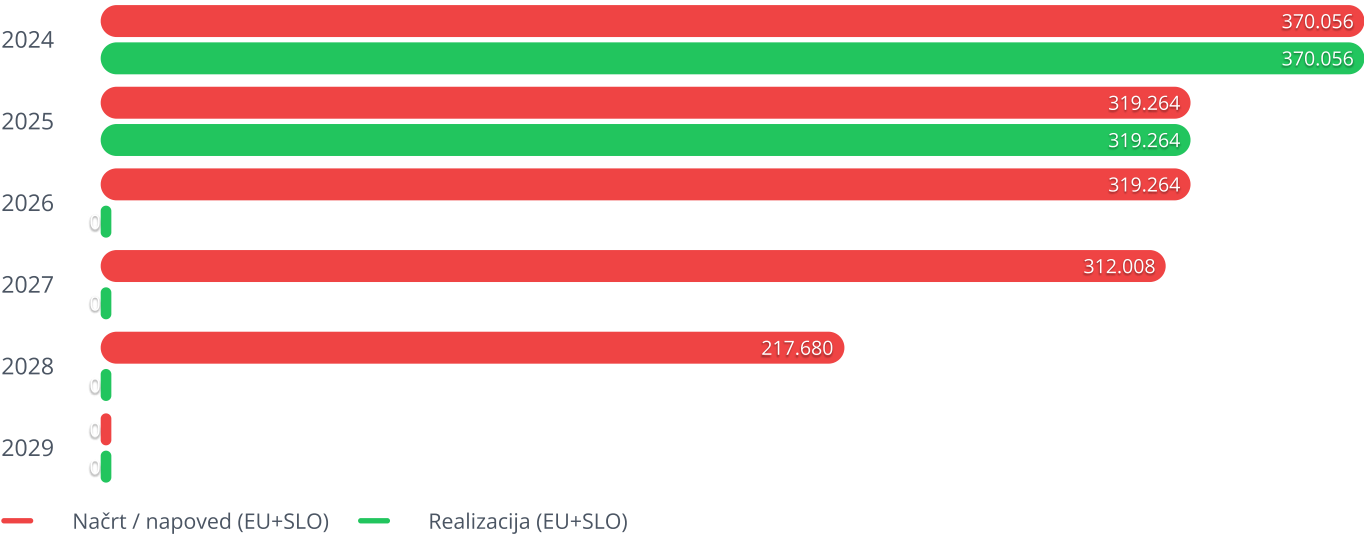

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13




Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	0%

Poročilo je pripravil: Ana Stružnik

Datum in čas priprave: 06.07.2026 10:58

Projekt 2: Rekonstrukcija vodovoda Spodnje Stranje – Stahovica (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Kamnik)



Občina izvajanja projekta: Kamnik
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.762.689,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
628 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je obnova salonitnega cevovoda od Stahovica do naselja Spodnje Stranje v skupni dolžini cca 2.944 m. Z izvedbo rekonstrukcije se bo povečala varnost oskrbe s pitno vodo, zagotovila kontinuiranost oskrbe s pitno vodo in zmanjšal delež vodnih izgub na vodovodnem sistemu št. 1578 Kamnik – Iverje za več kot 20% od zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI). 2,944 km, 25.000 prebivalcev priklapljenih.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.498.285,64	0,00	0,00 %
SLO	264.403,36	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.762.689,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO predvidoma do 30.10.2026. Obdobje izvedbe se začne predvidoma v začetku leta 2027.
- 19.01.2026:
Težava s pridobitvijo soglasja DRSV in DRSI ter pridobivanjem služnosti. Ne glede na datum pridobitve popolne projektne dokumentacije, oddaja vloge NPO in začetek izvajanja projekta ostaja v predvideni časovnici v 2027.
- 18.05.2026: Pridobili so hidrološko hidraulično študijo. V mesecu juniju bodo oddali vlogo za pridobitev GD. GD bi pridobili do konca avgusta 2026. Vloga bo oddana konec oktobra 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.10.2026	03.04.2027
Oddaja vloge na OU	30.11.2026	08.05.2027
Odločitev o podpori	31.12.2026	04.06.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	29.01.2027	03.07.2027
Zaključek projekta	30.10.2028	03.04.2029

Projekt 3: Vodovod Logatec – Ograje, Laze – Ravnik, Hrušica (predlog naziva: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane – 4. sklop)



Občina izvajanja projekta: Logatec
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.286.076,60 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
696 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je urejanje javnega vodovoda Logatec, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev z vidika zmanjševanja vodnih izgub. Predvidena je obnova vodovoda skozi center Rovt z dograditvijo vodovoda Ograje, obnova južnega kraka Laze – Jakovica z dograditvijo vodovoda Ravnik – Laze. Na ta način se bo obnovila zastarela infrastruktura, izboljšal dostop do pitne vode in dogradila manjkajoča vodovodna infrastruktura oz. njen del. V primeru dograditve vodovoda Ograje se bo zagotovil rezervni vir. 4,740km, 1 zajetje, 504 prebivalcev priklopljenih.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.093.165,11	0,00	0,00 %
SLO	192.911,49	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.286.076,60 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 19.01.2026: Zadeva je usklajena z Elektro Ljubljana, ni predvidenih sprememb v časovnici.
- 18.05.2026: Vloga za pridobivanje GD za ograje. Zalaze je pripravljen DGD. Potrebno je še pridobiti 3 GD. Projektna dokumentacija bo popolna v mesecu septembru 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.07.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	16.11.2026	19.11.2026
Oddaja vloge na OU	16.12.2026	24.12.2026
Odločitev o podpori	18.01.2027	21.01.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	19.02.2027	22.02.2027
Zaključek projekta	31.12.2027	03.01.2028

Projekt 4: Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Medvode)



Občina izvajanja projekta: Medvode
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.621.335,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
620 dni

Kratek opis projekta:

Z novogradnjo javnega vodovoda bodo na vodovodnem sistemu izvedene bistvene izboljšave, ki bodo prispevale k zmanjšanju vodnih izgub za več kot 20% na celotnem javnem vodovodu od zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI, kot tudi k izboljšani preskrbljenost prebivalstva, gospodarskih in družbenih organizacij s pitno vodo v količinskem in kakovostnem smislu). Vodovod bo pravilno dimenzioniran in izveden iz primernih materialov – zamenjava azbestnih cevi, s čimer se bo zagotovila zdravstveno in hidravlično ustrezna pitna voda. S projektom bo zagotovljen dvig kakovosti bivanja občanov z dolgoročno oskrbo z neoporečno čisto pitno vodo. 6,326 km, 14.500 prebivalcev priklapljenih.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
19.01.2026	90	Zamuda zaradi pridobivanja GD.
18.05.2026	120	Pridobivanje projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.377.982,00	0,00	0,00 %
SLO	243.353,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.621.335,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Do 15.12.2025 vložena zadnja vloga za GD. Vloga NPO bo predvidoma oddana do 28.2.2026. JR za izbor izvajalca del v januaru 2026. Izbor izvajalca in izvedba projekta 1.4.2026. Konec izvedbe do konca leta 2027.
- 19.01.2026: Projekt ločen na dva odseka - odsek Zbilje in odsek Smlednik. GD za en odsek bo vloženo do konca januarja 2027, drugo GD bo vloženo do konca februarja 2026. Vloga NPO bo predvidoma oddana do konca maja 2027. Zabeležen generalni zamik za 3 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (210 dni + 0 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +210 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	27.02.2026	25.09.2026	25.09.2026
Oddaja vloge na OU	27.03.2026	23.10.2026	30.10.2026
Odločitev o podpori	27.04.2026	23.11.2026	23.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	29.05.2026	25.12.2026	25.12.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	28.07.2028	28.07.2028

Projekt 5: Modernizacija vodovodnega sistema v občini Moravče



Občina izvajanja projekta: Moravče

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 600.927,69 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

797 dni

Kratek opis projekta:

Projekt zajema obnovo primarnega vodovoda med vodohranom Drtija in naseljem Moravče ter rekonstrukcijo vodohrana Drtija. Z obnovo ključne povezave za oskrbo prebivalcev s pitno vodo med vodohranom Drtija in naseljem Moravče ter novogradnjo vodohrana Drtija, bo dosežen cilj zagotoviti zanesljivo dobavo pitne vode obstoječim in novim prebivalcem. Z investicijo bodo bistveno zmanjšane trenutne vodne izgube na omrežju. Z novogradnjo vodohrana bodo izboljšane hidravlične razmere v omrežju. Z investicijo bo zmanjšan kazalnik vodnih izgub ILI na vrednost pod 1,5.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	120	Pridobivanje projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	510.788,54	0,00	0,00 %
SLO	90.139,15	0,00	0,00 %
SKUPAJ	600.927,69 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Popolna vloga NPO najkasneje do 1.5.2026. Ostalo ostaja nespremenjeno.
- 19.01.2026:
Projekt razdeljen v 2 fazi: za 1. fazo je GD pridobljeno, PZI je v izdelavi; za 2. fazo je v izdelavi DGD in pridobivanje GD ter služnosti. Razen popolne projektne dokumentacije ostale faze projekta ostajajo v predvideni časovnici.
- 18.05.2026:
PZI za vodohram je izdelan. PZI za drugi del je v pripravi. Težava je pri upravljalcu DRSI. Popolna projektna dokumentacija bo do konec meseca avgusta 2026. Vloga pa do konca meseca septembra 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije	Odločitev o podpori	Izvajanje	Zaključek
------------------------	---------------------	-----------	-----------

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (120 dni + 159 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	04.05.2026	01.09.2026	05.02.2027
Oddaja vloge na OU	01.06.2026	29.09.2026	12.03.2027
Odločitev o podpori	01.07.2026	29.10.2026	04.04.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	03.08.2026	01.12.2026	07.05.2027
Zaključek projekta	30.12.2027	28.04.2028	02.10.2028

Projekt 6: Gradnja kanalizacije v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu



Občina izvajanja projekta: Dol pri Ljubljani

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 4.000.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

742 dni

Kratek opis projekta:

Gradnja Kanalizacije v aglomeraciji 4162 (Zaboršt, Zajelše, Videm, Dol). Cilj projekta je odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Namen projekta je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov v aglomeraciji Zaboršt pri Dolu. V projektu so predvideni investicijski posegi v naseljih Zaboršt in Zajelše, kjer se bo gradilo ca. 5.334 m kanalizacijskega omrežja, črpališče Zajelše in 300 m tlačnega voda. Drugi del zajema dograditev kanalizacije – sistem »OB«, območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol v dolžini ca. 2.281 m. 7,651 km, 2.139 priklapljenih prebivalcev.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	150	Zamuda je nastala zaradi pridobivanja GD in same dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.400.000,00	0,00	0,00 %
SLO	600.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Dve GD še pridobivajo, predvidevajo do 31.12.2025. Popolna projekta dokumentacija predvidena do 1.3.2026, vloga NPO predvidoma do 31.3.2026. JR za izbor izvajalca v marcu 2026. Obdobje izvedbe predvidoma od 1.6.2026 (tudi izbran izvajalec), konec del predviden do 30.6.2028.
- 19.01.2026:
Popolna projektna dokumentacija zajema 2 GD; za severni in južni del. Za južni del bo vsa dokumentacija pripravljena v predvideni časovnici, za severni del bo predvidoma pridobljena z zamikom (predvsem težava s pridobitvijo GD). PZI za oba dela je v izdelavi.
- 18.05.2026: GD še ni pridobljeno. Upajo, da bo GD izdano do konca meseca maja. Vlogo bodo oddali do konca meseca avgusta 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (02.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (150 dni + 0 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +150 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.03.2026	28.08.2026	28.08.2026
Oddaja vloge na OU	30.04.2026	27.09.2026	02.10.2026
Odločitev o podpori	29.05.2026	26.10.2026	26.10.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.06.2026	27.11.2026	27.11.2026
Zaključek projekta	30.06.2028	27.11.2028	27.11.2028

Projekt 7: Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019



Občina izvajanja projekta: Ljubljana
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 9.433.017,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
623 dni

Kratek opis projekta:

Opremljanje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 z manjkajočo kanalizacijo in pripadajočimi objekti.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
19.01.2026	270	Zamik zaradi povečanja vrednosti projekta za več kot 20%.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	8.018.064,44	0,00	0,00 %
SLO	1.414.952,56	0,00	0,00 %
SKUPAJ	9.433.017,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Zaradi spremembe obsega projekta bo vloga NPO predvidoma oddana do 1.10.2026. Zamika se projekt in finančni plan.
- 19.01.2026:
Projekt se je finančno povečal za več kot 20%, 22.12.2025 oddana nova vloga za uvstitev projekta v Dogovor na MKRR, vloga je bila posredovana na MNVP. Generalna zamuda 9 mesecev. Do 30.9.2026 popolna projektna dokumentacija, 30.3.2027 začetek del.
- 18.05.2026: Projektna dokumentacija je v pridobivanju. Zaenkrat ne vidijo problema pri izvajanju projekta.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +270 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.10.2026	27.07.2027	27.07.2027
Oddaja vloge na OU	30.11.2026	27.08.2027	31.08.2027
Odločitev o podpori	31.12.2026	27.09.2027	27.09.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	29.01.2027	26.10.2027	26.10.2027
Zaključek projekta	31.08.2028	28.05.2029	28.05.2029

Projekt 8: Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE



Občina izvajanja projekta: Vrhnika

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 1.698.686,87 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

749 dni

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bo izvedena investicija v izgradnjo javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 4823 Vrhnika – Sinja Gorica 2019 in izgradnja kanalizacije in ČN v aglomeraciji ID 4887 Log pri Brezovici 2019 (aglomeraciji nad 2.000 PE), ki ležita na območju Občine Vrhnika (aglomeracija ID 4887 Log pri Brezovici 2019 leži delno tudi v Občini Log – Dragomer). Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih voda se bodo na javno komunalno omrežje (JKO) priključili objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema potrebna v skladu z zakonodajo. 4,372 km, 1 ČN, 500 priključenih prebivalcev.

Uradne zamude pri projektu

Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	60	Priprava projektne dokumentacije zamuja (GD).

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.443.883,84	0,00	0,00 %
SLO	254.803,03	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.698.686,87 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: DGD in PZI sta narejena. Vsa GD in popolna proj. dok. bodo pridobljeni predvidoma do 30.3.2026. Vloga NPO oddana do 1.4.2026. JR za izbor izvajalca predviden 1.6.2026.
- 19.01.2026: DGD in PZI v pripravi, GD še ni pridobljeno, predvideno pridobljeno v 3 tednih. Razpis za izbor izvajalca predviden jeseni 2026. Načeloma projekt v časovnici in se ne predvideva zamud.
- 18.05.2026: Vlogi za GD sta na UE. GD še ni izdano. JN za izboro izvajalca je v pripravi. Vloga se pripravlja vzporedno. Projektna dokumentacija bo popolna do konca meseca maja. Vloga bo oddana konec meseca 30. 6. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (60 dni + 38 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.04.2026	31.05.2026	06.07.2026
Oddaja vloge na OU	04.05.2026	03.07.2026	10.08.2026
Odločitev o podpori	01.06.2026	31.07.2026	05.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	01.07.2026	30.08.2026	05.10.2026
Zaključek projekta	30.06.2028	29.08.2028	04.10.2028

Projekt 9: Ureditev zelenih površin Športnega parka Brezovica



Občina izvajanja projekta: Brezovica
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 792.200,08 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
719 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen investicije je zagotoviti zelene površine v neposredni okolici osnovne šole in predvidene izgradnje večnamenske športne dvorane Športnega parka Brezovica kot tudi izvedba zelene strehe na večnamenski dvorani. Zelene površine v okviru tega projekta bodo predstavljale koristi za celoten kraj in občino Brezovica. Glavni cilji projekta so naslednji: ureditev 8.616 m² zelenih zunanjih površin in izvedba zelene strehe površine 3.018 m² v športno-rekreacijskem parku; zagotovitev večje samozadostnosti in biotske raznovrstnosti s postavitvijo čebelnjaka; ureditev zelenih površin, ki bodo prebivalcem občine Brezovica nudile prostor za rekreacijo in sprostitev, dodaten nabor športnih dejavnosti ter dvigu kakovosti bivanja; povečanje ponovne uporabe padavinskih voda za zalivanje zelenih površin; razširitev programa interesnih dejavnosti; zasaditev avtohtonih vrst rastlin ter zmanjšanje uporabe invazivnih vrst rastlin in dreves; zagotovitev učinkovitega koriščenja javnih športnih objektov in ravnanje z njimi; razvoj dejavnosti na področju športa, turizma in kulture.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	396.100,04	0,00	0,00 %
SLO	396.100,04	0,00	0,00 %
SKUPAJ	792.200,08 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo oddana najkasneje do 30.9.2026, do takrat tudi popolna proj. dokumentacija. Črpanje sredstev predvideno v letu 2027 in 2028.
- 19.01.2026: Zaenkrat ni predvidene zamude v časovnici.
- 18.05.2026: Projekt bodo umaknili iz dogovora. Sredstva se prenesejo na kolesarsko povezavo Notranje Gorice - Podpeč.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.09.2026	30.09.2026
Oddaja vloge na OU	30.10.2026	04.11.2026
Odločitev o podpori	30.11.2026	30.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.12.2026	31.12.2026
Zaključek projekta	03.07.2028	03.07.2028

Projekt 10: Ozelenitev in oživitev občinskega centra Dobrova



Občina izvajanja projekta: Dobrova - Polhov Gradec

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 240.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

241 dni

Kratek opis projekta:

Cilji predlaganega projekta so ozelenitev sedaj mestoma degradiranega urbanega centra Občine Dobrova – Polhov Gradec, s spremembo parkirišč in neuporabnih površin v zelene parkovne površine. Z vzpostavitvijo novih zelenih površin in ozelenitvijo centra, ki v zvezdasti obliki povezuje več delov centra občine in več javnih objektov kjer se zagotavljajo javne storitve (pošta, knjižnica, trgovina, ...) bi dosegli oživitev občinskega centra. Z oživitvijo centra obljublanske občine bi zadržali lokalno prebivalstvo v lokalnem okolju, kjer bi zadovoljevali svoje potrebe. S tem bi pripomogli tudi k zmanjšanju osebnega prometa v center Ljubljane.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	120.000,00	0,00	0,00 %
SLO	120.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	240.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: JR za izbor izvajalca del v poteku, izbor izvajalca do 1.1.2026. Obdobje izvedbe predvidoma od 5.1.2026.
- 19.01.2026: Vloga NPO oddana 7.11.2025, čakajo odziv MNVP.
- 02.04.2026: Na podlagi prejete vloge za NPO je MNVP upravičencu izdalo poročilo o pregledu dne 9. 3. 2026. Z upravičencem usklajujejo termin za operativni sestanek.
- 02.06.2026: Operativni sestanek upravičencev z MNVP potekal 25. 5. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	07.08.2026
Odločitev o podpori	30.01.2026	06.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	04.10.2026
Zaključek projekta	31.08.2026	07.04.2027

Projekt 11: Ureditev osrednje mestne javne površine v Domžalah



Občina izvajanja projekta: Domžale
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 3.417.258,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
676 dni

Kratek opis projekta:

Ureditev odprtih javnih zelenih površin, ureditev parka, ureditev tržnega prostora, celostna ureditev komunalne infrastrukture – navezava na obstoječe prometno omrežje.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.708.629,00	0,00	0,00 %
SLO	1.708.629,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.417.258,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo oddana do 30.11.2026. Črpanje sredstev in izvedba projekta se začne v 2027 in konča 2029.
- 19.01.2026: V izdelavi dokumentacija za pridobitev GD, ni predvidene spremembe v časovnici.
- 18.05.2026: IP bo v naslednjem tednu na seji. Vloga za GD se pripravlja. Trenutno ni predvidenih zamikov.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.11.2026)

Status časovnice projekta:Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.12.2026	01.12.2026
Oddaja vloge na OU	31.12.2026	05.01.2027

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	29.01.2027	29.01.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	01.03.2027	01.03.2027
Zaključek projekta	30.11.2029	30.11.2029

Projekt 12: Športni park Brinje



Občina izvajanja projekta: Grosuplje
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 618.621,90 €
Real črpanja: 0,00 €

82%

ODLOČITEV
PT obravnava
167 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture in javno dostopnih zelenih površin v urbanih naseljih, kar bi dosegli z izgradnjo Športnega parka Brinje. Območje, kjer je predvidena gradnja novega Športnega parka, se nahaja v naselju ob večstanovanjskih hišah, blokih in številnih novogradnjah ter tik ob Osnovni šoli Brinje. Z izvedeno investicijo bomo zagotovili trajnostno dostopnost, saj ustrezno urejena športna infrastruktura izrazito pozitivno vpliva na bolj zdrav življenjski slog in izboljšuje kakovost bivanja prebivalcev območja kjer se nahaja ter deluje tudi širše. S predvideno investicijo bi izboljšali samo pojavnost zelene infrastrukture in ozelenitve ter izboljšali dostop prebivalcev do zelene infrastrukture s posebnim poudarkom na dostopnosti za različne ciljne skupine (starejši, mlajši, najmlajši in gibalno ovirani). Cilj investicije je:- ozeleniti šolsko igrišče (skupno 3.907 m²), - postaviti otroška igrala, urbano opremo, zeleno nadstrešnico za vadbo, učilnico na prostem in šolski vrt med krošnjami ter prenoviti celoten izgled obšolskega igrišča na način na naravi temelječih in okolju prijaznih rešitev.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	309.310,95	0,00	0,00 %
SLO	309.310,95	0,00	0,00 %
SKUPAJ	618.621,90 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo predvidoma oddana do 31.1.2026. Izvedba: 1.4.2027 do 1.9.2027.
- 19.01.2026:
Vloga NPO bo oddana v tem tednu, pridobljena vsa soglasja. Projekt v časovnici, ni predvidenih zamud.
- 02.04.2026: Vloga NPO je v pregledu na MNVP.
- 18.05.2026: Poročilo so prejeli in se usklajujejo z MNVP.
- 02.06.2026: MNVP je upravičencu izdalo poročilo o pregledu vloge 13. 5. , z upravičencem izveden operativni sestanek dne 28. 5. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (20.01.2026)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	27.02.2026	12.08.2026
Odločitev o podpori	31.03.2026	13.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.04.2026	13.10.2026
Zaključek projekta	01.09.2026	14.02.2027

Projekt 13: Celovita ureditev centra Ig



Občina izvajanja projekta: Ig

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.559.952,04 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

663 dni

Kratek opis projekta:

Projekt vključuje ureditev površin v središču naselja z ukrepi zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti. V sklopu zelene infarstrukture se ureja: park z otroškim igriščem, trg in zelene površine ob občinski stavbi, drevored skozi središče do novega parka in ozelenitev obstoječih parkirišč pri šoli in vertikalna ozelenitev. Ukrepi trajnostne mobilnosti izboljšujejo prometno ureditev, povečujejo varnost, dajejo prednost pešcem, kolesarjem in JPP (preureditev avtobusnega postajališča).

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
16.05.2026	90	Zaradi spremembe projekta je prišlo do zamika.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	779.976,02	0,00	0,00 %
SLO	779.976,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.559.952,04 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO bo oddana popolna do 31.1.2026. Zaradi odstopanja vrednosti projekta od zneska v prijavljenem projektu na DRR, bo potrebno ponovno uvrstiti projekt v dogovor (sprememba).
- 19.01.2026:
PZI in GD je pridobljeno, projekt stoji zaradi ocene investicije, načeloma pa projekt ostaja v predvideni časovnici.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (01.06.2026)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +90 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.06.2026	30.08.2026	30.08.2026
Oddaja vloge na OU	01.07.2026	29.09.2026	04.10.2026
Odločitev o podpori	03.08.2026	01.11.2026	01.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	01.09.2026	30.11.2026	30.11.2026
Zaključek projekta	30.06.2029	28.09.2029	28.09.2029

Projekt 14: Urejanje zelenih površin v mestnem jedru Kamnika



Občina izvajanja projekta: Kamnik^{32%}
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 300.000,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
497 dni

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bomo uredili območje gradu Zaprice – vrtove, muzej na prostem in trim stezo.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	120	Povečanje vrednosti projekta.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	150.000,00	0,00	0,00 %
SLO	150.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	300.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Izbor izvajalca do 1.5.2026 in začetek z deli. Zaključen projekt najkasneje do 28.4.2028.
- 19.01.2026: PZI v izdelavi, pridobivajo soglasje ZVKD, poteka še odkupovanje zemljišč. Razen popolne projektne dokumentacije, projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.
- 18.05.2026: Projekt se zaradi spremembe vrednost zamika za 4 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije	Odločitev o podpori	Izvajanje	Zaključek
------------------------	---------------------	-----------	-----------

Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (21.02.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (120 dni + 380 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.06.2026	29.09.2026	12.10.2027
Oddaja vloge na OU	01.07.2026	29.10.2026	16.11.2027
Odločitev o podpori	03.08.2026	01.12.2026	14.12.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	04.09.2026	02.01.2027	15.01.2028
Zaključek projekta	28.04.2028	26.08.2028	08.09.2029

Projekt 15: Ureditev in širitev pokopališča v Komendi



Občina izvajanja projekta: Komenda
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 621.491,98 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
648 dni

Kratek opis projekta:

Cilj projekta je zasnova ureditev širitve obstoječega pokopališča v obliki parkovne ureditve. S parkovno ureditvijo pokopališča se bo v največjem možnem obsegu ohranjala obstoječa silhueta območja širitve, na ta način se bo ohranjala tudi identiteta prostora, ki spada pod območje kulturne dediščine. Parkovna ureditev predvideva ureditev prostora na način, da bo poleg specifičnih pokopaliških funkcij vključeval tudi elemente, ki bodo omogočali izvajanje drugih programov, ki jih je mogoče izvajati v območju pokopališča (na območju obstoječega dela in na območju širitve) – tj. sprehajanje, druženje (npr. srečanja duhovnih skupin, odprta čitalnica – duhovna knjižnica, prostor za sprostitvev, ipd.). Za doseganje ciljev bo poudarek na vključevanju visokega deleža krajinskih elementov, ki bodo zagotavljali mikroklimatsko ugodje, udobje ter spodbujali raznolikost s posnemanjem značaja slovenskega travnika.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	120	Pridobivanje projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	310.745,99	0,00	0,00 %
SLO	310.745,99	0,00	0,00 %
SKUPAJ	621.491,98 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO oddana predvidoma do 1.2.2026 (zamuda zaradi pridobivanja soglasja ZVKD).
- 19.01.2026:
Vloga za pridobitev GD oddana 14.11.2025, potrebne še dopolnitve, pridobljeno soglasje ZVKD. Vloga NPO je v pripravi. JR za obe fazi izvedbe je v pripravi in predvidevajo izvedbo razpisa po pridobitvi PZI in GD. Predvidoma pridobljena popolna projektna dokumentacija do oddaje vloge za NPO - vloga je skoraj pripravljena, čakajo le še pridobitev GD.
- 18.05.2026: PZI je usklejen. IP bo potrjen 24. 6. 2026. Vloga bo oddana do konca meseca junija 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (120 dni + 67 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	27.02.2026	27.06.2026	31.08.2026
Oddaja vloge na OU	31.03.2026	29.07.2026	05.10.2026
Odločitev o podpori	30.04.2026	28.08.2026	01.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	29.05.2026	26.09.2026	30.11.2026
Zaključek projekta	31.12.2026	30.04.2027	04.07.2027

Projekt 16: Ureditev novega vrtičarskega območja Grba III



Občina izvajanja projekta: Ljubljana
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 732.043,14 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
677 dni

Kratek opis projekta:

vzpostavitev novega vrtičarskega območja z 50 do 80 vrtilki z vso potrebno urbanp opremo, z večgeneracijskim igriščem

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	366.021,57	0,00	0,00 %
SLO	366.021,57	0,00	0,00 %
SKUPAJ	732.043,14 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Popolna proj. dok. 30.6.2026. Sprememb v časovnici glede projekta niso predvidene.
- 19.01.2026: Zaenkrat je projekt znotraj terminskih planov.
- 18.05.2026: PZI je končan. Projektna dokumentacija bo popolna do predvidenega roka.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.08.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.10.2026	30.10.2026
Oddaja vloge na OU	30.11.2026	04.12.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	31.12.2026	31.12.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	29.01.2027	29.01.2027
Zaključek projekta	30.11.2027	30.11.2027

Projekt 17: Učna in doživljajska pot Logaščica – Park Jačka



Občina izvajanja projekta: Logatec
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 129.833,38 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
698 dni

Kratek opis projekta:

Območje Logaščice, ki pripada porečju Ljubljanice, potok pa ponikne sredi Logatca v ponoru Jačka, je zaradi svoje lege in bližine mesta, izjemno pomembno za prebivalce in obiskovalce z vidika naravnih in kulturnih danosti ter nudi možnost nadaljnega razvoja območja za rekreacijo in drugih oblik preživljanja prostega časa v naravi. Občina Logatec želi v ta namen vzpostaviti učno in doživljajsko pot Logaščica ter približati potok prebivalcem preko sistema povezovalnih pešpoti, usmerjevalnih in informativnih tabel ter novih programskih območij. Namen projekta je približati vodo prebivalcem, jih zaščititi pred poletno vročino uvajanje zelene infrastrukture v urbana okolja, ščenje prebivalcev pred škodljivimi vplivi onesnaženja, neugodnimi vremenskimi vplivi, in zagotavljanje prostora za druženje in sproščanje v naravi. Zagotavljati visokokakovostno bivalno okolje, ohranjanje, prenova in razvoj zelenih površin v mestih, izkoriščanje možnosti mešane rabe gozdnih, obvodnih in kmetijskih površin v urbanih naseljih za rekreacijske in sprostivne namene.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	64.916,69	0,00	0,00 %
SLO	64.916,69	0,00	0,00 %
SKUPAJ	129.833,38 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 19.01.2026: Izvedba projekta planirana v 2027, zadržki do projekta v občinskem svetu. Marca bo znano točno stanje.
- 18.05.2026: Očbčina odstopa od projekta. Vrednost sofinanciranja je premajhna glede na višino izvedbe projekta.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.06.2024)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Ni prihodnjih mejnikov za prikaz.

Projekt 18: Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol



Občina izvajanja projekta: Mengš^{30%}
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 811.199,42 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
621 dni

Kratek opis projekta:

Ureditev varne peš povezave ob Pšati med Mengšom in Topolami z novimi premostitvami in ureditvami počivališ ter drevorednih potez; Ureditev odprtih javnih zelenih površin, preureditev dela osrednjih parkovnih površin z renaturacijo dela vodotoka, nove zasaditve in novi izobraževalni programi (točke učne poti); Preureditev zunanih površin nekdanjega vrtca za potrebe novega programa (društvenega doma).

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
19.01.2026	90	Zamik zaradi pridobivanja projektne dokumentacije in GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	405.599,71	0,00	0,00 %
SLO	405.599,71	0,00	0,00 %
SKUPAJ	811.199,42 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Popolna projektna dokumentacija do 30.4.2026. Vloga NPO 30.6.2026. Izvedba v 2027, 2028 (po planu).
- 19.01.2026: Sprememba v časovnici - projektna dokumentacija do 30.6.2026, GD 30.8.2026, vloga NPO 30.9.2026. Generalni zamik 3 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (90 dni + 0 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +90 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.06.2026	28.09.2026	28.09.2026
Oddaja vloge na OU	31.07.2026	29.10.2026	02.11.2026
Odločitev o podpori	31.08.2026	29.11.2026	29.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.09.2026	29.12.2026	29.12.2026
Zaključek projekta	31.12.2029	31.03.2030	31.03.2030

Projekt 19: Mreža zelenih površin Šmartno



Občina izvajanja projekta: Šmartno pri Litiji
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 545.975,52 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
669 dni

Kratek opis projekta:

Občina Šmartno pri Litiji načrtuje celovito ureditev javnih zelenih površin v občinskem središču, ki ki je razdeljena na štiri območja: Območje 1: center Območje 2: zelena povezljivost Območje 3: zelena pot Območje 4: medgeneracijski park Tisje

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	180	Pridobivanje dovoljenj in projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	272.987,76	0,00	0,00 %
SLO	272.987,76	0,00	0,00 %
SKUPAJ	545.975,52 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Vloga NPO 31.3.2026, ostalo nespremenjeno.
- 19.01.2026: Projekt zaenkrat v predvidenem terminskem planu razen pridobivanja popolne projektne dokumentacije.
- 18.05.2026: Vloga ni bila oddana.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (180 dni + 40 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +180 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.03.2026	27.09.2026	04.11.2026
Oddaja vloge na OU	30.04.2026	27.10.2026	09.12.2026
Odločitev o podpori	29.05.2026	25.11.2026	02.01.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.06.2026	27.12.2026	03.02.2027
Zaključek projekta	31.08.2028	27.02.2029	06.04.2029

Projekt 20: DRR Zelena infrastruktura



Občina izvajanja projekta: Trzin
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 378.546,88 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
691 dni

Kratek opis projekta:

Ključna aktivnost v okviru projekta je izboljšanje zelenih površin, v okolici Osnovne šole Trzin in stanovanjskega območja T3 in sicer: – ureditev zaokroženega območja zelenih površin v skupnem obsegu več kot 1,0 ha v osrednjem delu Trzina, -zelena infrastruktura v okolici OŠ Trzin in stanovanjskega naselja T3 z vključevanjem načela novega evropskega Bauhausa, -vzpostavitev zelene intenzivno debeloslojne strehe na novi kolesarnici osnovne šole,-prenova otroškega igrišča T3 in nadgradnja z umestitvijo prostora za druženje in sprostitev, -prenova igrišča pri vrtcu, zelena učilnica in nadgradnja šolskega urbanega vrta ter postavitve čebelnjaka za izobraževalne, raziskovalne in kulturne namene, -celostna ureditev vzhodnega dela pešpoti ob potoku Pšata in severnega dela šolskega igrišča z umestitvijo urbane opreme, pasjega parka ipd., -ureditev zelenega kareja med šolskim igriščem in športno dvorano, -ureditev »urbane preproge« OŠ Trzin kot osrednji del, ki funkcionalno združuje zunanje površine v harmonično celoto.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	90	

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	189.273,44	0,00	0,00 %
SLO	189.273,44	0,00	0,00 %
SKUPAJ	378.546,88 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: PZI predviden do 28.2.2026. 31.3.2026 popolna vloga NPO. Do 4.5.2026 izbran izvajalec in predviden začetek izvedbe del.
- 19.01.2026: Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu. Vsa dokumentacija v pripravi.
- 18.05.2026: Vloga bo oddana v naslednjem tednu. Vloga bo oddana na začetku meseca junija 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.


Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (27.02.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (90 dni + 39 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta			
Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +90 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	09.03.2026	07.06.2026	14.07.2026
Oddaja vloge na OU	10.04.2026	09.07.2026	18.08.2026
Odločitev o podpori	11.05.2026	09.08.2026	15.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	11.06.2026	09.09.2026	16.10.2026
Zaključek projekta	30.11.2026	28.02.2027	06.04.2027

Projekt 21: Kolesarska povezava Breg – Pako



Občina izvajanja projekta: ^{26%}Borovnica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 449.819,77 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
308 dni

Kratek opis projekta:

Ureditev 1,5 km dolge kolesarske povezave od konca kolesarske povezave Borovnica – Breg (gasilski dom) do meje z občino Brezovica z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste R3-642/1146

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	382.346,81	0,00	0,00 %
SLO	67.472,96	0,00	0,00 %
SKUPAJ	449.819,77 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 19.01.2026:
V kratkem bodo na občini začeli s pridobivanjem zemljišč, osnutki pogodb so pripravljeni. V pripravi sprememba PZI dokumentacije zaradi pobude občanov na enem odseku. Vseeno projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana.
- 18.05.2026: Občina Borovnica pridobiva služnosti. Pobuda s strani občine, da bi izuzeli avtobusno postajališče. DRSI se še ni odločil glede tega. DRSI pripravlja dokumentacijo. CBA analiza je v pripravi. So v časovnem okvirju. Avtobusno postajališče po mnenju občine. Postajališče BREG je nepotrebno in občina se ne strinja s tem.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (01.09.2026)

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.09.2026	01.09.2026
Oddaja vloge na OU	01.10.2026	06.10.2026
Odločitev o podpori	02.11.2026	02.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	01.12.2026	01.12.2026
Zaključek projekta	01.12.2028	01.12.2028

Projekt 22: KP Notranje Gorice – Podpeč



Občina izvajanja projekta: Brezovica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 298.830,74 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
719 dni

Kratek opis projekta:

Izgradnja dela državne kolesarske povezave R8 Cerklje na Gorenjskem-Vodice-Šentvid-Brezovica pri Ljubljani-Podpeč, in sicer na odseku med naseljema Notranje Gorice in Podpeč v skupni dolžini 1.790 metrov

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	90	Zamuda je nastala zaradi pridobivanja projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	254.006,13	0,00	0,00 %
SLO	44.824,61	0,00	0,00 %
SKUPAJ	298.830,74 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Popolna proj. dok. končana. Vloga NPO najkasneje 30.3.2026. Možnost izvedbe celotnega projekta v letu 2026.
- 19.01.2026:
Usklajevanje premostitve z ZRSVN, po uskladitvi predvidena oddaja vloge NPO. Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu. Povečanje kazalnikov s tretjo dopolnitvijo Dogovora.
- 18.05.2026: Vloga bo oddana konec meseca junija (30. 6.2026).

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije	Odločitev o podpori	Izvajanje	Zaključek
------------------------	---------------------	-----------	-----------


■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (31.03.2026)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +90 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.03.2026	29.06.2026	30.08.2026
Oddaja vloge na OU	30.04.2026	29.07.2026	04.10.2026
Odločitev o podpori	29.05.2026	27.08.2026	28.10.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.06.2026	28.09.2026	29.11.2026
Zaključek projekta	01.12.2027	29.02.2028	01.05.2028

Projekt 23: Rekonstrukcija ceste Lobček – Plešivica in gradnja državnega kolesarskega omrežja – G10



Občina izvajanja projekta: Grosuplje
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 0,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

222 dni

Kratek opis projekta:

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	0,00	0,00	0,00 %
SLO	0,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	0,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 18.05.2026:
Vloga 30.9.2026. 2,2 km odsek med Velikimi Laščami in Plešivico (ob regionalni cesti). Pridobivanje mnenja in pridobivanje zemljišč. Ivensticija 2027 in bo dokončana. Predlamo nujen sestanek z DRSI.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ


Status časovnice projekta:

Ni podatkov o časovnici.

Predvideni nadaljnji potek projekta

Ni prihodnjih mejnikov za prikaz.

Projekt 24: Kolesarska povezava R10 v Občini Horjul



Občina izvajanja projekta: Horjul
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.262.677,30 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

126 dni

Kratek opis projekta:

Projekt obravnava ureditev dvosmerne kolesarske steze na levi strani vozišča ceste in ustrezna navezava obstoječih površin za pešce ob regionalni cesti R2-407/1145 Ljubljana – Vrhnika od km 4,500 do km 5,500, torej od naselja Vrzenec do naselja Ljubogojna.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.073.275,71	0,00	0,00 %
SLO	189.401,59	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.262.677,30 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Projektna dokumentacija je pridobljena. Oddaja vloge NPO do 1.2.2026, pred novim letom JR za izbor izvajalca. DIIP v izdelavi, pričakovan do konca decembra 2025. Izvedba v 2026 in prvi polovici 2027.
- 19.01.2026: Popolna projektna dokumentacija pridobljena, zemljišča so pridobljena, vloga NPO v pripravi in bo do predvidenega datuma oddana na PT. Po pridobitvi odločitve o podpori se izvede JR za izbor izvajalca. Projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.
- 18.05.2026: Vloga je oddana in je v usklajevanju. Predvidevajo, da bo v naslednjem mesecu posredovana na OU.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (02.03.2026)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	02.04.2026	09.08.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	04.05.2026	06.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	01.06.2026	04.10.2026
Zaključek projekta	01.12.2027	04.04.2028

Projekt 25: Kolesarske poti v Občini Ivančna Gorica, Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični



Občina izvajanja projekta: Ivančna Gorica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.691.453,50 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
620 dni

Kratek opis projekta:

Vzpostavitev kolesarske povezave med naseljema Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični ob regionalni cesti R2-448/1196 Ivančna Gorica-Grm je načrtovana tako, da povezuje obstoječe in predvidene odseke kolesarskih povezav v sklenjeno in varno omrežje teh povezav. Z izgradnjo kolesarske povezave se izboljšuje prometna varnost na obravnavanem odseku. Prav tako se izboljšuje trajnostno mobilnost in povezljivost med naselji Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.437.735,48	0,00	0,00 %
SLO	253.718,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.691.453,50 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 19.01.2026: Izdelana je projektna dokumentacija, ki vpliva na prilagoditev regionalne ceste, kar morajo še uskladiti z DRSI. Popolna projektna dokumentacija bo pridobljena predvidoma do 30.6.2026. Izdelati investicijski program, izvedba projekta v 2027 in 2028.
- 18.05.2026: Vloga za spremembo. DRI je v mesecu marcu preplastila 600 m regionalne ceste. Vloga za zamaknitev alsfaltiranja. Vprašanje je sploh izvedba projekta.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.09.2026	04.07.2027
Oddaja vloge na OU	30.10.2026	08.08.2027
Odločitev o podpori	30.11.2026	03.09.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.12.2026	04.10.2027

Projekt 26: Rekonstrukcija kolesarskih površin Ob Ljubljani



Občina izvajanja projekta: Ljubljana

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 5.421.955,63 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

620 dni

Kratek opis projekta:

Namen operacije je spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti na območju MOL. Osrednji namen projekta je izboljšati povezave za kolesarje in pešce, kar bo olajšalo uporabo teh poti kot najhitrejših, udobnejših in najbolj varnih prometnih rešitev ter zmanjšalo delež motornega prometa na tem območju. Lokacija izvedbe investicije sta cesti Poljanski nasip in Ob Ljubljani na odseku od Cukrarne do Kajuhove ulice. 2 km, 90.000 potnikov/leto.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	60	Zamuda je nastala zaradi usklajevanja projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	4.608.662,28	0,00	0,00 %
SLO	813.293,35	0,00	0,00 %
SKUPAJ	5.421.955,63 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025:
PZI v izdelavi. Vloga NPO bo oddana predvidoma do 30.4.2026. JR za izvedbo 1.4.2026. Izbor 1.6.2026, izvedba od tega datuma do 31.12.2027.
- 19.01.2026:
Popis del in PZI v pripravi, projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana, razen začetek del se premakne v avgust 2026.
- 18.05.2026: Projektna dokumentacija še ni pripravljena. Projektna dokumentacija bo popolna do 30. junija 2026. Vloga bo oddana 30.6.2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije	Odločitev o podpori	Izvajanje	Zaključek
------------------------	---------------------	-----------	-----------

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (60 dni + 7 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.04.2026	29.06.2026	06.07.2026
Oddaja vloge na OU	29.05.2026	28.07.2026	09.08.2026
Odločitev o podpori	30.06.2026	29.08.2026	04.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.07.2026	28.09.2026	04.10.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	29.02.2028	06.03.2028

Projekt 27: Ureditev državne kolesarske povezave D1 Ob Zaloški cesti, Lj.



Občina izvajanja projekta: Ljubljana
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 8.620.736,81 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
622 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je vzpostavitev privlačnejših in varnejših kolesarskih povezav in pločnikov ob rekonstrukciji dotrajanega cestišča. Cilj je spodbuditi spremembo potovalnih navad tako, da se vsaj del poti, ki se opravljajo z osebniimi avtomobili, preusmeri na kolo, električno kolo ali na večmodalnost (peš, kolo ali avtobus). Poseg predvideva ureditev kolesarske poti in ureditev površin za pešce na odseku ob Zaloški cesti, med Kajuhovo cesto in AC priključkom Ljubljana – vzhod, kot tudi gradbeno in prometno rekonstrukcijo Zaloške ceste.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	18	Usklajevanje projektne dokumentacije z investicijsko dokumentacijo in proračunom,.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	7.327.626,62	0,00	0,00 %
SLO	1.293.110,19	0,00	0,00 %
SKUPAJ	8.620.736,81 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Projektna dokumentacija in vloga NPO do 30.4.2026. Izvedba del 1.5.2026 in do 31.5.2028.
- 19.01.2026: Projekt ostaja v predvidenem terminskem planu.
- 18.05.2026:
Projktna dokumentacija se usklajuje z investicijsko dokumentacijo. Popolna bo 30. 6 2026 in vloga bo takrat tudi oddana. Začetek izvajanja 1. 8. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.04.2026)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +18 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.04.2026	18.05.2026	06.07.2026
Oddaja vloge na OU	29.05.2026	16.06.2026	09.08.2026
Odločitev o podpori	30.06.2026	18.07.2026	04.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.07.2026	17.08.2026	04.10.2026
Zaključek projekta	31.05.2028	18.06.2028	05.08.2028

Projekt 28: Državna kol. povezava R33Odsek Dob-Lukovica-Krašnja



Občina izvajanja projekta: Lukovica
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 836.763,84 €
Real črpanja: 0,00 €

84%

PRIPRAVA

656 dni

Kratek opis projekta:

Projekt predvideva ureditev državne kolesarske povezave R33 Trzin – Domžale – Lukovica – Trojane, na odseku Dob – Lukovica – Krašnja. Skupna dolžina s projektom predvidene ureditve kolesarske povezave znaša cca 4.640 metrov in je razdeljena na štiri pododseke: Pododsek 1: novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze z vmesno zelenico ob državni cesti R2-447, od križišča R2-447 in Kranjske ceste do profila D26+10 oz. R2-447/0292 v km 20.400, L = 1.200 m, DRSI_POT; Pododsek 2: označitev s prometno signalizacijo po obstoječih lokalnih cestah, L = 980 m, od tega 140 m DRSI_POT; 840 m OBC_JP; Pododsek 3: novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze ob državni cesti R2-447 do križišča za Brdo pri Lukovici z ureditvijo prehoda čez državno cesto, L = 420 m; DRSI_POT; Pododsek 4: označitev s prometno signalizacijo po obstoječih lokalnih cestah, razširitev pločnika in ureditev prehoda čez državno cesto, L = 2.040 m, od tega 600 m OBC_PAS; 1.440 m OBC_JP.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
18.05.2026	90	Zamuda je nastala zaradi projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	711.249,27	0,00	0,00 %
SLO	125.514,57	0,00	0,00 %
SKUPAJ	836.763,84 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: GD ni potrebno. Čakajo na recenzijo iz DRSI, da lahko pripravijo vlogo NPO (predvidoma do 1.6.2026). Če sklepamo, da bo vse potekalo brez dodatnih komplikacij bi črpanje lahko potekalo že v 2026.
- 19.01.2026: Še vedno čakajo na recenzijo DRSI, že bili na sestanku pri direktorici DRSI, točno stanje in zamude bodo zabeležene na naslednjem teritorialnem dialogi 17.3.2026.
- 18.05.2026: Vloga bo oddana 30.9. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.


Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (90 dni + 130 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta			
Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +90 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.06.2026	28.09.2026	03.02.2027
Oddaja vloge na OU	31.07.2026	29.10.2026	10.03.2027
Odločitev o podpori	31.08.2026	29.11.2026	06.04.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.09.2026	29.12.2026	06.05.2027

Projekt 29: KP G10, Ljubljana Škofljica



Občina izvajanja projekta: Škofljica

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 1.124.260,00 €

Real črpanja: 0,00 €

35%

PRIPRAVA

636 dni

Kratek opis projekta:

Umestitev kolesarske povezave od meje z Mol do meje z občino Grosuplje. Celotna kolesarska povezava je predvidena od obstoječe navezave na kolesarske površine na Dolenjski cesti v Ljubljani do meje z občino Grosuplje na Šmarski cesti. Dolžina celotne trase znaša cca. 5,8 km. Kolesarska povezava poteka po že obstoječi in kategorizirani prometni infrastrukturi (lokalne ceste, državna cesta), manjši del kolesarske povezave pa poteka po nekategoriziranih odsekih cest. Po poteku jo razdelimo v 3 glavne odseke: Ljubljana – Lavrica – Škofljica, zahodno od proge – 2,3 km; Škofljica, vzhodno od proge – 1,8 km in Škofljica – občina Grosuplje (smer Šmarje – Sap) – 1,7 km. Kolesarske površine bodo sestavljale kolesarske poti (52%), kolesarske steze (8%), kolesarski pasovi na voziščih (22%) in souporabo prometnega pasu po občinski javni cesti (19%). Samostojne kolesarske površine (kol. pot, kol. steza, kol. pas) bodo sestavljale 81 % povezave. Sestavni del kolesarskih površin so tudi parkirišča in počivališča za kolesa in njihova oprema ter prometna signalizacija, števec kolesarjev (štetje kolesarjev v obe smeri) in prometna oprema za kolesarje. Ne bo vodena po javnih cestah, razen tam, kjer je predvidna souporaba prometnega pasu na občinski cest (kjer je PLDP manjši od 2.500 km, dovoljena hitrost pa ne bo večja od 70%) kar predstavlja 1,1 km oz. 19% celotne povezave. 5,8 KM, 5.000 potnikov/leto.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	955.621,00	0,00	0,00 %
SLO	168.639,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.124.260,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 19.01.2026: Težava z lastništvom zaradi pridobivanja soglasja Slovenskih železnic. V procesu iskanja druge rešitve in načrtovanje nove trase kolesarske povezave. Projekt ostaja znotraj predvidene časovnice.
- 18.05.2026: Sprememba projekta je v postopku (Lavrica - Škofljica). Kolesarska povezava na obstoječimi površinami, ki so že v uporabi.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije	Odločitev o podpori	Izvajanje	Zaključek
------------------------	---------------------	-----------	-----------

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (21.09.2026)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.09.2026	30.09.2026
Oddaja vloge na OU	30.10.2026	04.11.2026
Odločitev o podpori	30.11.2026	30.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.12.2026	31.12.2026
Zaključek projekta	29.12.2028	29.12.2028

Projekt 30: Glavna kolesarska povezava G9 Turjak-Velike Lašče-DEL



Občina izvajanja projekta: Velike Lašče33%
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 435.931,68 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
629 dni

Kratek opis projekta:

Na območju občine Velike Lašče je načrtovana nova kolesarska povezava v sklopu sprejetega seznama državnih kolesarskih povezav (Ur.l. RS ŠT. 29/18). Trenutno kolesarski promet na območju občine Velike Lašče poteka po glavni državni cesti G2-106, po lokalnih cestah in po neurejenih javnih poteh. Na obravnavanem območju obstaja nekaj registriranih lokalnih krožnih kolesarskih povezav, vendar ni nobena povezana na nivoju regije. Predvidena kolesarska povezava v občini Velike Lašče predstavlja drugi sklop celotne kolesarske povezave Škofljica -Petrina in zagotavlja kolesarsko povezanost občine Velike Lašče z občinami Škofljica Ribnica in Dobrepolje in okolice z naselji Velike Lašče, Turjak, Rašica, Male Lašče ob glavni cesti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	370.541,93	0,00	0,00 %
SLO	65.389,75	0,00	0,00 %
SKUPAJ	435.931,68 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: Projektna dokumentacija v izdelavi, čaka še na uskladitve. Vloga NPO do 30.9.2026. Gradnja predvidena v letih 2028 in 2029.
- 19.01.2026: PZI je pripravljen, začeli bodo z odkupom zemljišč. Usklajevanje z DRSI poteka od marca 2025 za odsek kolesarske povezave v dolžini 100 m, rešitve še niso našli. Leta 2019 že pripravljena bolj obsežna projektna naloga, zadaj pripravljena tudi bolj detajlna projektna naloga za ta projekt. Čim prej sklicati sestanek med občino in MZI, da se razčistijo odprte zadeve glede projektne dokumentacije in izvajanja projekta.
- 18.05.2026: Projekt je narastel iz 1.5 MIO EUR na 3,2 MIO EUR. Služnosti so deloma pridobljena. DRSI ima v potrjevanju projektni nalogi. Ena je kolesarka in druga je krožišče.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.10.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.09.2026	04.06.2027
Oddaja vloge na OU	30.10.2026	09.07.2027
Odločitev o podpori	30.11.2026	04.08.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.12.2026	04.09.2027
Zaključek projekta	31.12.2029	04.09.2030

Projekt 31: Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 708.818,00 €
Real črpanja: 0,00 €

IZVEDBA

117 dni

Kratek opis projekta:
REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	602.495,29	0,00	0,00 %
SLO	106.322,71	0,00	0,00 %
SKUPAJ	708.818,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: 8.9.2025 oddana vloga NPO, začetek izvajanja 1.5.2024 - odločitve in pogodbe še ni, stroški so nastali, zahtevkov za izplačilo še ne morejo izdati.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja


Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	31.12.2027	26.07.2028

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	429.018,81	75.709,21	504.728,02	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	173.476,49	30.613,49	204.089,98	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	602.495,30	106.322,70	708.818,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

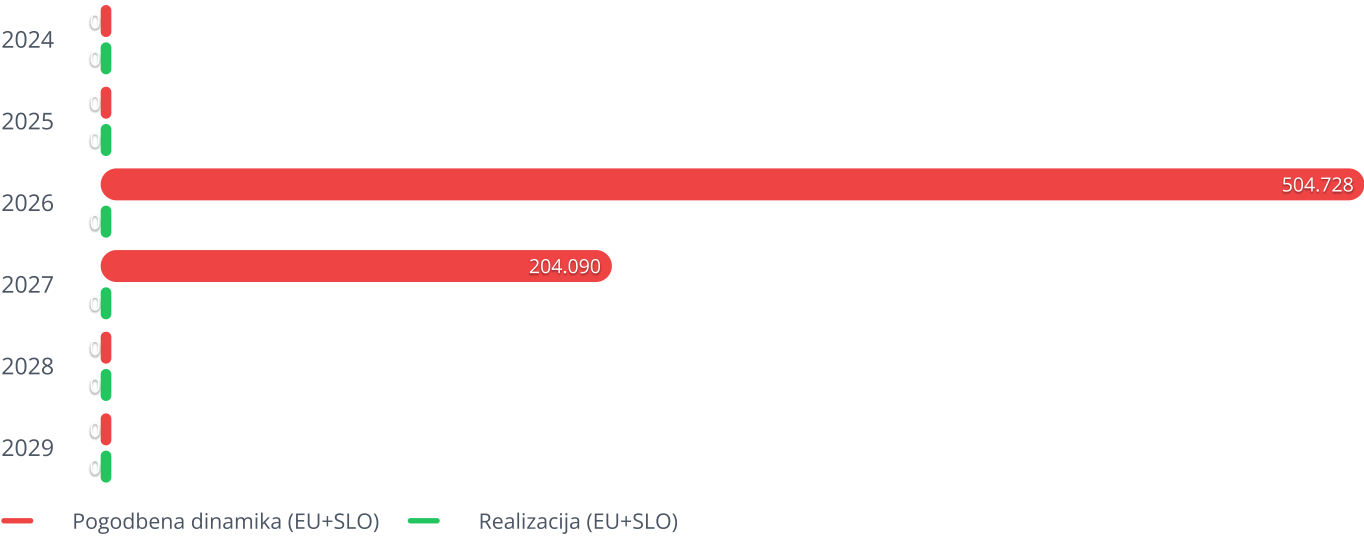


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Projekt 32: Regionalna celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 120.000,00 €
Real črpanja: 0,00 €

56%

IZVEDBA

137 dni

Kratek opis projekta:

REGIJSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	102.000,00	0,00	0,00 %
SLO	18.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	120.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 14.11.2025: 17.11.2026 vloga NPO, JR za izbor izvajalca, do 1.2.2026 izbran.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek (18.12.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta


Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	30.09.2027	14.02.2028

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	81.600,00	14.400,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	20.400,00	3.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	102.000,00	18.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

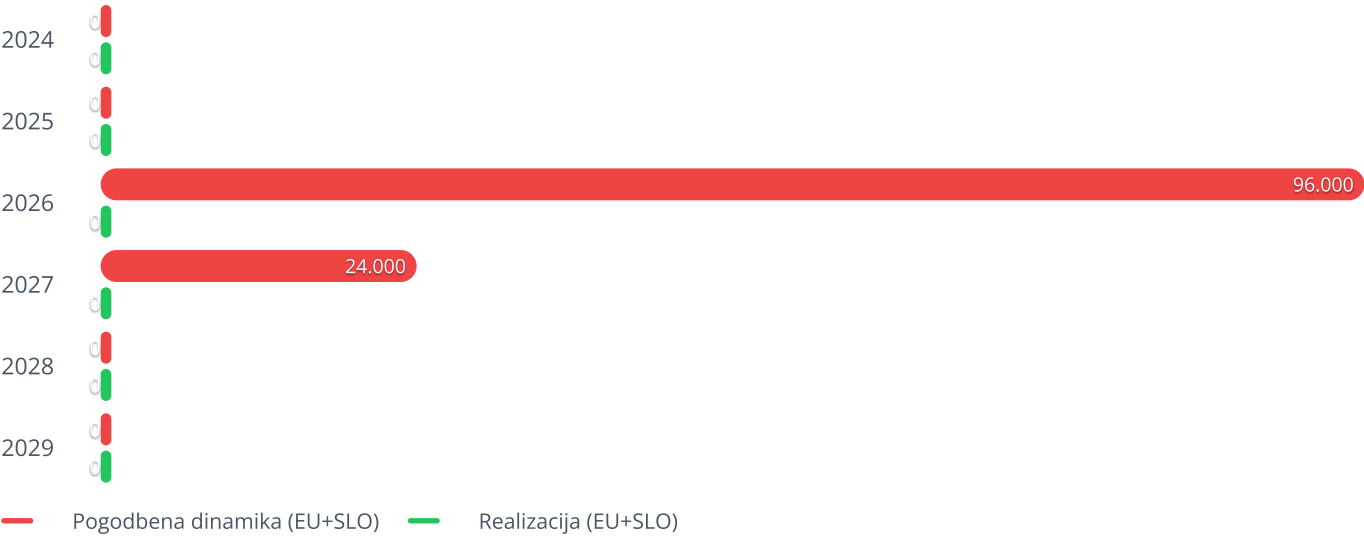

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Dodatne opombe:

Opombe še niso vpisane.

Metodološka pojasnila

Podatki v poročilu so pripravljene na podlagi informacij, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov na dan priprave poročila. Podatki o napredovanju projektov, terminskih načrtih, finančni dinamiki in kazalnikih temeljijo na podatkih, ki so jih posredovali upravičenci projektov, pristojne regionalne razvojne agencije, posredniška telesa in drugi sodelujoči deležniki.

Napovedi prehodov med fazami, napovedi zaključkov projektov in napovedi koriščenja sredstev predstavljajo informativne analitične ocene sistema in ne predstavljajo uradnih odločitev pristojnih organov.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, regionalne razvojne agencije in drugi sodelujoči deležniki ne prevzemajo odgovornosti za morebitna odstopanja med prikazanimi podatki oziroma napovedmi in dejanskim izvajanjem projektov.

Poročilo je informativne narave in je namenjeno spremljanju izvajanja projektov v okviru dogovorov za razvoj regij.

SKRBNIK REGIJE

ODGOVORNA OSEBA
