




DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Pomurska

Število projektov v dogovoru:	23
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	4
Višina dodeljenih sredstev:	40.410.926,30 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	685.692,00 EUR

Črpanje (real/plan):

2%



Projekti zelo zamujajo

26% v časovnici

29.07.2026

Kako brati poročilo

Poročilo prikazuje trenutno stanje projektov, fazo izvedbe, finančne podatke, kazalnike in napovedi na podlagi podatkov, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov.

Pomen faz projekta

Faza	Pomen
Priprava dokumentacije	Priprava investicijske in projektne dokumentacije ter oddaja vloge.
Odločitev	Projekt je v obravnavi pri posredniškem telesu, organu upravljanja ali v pripravi pogodbe.
Izvajanje	Pogodba o sofinanciranju je podpisana in projekt se izvaja.
Zaključek	Projekt je izvedbeno oziroma finančno zaključen.

Pomen barv

- Upravičenec / priprava dokumentacije
- PT obravnava
- OU odločanje
- PT pogodba
- Izvajanje
- Zaključeno

Napovedi in finančni podatki

Predvideni datumi prehodov med fazami in napovedi koriščenja sredstev so analitične ocene, pripravljene na podlagi evidentiranih podatkov o projektih, pogodbeni dinamiki, realizaciji in napredovanju projektov.

Kazalo projektov

1. Podjetniški inkubator Lendava — Lendava · RSO1.3 - INKUBATOR
2. Mrežni podjetniški inkubator POVEZOVALNIK — Moravske Toplice, Puconci, Turnišče · RSO1.3 - INKUBATOR
3. Tehnološko kompetenčni park Soboško jezero — Murska Sobota · RSO1.3 - INKUBATOR
4. Podjetno nad izzive v Pomurski regiji – PONI Pomurje — RSO1.3 - PONI
5. Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnegasistema Pomurje A) — Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana · RSO2.5 - VODOVODI
6. Rekonstrukcija vodovodov v Občini Ljutomer (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mota - Lukavci) — Ljutomer · RSO2.5 - VODOVODI
7. Nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni — Gornja Radgona · RSO2.5 - OČOV
8. Fekalna kanalizacija v naselju Kamenščak — Ljutomer · RSO2.5 - OČOV
9. Ureditev zelenih površin v Veržaju — RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
10. Revitalizacija grajskega parka Beltinci — Beltinci · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
11. Zeleno – Modra povezovalna os naselja Dobrovnik — Dobrovnik · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
12. Ozelenitev mesta Gornja Radgona — Gornja Radgona · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
13. Zelena oaza ob starem mestnem jedru Lendave — Lendava · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
14. Središče Moravskih Toplic – zeleni sistem — Moravske Toplice · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
15. Zeleno srce Radencev — Radenci · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
16. Zelena preobrazba Šafarskega — Razkrižje · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
17. Zeleni sistem v Šalovcih – zelena vez Šalovec — Šalovci · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
18. Učni užiteni park Turnišče — Turnišče · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

- 19. **Ureditev kolesarske poti Bratonci-Križevci** — Beltinci, Križevci · RSO3.2 - KOLESARKE
- 20. **Izgradnja KP Ključarovci – Ljutomer** — Križevci, Ljutomer · RSO3.2 - KOLESARKE
- 21. **Državna kolesarska povezava Bogojina – Gančani (G17)** — Moravske Toplice · RSO3.2 - KOLESARKE
- 22. **Pomurski center mobilnosti** — RSO3.2 - RCM - RCPS
- 23. **Regijska celostna prometna strategija za Pomurje** — RSO3.2 - RCM - RCPS

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real	% real.
1.	RSO1.3 - INKUBATOR	3	11.689.163,02	0,00	0,00 %
2.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	685.692,00	44,58 %
3.	RSO2.5 - OČOV	2	5.470.154,92	0,00	0,00 %
4.	RSO2.5 - VODOVODI	2	4.243.773,06	0,00	0,00 %
5.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	10	8.519.702,84	0,00	0,00 %
6.	RSO3.2 - KOLESARKE	3	8.606.610,46	0,00	0,00 %
7.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	343.250,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ		23	40.410.926,30	685.692,00	1,70 %

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
DRSI	2	5.470.623,33	0,00
Mestna občina Murska Sobota	1	5.881.287,00	0,00
Občina Beltinci	1	837.176,41	0,00
Občina Dobrovnik	1	1.049.427,13	0,00
Občina Gornja Radgona	2	3.718.156,24	0,00
Občina Lendava	2	2.364.572,82	0,00
Občina Lendava	1	3.081.516,23	0,00
Občina Črenšovci			
Občina Odranci			
Občina Turnišče			
Občina Dobrovnik			
Občina Velika Polana			
Občina Kobilje			

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Občina Ljutomer	2	4.253.561,75	0,00
Občina Moravske Toplice	2	3.950.439,13	0,00
Občina Radenci	1	1.545.000,00	0,00
Občina Razkrižje	1	1.082.950,00	0,00
Občina Turnišče	2	4.442.609,66	0,00
Občina Veržej	1	504.994,60	0,00
Občina Šalovci	1	347.090,00	0,00
Razvojni center Murska Sobot	1	1.538.272,00	685.692,00
Zavod za turizem razvoj Lendava	2	343.250,00	0,00
SKUPAJ	23	40.410.926,30	685.692,00

Načrt in realizacija koriščenja sredstev

Leto	Dinamika EU	Dinamika SLO	Dinamika EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	259.039,20	45.712,80	304.752,00	228.201,20	40.270,80	268.472,00	88,1 %
2025	292.961,00	51.699,00	344.660,00	354.637,00	62.583,00	417.220,00	121,1 %
2026	15.328.402,10	2.705.012,12	18.033.414,22	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	13.474.333,25	2.377.823,52	15.852.156,77	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	3.822.790,27	674.610,04	4.497.400,31	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	1.171.761,55	206.781,45	1.378.543,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	34.349.287,37	6.061.638,93	40.410.926,30	582.838,20	102.853,80	685.692,00	1,7 %


Kazalniki

Kazalniki

Vključeni projekti 23

Projekti z vnesenimi kazalniki 21 / 23

Skupni napredek kazalnikov



RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež dos
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	93	—	
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	53	—	

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež dos
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	37	—	

RSO25

0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (s
RCO30	Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda	km	—	14
RCO31	Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode	km	—	12
RCO32	Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode	PE	9	1320
RCR41	Prebivalci na izboljšanem javnem vodovodu	osebe	—	3848
RCR42	Prebivalci, priključeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode	osebe	—	6118

RSO27

0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Do
INNOV	Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest	število	—	1	
RCO36	Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo	ha	9	40	
RCR95	Prebivalci z dostopom do nove ali izboljšane zelene infrastrukture	osebe	—	14297	

RSO32


0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029
RCO58	Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo	km	0	1
RCRXX	Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo	uporabniki	—	76

Poročilo je pripravil: Metka Farič

Datum in čas priprave: 29.07.2026 13:30

Projekt 1: Podjetniški inkubator Lendava



Občina izvajanja projekta: Lendava

Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR

Višina sofinanciranja: 1.970.642,56 €

Real črpanja: 0,00 €

83%

IZVEDBA

15 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je obnova propadajoče mestne hiše v mestnem jedru Lendave za vzpostavitev novih (uporabnih) površin inkubatorja. Cilji: vzpostavitev novih uporabnih površin inkubatorja, krepitev podjetniške kulture, razvoj podjetništva v regiji in izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva v regiji, zagon novih podjetij v regiji, ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij. Objekt v katerem bo vzpostavljen podjetniški inkubator, bo trajnostno obnovljen z lokalnimi materiali (opeka, les,...), na novo opremljen z neto površino 650 m², od tega najmanj 60 % uporabnih površin, ki bodo namenjene podjetniškemu inkubatorju oz. uporabnikom. BRUTO TLORISNA OBJEKTA: 1.079 m², Neto uporabna površina bo 650 m², Kazalniki projekta so: – Število podprtih investicijskih projektov: 1 na novo vzpostavljen podjetniški inkubator; – Bruto tlorisna površina objekta je 1.079 m², neto površina podjetniškega inkubatorja bo 650 m², Priloga IZRIS PROSTOROV; - zasedenost uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta bo najmanj 70 % – 20 vključenih podjetij v inkubator od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 10 izvedenih projektov z gospodarstvom, od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 30 izvedenih usposabljanj oz. delavnic v okviru inkubatorja, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 5 novo vključenih podjetij, ki preživijo na trgu, v obdobju treh let od zaključka projekta

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.675.046,18	0,00	0,00 %
SLO	295.596,38	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.970.642,56 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: Poslan poziv PT (MKRR) za dopolnitev vloge NPO. Občina na poziv še ni odovorila. Poziv, da se odzvi pripravi čim prej. Pogodba z izvajalcem je podpisana. Datum zaključka izvajanja se zamakne za 3 mesece, 25. 12. 2026.
- 30.01.2026: Dopolnitev vloge NPO oddana 15.1.2026, pogodba z izvajalcem sklenjena, čakajo odločitev o podpori. Zaključek izvajanja in črpanja predviden v celoti v 2026.
- 20.05.2026: TRD 7.5.2026 Vloga NPO oddana in je popolna, pripravlja se odločitev o podpori. JR izveden, marca 2026 uvedba izvajalca v izvedbo del. Črpanje v celoti možno v 2026.
- 28.07.2026: TRD 22. 7, 2026 Pogodba o sofinanciranju podpisana 14. 7. 2026, gradbena dela potekajo. JN za opremo predvideno jeseni 2026. Zaključek 2026. Črpanje v celotni vrednosti možno v 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek (31.03.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta


Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	28.12.2026	26.07.2027

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	1.675.046,18	295.596,38	1.970.642,56	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.675.046,18	295.596,38	1.970.642,56	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

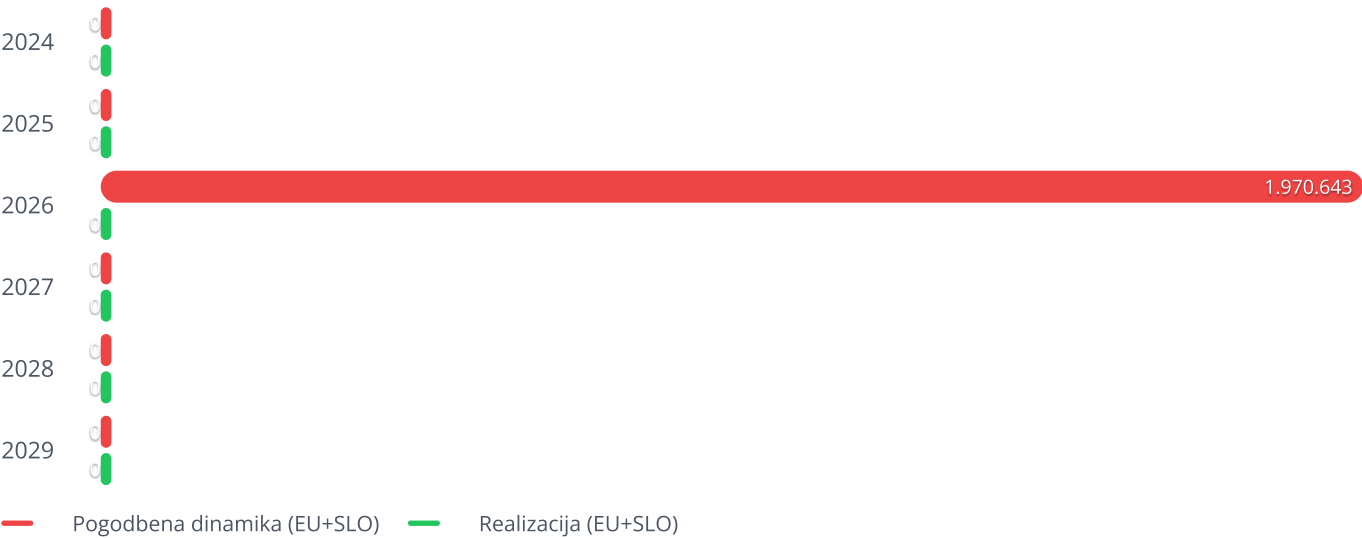


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13




Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	20	—	0%
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	5	—	0%

Poročilo je pripravil: Metka Farič

Datum in čas priprave: 29.07.2026 13:30

Projekt 2: Mrežni podjetniški inkubator POVEZOVALNIK



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice, Puconci, Turnišče
Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR
Višina sofinanciranja: 3.837.233,46 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
13 dni

Kratek opis projekta:

Namen naložbe je dvigniti konkurenčnost občin Turnišče, Puconci in Moravske Toplice z vzpostavitvijo spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. Kvantitativni cilji oz. rezultati projekta so: – 3 nove lokacije podjetniškega okolja; – čez 1.100,00 m2 novih neto površin podjetniškega inkubatorja – vsaj 800 m2 uporabnih površin inkubatorja – zasedenost uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta bo najmanj 70 % – 20 vključenih podjetij v inkubator od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 10 izvedenih projektov z gospodarstvom, od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 30 izvedenih usposabljanj oz. delavnic v okviru inkubatorja, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 5 novo vključenih podjetij, ki preživijo na trgu, v obdobju treh let od zaključka projekta

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	45	Zamik zaradi priprave projektne dokumentacij in vloge NPO.
06.05.2026	60	PIZ in IP bosta potrjena v mesecu maju.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.261.648,44	0,00	0,00 %
SLO	575.585,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.837.233,46 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: GD pridobljena kot napovedano, urejana PZI za 2 občini (Turnišče, Moravske Toplice), za Puconce se čaka PZI (kulturnovarstveno soglasje), popolna dokumentacija nov rok 31. 12. 2025. NPO začetek 2026. Objekt v Turnišču se že gradi.
- 30.01.2026: Projekt za 3 občine. Vloga NPO bo oddana do 15.3.2026, projektna dokumentacija v pripravi (IP in investicijska zasnova). Generalni zamik projekta za mesec in pol. Objava JR za izbor izvajalca v marcu, izvedba predvidena v 2026 in 2027. Dinamika črpanja se bo predvidoma spremenila.
- 07.05.2026: Pri pripravi vloge še manjka poslovni načrt, ki bo izdelan do konca meseca maja. Vloga bo oddana konec meseca maja. Javno naročilo je izvedeno. Vloga NPO še ni oddana, oddaja predvidena do konca maja 2026.

Projektna dokumentacija v pripravi: naslednji teden (11.-15. 5. 2026) PZI v pregled vsem partnerjem, IP, poslovni načrt do konca maja 2026. Takoj po potrditvi, bi šli v izvajanja. JN za izvajalca izvedeno(1 JN 3 sklopi). Občini Turnišče in Moravske Toplice bi lahko začeli z izvajanjem v 2026, Puconci v 2027. Zamik dinamike v 2027. Možna sprememba skupne višine projekta (manj kot 20 %).

- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Vloga za NPO poslana na PT MLSKRR 16. 7. 2026. Manjša sprememba projekta (povečanje vrednosti za 19,92 %), obvestilo in pojasnilo spremembe posredovano skupaj z vlogo NPO. Izvajalec za gradnjo izbran, čaka se uskladitev vloge oz. odločitev OU. JN za opremo naknadno. Izvajanje 2026 in 2027. Predvideno črpanje 2026: 2,8 mio EUR.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (30.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (105 dni + 75 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +105 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	27.02.2026	12.06.2026	15.02.2027
Odločitev o podpori	31.03.2026	14.07.2026	01.03.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.04.2026	13.08.2026	15.03.2027
Zaključek projekta	30.09.2027	13.01.2028	14.08.2028


Projekt 3: Tehnološko kompetenčni park Soboško jezero

2

NAPREDEK

2. junija, 2025

31. decembra, 2028



Občina izvajanja projekta: Murska Sobota ^{32%}

Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR

Višina sofinanciranja: 5.881.287,00 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

422 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je izgradnja novih prostorskih kapacitet in nakup opreme za delovanje podjetniškega inkubatorja in krepitev podpornega podjetniškega ekosistema v Pomurju in mestni občini Murska Sobota. Podjetniški inkubator bo nudil podporno okolje za nastanek, rast in razvoj novih podjetij (inkubirancev) v mestni občini in pomurski regiji z zagotavljanjem prostorov za delovanje podjetij (pisarne, skupni prostori, coworking, ipd.) in nudenje podpornih storitev. Namen novozgrajene infrastrukture je zagotovi odporni program s poudarkom na vzpodbujanju tehnoloških in visokotehnoloških podjetij, v podporo katerim se bo omogočilo tudi raziskovalno razvojno in laboratorijsko okolje na potencialnih S5 področjih na katerih je regija izpostavila svoje razvojne potenciale (krožno gospodarstvo, IKT tehnologije, hrana, zdravje – medicina, okolje, tovarne prihodnosti, novi materiali, ipd). Hkrati bo inkubator predstavljal stičišče sodelovanja med podjetji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami s prenosom znanja. Inkubator bo tako zagotavljal nove poslovne priložnosti in možnost za ustvarjanje novih kakovostnih in tudi visoko-tehnoloških delovnih mest.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	4.999.093,95	0,00	0,00 %
SLO	882.193,05	0,00	0,00 %
SKUPAJ	5.881.287,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 20.05.2026: TRD 7.5.2026 Projekt vključen v Dogovor z dodatkom št. 5, podpisan 5. 5. 2026. Zaključek projekta je predviden 31. 12. 2028 (v vlogi za NPO bo 30. 6. 2029). Vloga NPO se pripravlja na podlagi strokovnih izhodišč (ne projektne dokumentacije). Občina se je odločila za naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev po sistemu »design and build«, objava JN (izbor izvajalca) je predvidena za julij 2026. Popolna vloga NPO predvidoma oktober / november 2026. GD bo pridobljeno v 6 mesecih od oddaje vloge NPO.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Oddaja vloge NPO predvidena december 2026. Celotna projekta dokumentacija do srede leta 2027. Začetek gradnje v drugi polovici 2027. Zaključek projekta zamaknjen za 6 mesecev, do 30. 6. 2029. Izbran izvajalec za pripravo JN »design and build« in investicijske dokumentacije. Objava JN design and build avgust 2026. Izbira pripravlja dokumentacij in izvajalca gradnje predvidoma oktobra. Predvidena dinamika črpanja 2027, 2028, 2029.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga:

M1 Potrditev DIIP/PZI (30.10.2026)


Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.10.2026	30.10.2026

Projekt 4: Podjetno nad izzive v Pomurski regiji – PONI Pomurje



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Real črpanja: 685.692,00 €

IZVEDBA
799 dni

Kratek opis projekta:

Usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Zaposlitev oseb za 4 mesece. Vsebinska podpora s strani notranjih, zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.307.531,20	582.838,20	44,58 %
SLO	230.740,80	102.853,80	44,58 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	685.692,00 €	44,58 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena
Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (08.09.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici


Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	15.11.2028	28.01.2031

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	259.039,20	45.712,80	304.752,00	228.201,20	40.270,80	268.472,00	88,1 %
2025	292.961,00	51.699,00	344.660,00	354.637,00	62.583,00	417.220,00	121,1 %
2026	329.966,60	58.229,40	388.196,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	289.877,20	51.154,80	341.032,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	135.687,20	23.944,80	159.632,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.307.531,20	230.740,80	1.538.272,00	582.838,20	102.853,80	685.692,00	44,6 %

Načrt in realizacija po letih

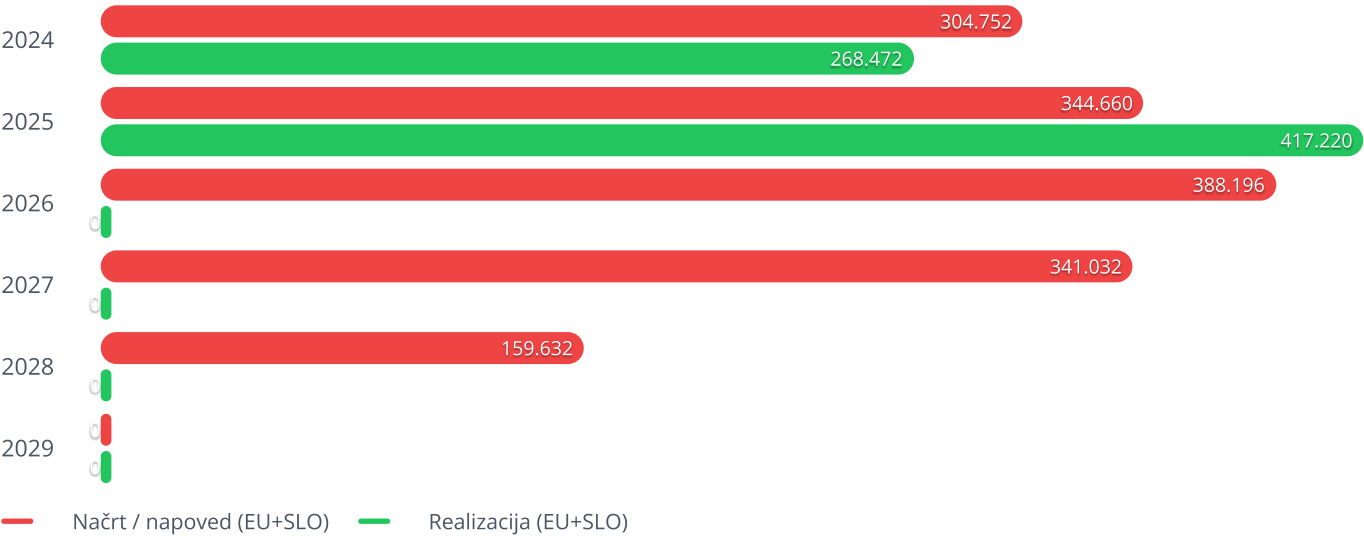


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13




Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	0%

Poročilo je pripravil: Metka Farič

Datum in čas priprave: 29.07.2026 13:30

Projekt 5: Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Pomurje A)



Občina izvajanja projekta: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 3.081.516,23 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

218 dni

Kratek opis projekta:

Občina bo s sredstvi DRR izgradila cca. 6.428 metrov novega vodovodnega omrežja, ki bo v celoti nadomestilo staro, že amortizirano omrežje, ki večkrat poka in povzroča vodne izgube. Namen investicije je vzpostaviti pogoje za kvalitetno dobavo pitne vode gospodinjskim odjemalcem in gospodarstvu ter posledično odpraviti vodne izgube na dotrajanem in amortiziranem vodu, starem več kot 40 let, za obdobje najmanj 50 let. Namen projekta je tudi vzpostaviti učinkovit sistem (telemetrijo) za zajem in obdelavo podatkov na celotnem vodovodnem sistemu v Občini Lendava in Občinah, ki so partnerice projekta ter inovativne programske rešitve za potrebe informacij, potrebnih za učinkovito upravljanje s sistemom, ki oskrbuje več kot 21.978 prebivalcev. Slednje pomeni, da se bodo v zadnjih letih, zaradi amortiziranosti mnogih odsekov v sistemu, povečane vodne izgube znižale za več kot zahtevanih 20% glede na izračunan ILI faktor (za zadnje triletno povprečje). Kazalniki: – Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda 6,4 km – Prebivalci, priklopljeni na izboljšan javni vodovod 21.978

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.619.288,80	0,00	0,00 %
SLO	462.227,43	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.081.516,23 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
Vloga NPO oddana 22.12.2026. Sprememba vrednosti projekta iz 4,1 MIO EUR na 5,3 MIO EUR – ker gre za spremembo večjo od 20%, bo potrebno podpisati dodatek k Dogovoru. Gradbena dela se na terenu že zaključujejo, temu bo sledila telemetrija (postopek JR). Predviden zaključek projekta je 2028.
- 02.04.2026: Na podlagi prejete vloge za NPO je MNVP upravičencu izdalo poročilo o pregledu dne 13. 2. 2026.
- 06.05.2026: Izveden operativni sestanek MNVP z upravičencem dne 23. 2. 2026. Na dopolnitev vloge še čakajo.
- 07.05.2026: Čakate še na soglasje Zavoda za naravno dediščino. Dokument bodo dobili v petek 8.5.2026. Vloga dopolnjena bodo oddali v naslednjem tednu. Javno naročilo z odločnim pogojem. Po podpisu pogodbe bo lahko izdan zahtevek že v letošnjem letu. Približno 1,1 MIO EUR. Vloga NPO oddana 22. 12. 2025, dopolnitve in sestanek z MNVP februar 2026. Čakajo soglasje za Natura 2000, dopolnitev NPO predvidoma naslednji teden (11. – 15. 5.). Bistvena sprememba projekta – sprememba skupne vrednosti za več kot 20 %: sprememba potrjena na RSR in SR, 8. 5. 2026 MKRR/skrbnik pošlje v novo soglasje na PT/MNVP. JN za odločnim pogojem za vse naslednji teden. Del projekta v vrednosti 1,1 mio EUR že izveden. Če bo odločitev, pogodba o sofinanciranju (pred tem MNVP preveri postopek JN), možno črpanje že v 2026 (cca 700.000/800.000 EUR – 75%)
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Vloga za ponovno soglasje zaradi povečanje vrednosti projekta za 30 % poslana na MNVP/MOP 8. 5. 2026. V dopolnitvi vloge (junij 2026) (nova) manjša sprememba vrednosti glede na poslano za pridobitev soglasja PT! Dopolnitev oz. obvestilo o spremembi ni bilo poslano na MLSKRR. JR za gradnjo izveden, izvajalec izbran, dela potekajo. JN za telemetrijo in 5. fazo vodovoda Lendava – Pince v pripravi, objava predvidoma julij 2026. Če bo odločitev OU oz. pogodba o sofinanciranju, možno črpanje v 2026 1,634.174 EUR.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (10.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	12.01.2026	14.09.2026
Odločitev o podpori	12.02.2026	30.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	12.03.2026	28.10.2026
Zaključek projekta	29.12.2028	16.08.2029

Projekt 6: Rekonstrukcija vodovodov v Občini Ljutomer (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mota -Lukavci)



Občina izvajanja projekta: Ljutomer

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 1.162.256,83 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

197 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer ter rekonstrukcija vodovoda v Precetinih-2. faza. Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja bo zagotovljena nemotena oskrba z zdravim pitno vodo iz svojih vodnih virov na območju Precetinci-Kuršinci in Ljutomer-Cven, uredile se bodo tlačne razmere v omrežju, vodne izgube se bodo zmanjšale, motenj v oskrbi bo manj in zato bodo zmanjšani tudi vzdrževalni stroški. Cilji investicije: > izvesti rekonstrukcijo na cca. 7,167 km vodovodnega omrežja, > povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema; > zmanjšanje stroškov vzdrževanja vodooskrbnega sistema; > zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju; > izboljšanje kakovosti življenja; > zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih; > zmanjšati razvojno ogroženost; > povečanje števila prebivalcev v občini in regiji; > priseljevanje mladih družin; > preprečiti odseljevanje mladih. Kazalniki: – Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda 7,167 km – Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod 16.505

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	987.918,30	0,00	0,00 %
SLO	174.338,53	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.162.256,83 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026: Vloga NPO oddana 13.1.2026, JR za izbor izvajalca objavljen februarja 2026, začetek del v maju 2026, zaključek v avgustu 2027.
- 02.04.2026:
Na podlagi prejete vloge za NPO je MNVP upravičencu izdalo poročilo o pregledu dne 25. 3. 2026. Operativni sestanek z upravičencem bo izveden istočasno kot za projekt OČOV upravičenca (17. 4. 2026).
- 07.05.2026: Vloga bo dopolnjena do konca meseca maja. Vloga NPO oddana 13. 1. 2026, poziv za dopolnitev 25. 3. 2026, usklajevalni sestanek z MNVP 17. 4. 2026. GD pravnomočno, do konca maja bo dopolnjena vloga NPO. Odločitev OU možna letos (poleti 2026). Če bo izvedba 2026, bo dinamika zaradi omejitev proračuna namesto 2026 / 2027 načrtovana za 2026 in 2028, sklepanje aneksa za 2027 po sprejemu rebalansa proračuna RS. Predvideno JN z odložnim pogojem kot za OČOV.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Dopolnitev vloge NPO oddana 24. 6. 2026. Manjša sprememba vrednosti – ZNIŽANJE skupne vrednosti in znižanje sofinanciranja 1.645.718,46 na 1.647.650,47 EUR, upravičeni stroški 1.549.675,76 EUR) in sofinanciranja – ostanek kvote 46.537,06 EUR (z 1.162.256,82 EUR na 1.115.719,76 EUR). Sprememba kazalnikov: RCO30: 5,995 km, RCR41:6.071 prebivalcev (obrazložitev podana ob spremembi vloge, ni še bila poslana na MLKRR Spremenjena dinamika - črpanje 2026, 2027 in 2028 (podaljšana).

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	14.09.2026
Odločitev o podpori	27.02.2026	28.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	26.10.2026
Zaključek projekta	30.08.2027	26.03.2028

Projekt 7: Nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni



Občina izvajanja projekta: Gornja Radgona

Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV

Višina sofinanciranja: 2.378.850,00 €

Real črpanja: 0,00 €

70%

ODLOČITEV
PT obravnava
224 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer izgradnja fekalne kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici v naselju Gornja Radgona, izgradnja fekalne kanalizacije od naselja Lomanoše do naselja Podgrad ter navezava na kanalizacijski sistem v Gornji Radgoni in obstoječo komunalno čistilno napravo Gornja Radgona, nadgradnja obstoječe komunalne čistilne naprave Gornja Radgona in razširitev zadrževalnega bazena B4. Z investicijo se bodo zagotovile ustreznejše razmere na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zgradilo se bo 1.882 metrov novega kanalizacijskega omrežja (na novo bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih 36 uporabnikov) ter z nadgradnjo obstoječe komunalne čistilne naprave povečala učinkovitost čiščenja odpadnih voda, da bo le-ta skladna z Direktivo Sveta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Ministrstva za okolje in prostor z dne 17. 9. 2020. Kazalniki: Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode 1,882 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode 13.200 PE Prebivalci, priključeni vsaj na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode 5.719

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.022.022,50	0,00	0,00 %
SLO	356.827,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.378.850,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: Vloga NPO bo oddana 30. 11. 2025. Razpis za izvajalca 1.1. 2026, pogodba z izvajalcem in začetek del 1. 6. 2026 (če bo do takrat pogodba o sofinanciranju), del projekta se že izvaja. Občina opozori na povečanje vrednosti projekta, zaradi česar je stopnja sofinanciranja pod 60 %. MKRR in MNVP dorečeta obravnavno tovrstnih primerov (ali se zagotavljajo dodatna sredstva iz DRR), za vse mora veljati enak pristop.
- 30.01.2026:
Vloga NPO je bila oddana na MNVP 17.12.2025, čakajo povratne informacije o morebitnih dopolnitvah. Povečana skupna vrednost projekta iz 3,3 MIO EUR na 4,6 MIO EUR (56% upravičenih sredstev). Naj občina kontaktira MNVP - potrebna bo dopolnitev oz. dodatek k Dogovoru, saj gre za večjo spremembo.
- 02.04.2026: MNVP je na podlagi prejete vloge za NPO upravičencu izdalo poročilo o pregledu dne 3. 3. 2026. Operativni sestanek z upravičencem bo izveden 2. 4. 2026.
- 07.05.2026: Javno naročilo izvedeno. Izvajalec bo izbran v začetku meseca junija 2026. Načrtovano je črpanje v letu 2026 in sicer v višini 360.000 EUR. Odzivno poročilo na MNVP dano 23. 4. 2026, čaka se odziv MNVP. Bistvena sprememba projekta - povečanje skupne vrednosti za 40 %. Dokumentacija za pridobitev ponovnega soglasja PT poslana na MNVP 8. 5. 2026. Upravičenec je na MNVP že poslal tudi izjavo o zagotavljanju sredstev občine za izvedbo projekta. Del projekta se že izvaja. Črpanje za ta del bo mogoče takoj po podpisu pogodbe o sofinanciranju (cca 360.000 EUR v 2026). Za drugi del se izvaja JN, izbor izvajalca junij 2026. V pripravi JN za nadzor.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Upravičenec čaka odgovor na odzivno poročilo (dano 23. 4. 2026) in na dopolnjeno soglasje PT zaradi povečanja skupne vrednosti za več kot 20 % (vloga dana 8. 5. 2026). Izbran izvajalec 10. 7. 2026,

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (12.12.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	06.09.2026
Odločitev o podpori	30.01.2026	20.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	13.10.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	15.08.2028

Projekt 8: Fekalna kanalizacija v naselju Kamenščak



Občina izvajanja projekta: Ljutomer
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 3.091.304,92 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

161 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Naselje Spodnji Kamenščak se nahaja v aglomeraciji 493-Ljutomer 2019 s skupno obremenitvijo enako ali večjo 2.000 PE. Fekalne vode se bodo čistile na obstoječi čistilni napravi Ljutomer, ki ni predmet vloge. Z izgradnjo fekalne kanalizacije bo aglomeracija v celoti opremljena z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekt zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 9.889 m, izgradnja 9 črpališč in ureditev 165 revizijskih jaškov za izvedbo hišnih priključkov, na katere se bo priključilo cca. 399 prebivalcev.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	30	Zamik zaradi izpolnjevanja vloge NPO in pridobivanja GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.627.609,18	0,00	0,00 %
SLO	463.695,74	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.091.304,92 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: Vloga bo oddana 31. 12. 2025. Zamik 2-3 mesece zaradi pridobivanja službnosti (ena fizična oseba), zadeva urejena, GD se pričakuje 30. 11. 2025. Izbor izvajalca po potrditvi proračuna, predvidoma 31. 3. 2026. Dinamika se ne spremeni.
- 30.01.2026: Vloga NPO bo oddana do 15.2.2026 - generalni zamik za 1 mesec. GD je bilo pridobljeno v januarju 2026, čakajo pravnomočnost. JR predvideno po sprejetju občinskega proračuna, izbran izvajalec predvidoma do konca marca 2026. Znižana je vrednost projekta in vrednost sofinanciranja, nova dinamika bo vnešena, ko bo izdana odločitev o podpori.
- 02.04.2026: Vloga za NPO prejeta na MNVP, ki pripravlja poročilo o pregledu (izdano bo v aprilu 2026).
- 06.05.2026: MNVP upravičencu izdalo poročilo o pregledu (nepopolne) vloge za NPO dne 2. 4. 2026. Z upravičencem izveden operativni sestanek dne 17. 4. 2026.
- 07.05.2026: Vloga bo posredovana do konca meseca maja. Vloga NPO oddana 16. 2. 2026, prvi poziv za dopolnitev 2. 4. 2026, usklajevalni sestanek 17. 4. 2026, dopolnitev vloge NPO predvidoma do konca maja 2026. (odprto vprašanje upravičeni – neupravičeni stroški, prilagoditev IP, čakajo dodatno izjavo za Natura 2000, čeprav projekt že ima GD. Občina želi zagotovilo, da bo projekt res financiran, da bi lahko šla v zadolževanje za izvedbo projekta.
- 02.06.2026: Na MNVP poteka pregled dopolnitve vloge NPO.
- 28.07.2026: 22. 7. 2026 Dopolnitev vloge NPO dana 5. 6. 2026. Podaljšano trajanje projekta v 2028 (31. 10. 2028), Manjša sprememba vrednosti (ZNIŽANJE skupne vrednosti z 4.255.301,59 na 3.940.907,00 in znižanje

sofinanciranja – **ostanek kvote: 374.712,55 EUR** (z 3.091.304,93 na 2.721.922,92 EUR). Sprememba kazalnikov: RCO31: 8.449 km, RCR42: 370 prebivalcev (obrazložitev podana ob spremembi vloge, ni še bila poslana na MLSKRR.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (31.12.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja (30 dni + 180 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +30 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	01.03.2026	20.10.2026
Odločitev o podpori	27.02.2026	29.03.2026	03.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	30.04.2026	17.11.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	30.01.2028	18.08.2028

Projekt 9: Ureditev zelenih površin v Veržaju



Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 504.994,60 €
Real črpanja: 0,00 €

82%

ODLOČITEV

PT obravnava

198 dni

Kratek opis projekta:

Predvideva se ureditev zelene infrastrukture. Gre za specifično investicijo, s katero si investitor prizadeva ohraniti čim več zelenih površin v občinskem središču. Uresničitev investicijske namere prispeva k ciljem evropske kohezijske politike RSO 2.7, zlasti k izboljšanju varstva narave, biotske raznovrstnosti ter zelene infrastrukture v mestnem okolju, obenem pa k zmanjšanju onesnaževanja. Realizacija projekta bo izboljšala kakovost življenja, povečala delež uporabnih zelenih površin za rekreacijo, druženje in počitek ter prispevala k nadaljnjemu razvoju občine Veržej in njenega središča. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,3 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 975

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	429.245,41	0,00	0,00 %
SLO	75.749,19	0,00	0,00 %
SKUPAJ	504.994,60 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026: Vloga NPO oddana 12.1.2026, z zamudo, ker PZI ni bil pravočasno izdelan. JR za izbor izvajalca predviden v marcu 2026, po sprejemu občinskega proračuna. Izvedba del predvidena od julija do oktobra 2026. Skupna vrednost investicije po oddani vlogi je predvidena višja, vrednost sofinanciranja ostane nespremenjena.
- 31.03.2026: Na podlagi prejete vloge za NPO je MNVP upravičencu izdalo poročilo o pregledu dne 20. 3. 2026. Z upravičencem usklajujejo termin za operativni sestanek.
- 06.05.2026: Operativni sestanek MNVP z upravičencem izveden 14. 4. 2026.
- 07.05.2026: Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se dopolni PZI (v tem tednu) in v naslednjem tednu dopolnjena vloga. Izvajalec za pripravo razpisa bo izbran. Projekt bodo zaključili v letošnjem letu. Vloga NPO oddana 12. 1. 2026, poziv za dopolnitev 22. 3. 2026, do konca tedna (8. 5. 2026) predvidena oddaja dopolnitev PZI, naslednji teden 11. 5-15. 5. predvidena oddaja dopolnjene vloge NPO (oboje pripravlja zunanji izvajalec). Upravičenca želi investicijo fizično zaključiti do oktobra 2026, financiranje do konca leta 2026 (zapiranje proračuna).
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Junija 2026 oddana dopolnitev vloge NPO. Objava JN v juliju 2026 (z odložnim pogojem). Izvedba predvidena v 2026. Zaključek 31. 10. 2026 (prej 31. 12. 2026).

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	16.10.2026
Odločitev o podpori	30.01.2026	30.10.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	13.11.2026
Zaključek projekta	31.12.2026	16.09.2027

Projekt 10: Revitalizacija grajskega parka Beltinci



Občina izvajanja projekta: Beltinci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 837.176,41 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
423 dni

Kratek opis projekta:

Občina Beltinci bo revitalizirala obstoječi javno dostopni grajski park Beltinci, ki je lociran v samem središču trškega naselja Beltinci. Izboljšali bomo zeleno in modro infrastrukturo, ki bo postala povezovalni element dvorca Beltinci, športno-rekreacijskih površin, upravnih objektov, cerkve in naselja Beltinci, na naravi temelječih rešitev. S prostorsko povezljivostjo in prepletenostjo različnih programov in vsebin, postane park bolj dostopen, povezljiv in privlačen za prebivalce in druge obiskovalce iz regije ter širše. Poleg tega bomo vzpostavili primer dobre prakse prepleta kulturne dediščine, zelene in modre infrastrukture v smislu biotske raznovrstnosti in pestrosti, športa/rekreacije ter zelenih koridorskih povezav z naseljem in kulturno krajino. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 11,3 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.274

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	30	Zamik zaradi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z ZVKD.
07.05.2026	90	Manjkala soglasje ZVKD. Prvo mnenje je bilo negativno.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	711.599,95	0,00	0,00 %
SLO	125.576,46	0,00	0,00 %
SKUPAJ	837.176,41 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
Projektna dokumentacija bo zaključena do 28.2.2026, do takrat tudi oddaja vloge NPO. Zamik projekta zaradi usklajevanja projekta z Zavodom za varovanje kulturne dediščine. JR predviden v maju 2026, z deli naj bi začeli do junija 2026.
- 20.05.2026: TRD 7.5.2026 Vloga za NPO še ni oddana, razlog negativno mnenje ZVKD, usklajevanja tečejo od septembra 2025, pozitivno odločitev pričakujejo do konca maja 2026. Sledila bo uskladitev inv. dokumentacije (vrednosti, dinamika). Oddaja vloga NPO junij 2026 (zamik dodatne 3 mesece na 60 dni). Večina del predvidena za izvedbo jesen 2026 in pomlad 2027. MNPV opozori na čakalno vrsto vlog. Upravičenca naj pripravi čim bolj popolno vlogo.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga:

 Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga:

 M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (120 dni + 90 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.01.2026	30.05.2026	27.08.2026
Oddaja vloge na OU	27.02.2026	27.06.2026	01.10.2026
Odločitev o podpori	31.03.2026	29.07.2026	26.10.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.04.2026	28.08.2026	25.11.2026
Zaključek projekta	31.07.2026	28.11.2026	25.02.2027

Projekt 11: Zeleno – Modra povezovalna os naselja Dobrovnik



Občina izvajanja projekta: Dobrovnik
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.049.427,13 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
30 dni

Kratek opis projekta:

Predmet investicije je celostna ureditev javnih površin z namenom povezovanja javnih površin znotraj centra občine Dobrovnik. Cilj projekta je ustvariti ustrezno povezavo (zelena pešpot in/ali zasaditev). Povezava je smiselno krožno speljana med posameznimi javnimi površinami, med katerimi so manjši parki in površine za rekreacijo oz. šole in vrtca, občinskega središča in ostalimi površinami ki so namenjene preživljanju prostega časa in sproščanja. Cilji projekta: – Vzpostavitev povezave med zelenimi in drugimi javnimi površinami z utrjeno pešpotjo – Ureditev novih in obstoječih javnih površin z zasaditvami, zatravitvami, drevoredi, ipd – Rekonstrukcija obstoječih brvi čez Bukovniški potok (3x), – Izvedba varčne razsvetljave ob pešpoteh. – Urbana oprema, – Informacijske table. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 6,5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 321

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	120	Zamuda s pripravo projektne dokumentacije.
07.05.2026	30	Zaradi priprave PZI se zadeva zamakne za mesec dni.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	892.013,07	0,00	0,00 %
SLO	157.414,06	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.049.427,13 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
PZI še v izdelavi, usklajevanje s projektantom. Projekt ločen na dva sklopa – modro in zeleno. Popolna projektna dokumentacij bo pridobljena do konca aprila 2026, vloga NPO bo oddana predvideno do konca maja 2026. Generalni zamik 4 mesece.
- 20.05.2026: TRD 7.5.2026 Vloga NPO še ni oddana, predvidoma bo 30. 6. 2026 (nnejasnosti glede zahtev MNVP – upravičeni / neupravičeni stroški oz. delitev 60 : 40). PZI v pripravi, čaka se soglasje Telekomu. Začetek del in nekaj stroškov predvidenih v 2026, večina v 2027. Če želi občina v izvajanje čim prej, JN za izbor izvajalca z odložnim pogojem vezano na odločitev OU.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Vloga NPO dodana 29. 6. 2026. PZI izdelan, potrebno GD (nezahtevni objekt). JN po uskladitvi vloge NPO. Črpanje 2026: 48.800 EUR; večina v 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (150 dni + 60 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +150 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	02.03.2026	30.07.2026	26.01.2027
Odločitev o podpori	02.04.2026	30.08.2026	09.02.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	04.05.2026	01.10.2026	23.02.2027
Zaključek projekta	31.12.2027	29.05.2028	21.10.2028

Projekt 12: Ozelenitev mesta Gornja Radgona



Občina izvajanja projekta: Gornja Radgona
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.339.306,24 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
 PT obravnava
 279 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin ter njihovo povezovanje, za zagotavljanje t.i. zelenih koridorjev v mestu. S projektom želimo zagotoviti in izboljšati zeleno infrastrukturo v mestu, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev ter izboljšati dostop prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih. Prav tako želimo v luči podnebnih sprememb zagotoviti ustrezno kvaliteto življenja občanov in osenčiti dele mesta, kjer se občani največ gibajo. kazalnik: Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 17 ha Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture, 3.302

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.138.410,30	0,00	0,00 %
SLO	200.895,94	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.339.306,24 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026: Vloga NPO oddana 21.10.2025, vloga je v pregledu na MNVP. Objavo JR za izbor izvajalca predviden do konca januarja 2026, izvajalec izbran do konca marca 2026. Dela zaključena v 2027. Črpanje sredstev predvideno v 2026 in 2027.
- 31.03.2026: Vlogo za NPO 23. 10. 2025 prejeli na MNVP, 9. 3. 2026 s strani MNVP izdano poročilo o pregledu. Operativni sestanek na temo vloge bodo imeli 2. 4. 2026.
- 07.05.2026: Javno naročilo so izvedli, v dveh delih en izvajalec je izbran drugi pa še bo. Za urbano opremo bodo razpis ponovili v mesecu juniju. Skrbnik bo dopolnjeno vlogo posredoval na MNVP. Vprašanje, če bo v letu 2026 kakšno črpanje? Vloga NPO oddana oktober 2025. Poziv za dopolnitev sredi marca 2026, usklajevalni sestanek z MNVP 2. 4. 2026. Upravičence izpostavi nerazumne zahteve za projekte ZI (neprimerljivo bolj zahtevne kot OČOV / PV). Občina bo zato, da bo pripravila ustrezno vlogo NPO, angažirala 2 zunanja izvajalca. MNVP pozove občino k dialogu in ponudi pomoč.
- 02.06.2026: MNVP z upravičencem izvedlo še en operativni sestanek 28. 5. 2026, čakajo dopolnitev vloge za NPO.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Odgovor na odzivno poročilo v pripravi pri upravičencu (odprto urejanje služnosti za del poti). 17. 6. podpis pogodbe z izvajalcem, 1. 7. uvedba v delo. JN za urbano opremo objavljen, rok za ponudbe 20. 7. 2026. Sprememba dinamike črpanja: v letu 2026 možno črpanje 500.000 EUR

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (21.10.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	21.11.2025	03.09.2026
Odločitev o podpori	22.12.2025	28.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	21.01.2026	28.10.2026
Zaključek projekta	30.06.2027	05.04.2028

Projekt 13: Zelena oaza ob starem mestnem jedru Lendave



Občina izvajanja projekta: Lendava
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 393.930,26 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
40 dni

Kratek opis projekta:

Namen investicije je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v urbanih naseljih ter njihovo povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t. i. zelenih in modrih koridorjev, z vzpostavitvijo dveh območij parka z ribnikom in parka sadnih dreves. Glavni cilj investicije je gradnja zelenih površin z vzpostavitvijo dveh območij, parka z ribnikom in parka sadnih dreves. Zagotovljena bo kvalitetna ponudba površin za nemoteno izvajanje gibalnih spretnosti mlajših, dodatna možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine in ostalih občanov. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 0.52 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 2814

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	30	Zamik zaradi pridobivanja GD.
07.05.2026	90	Zamik je nastal zaradi priprave projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	334.840,73	0,00	0,00 %
SLO	59.089,53	0,00	0,00 %
SKUPAJ	393.930,26 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
GD bo pridobljeno do 31.1.2026, predvidena oddaja NPO 15.2.2026. JR za izbor izvajalca bo objavljen v februarju, izbran bo v aprilu 2026. Izvedba del od maja 2026 do septembra 2027. Črpanje predvideno v 2026 in 2027.
- 20.05.2026: TRD 7.5., 2026 Vloga NPO še ni oddana, predvidoma bo 31. 5. 2026 (zamuda dodatno 3 mesece). MNVP poziva k predložitvi čim bolj popolne vloge. MKRR: vloga NPO se posreduje v pregled RRA, nato na MNVP. Projektna dokumentacija: PZI izdelana, Čaka se soglasje DRSV glede povečanja vodnega zadrževalnika, vloga za GD naslednji teden (11.-15. 5.).
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Vloga NPO oddana junij 2026. Manjka datum popolne dokumentacije! GD pridobljeno. Objava JR avgust 2026 oz. po uskladitvi vloge NPO. Izbira izvajalca oktober 2026. Zaključek projekta ponovno zamaknjen.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (12.01.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (120 dni + 78 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	28.11.2025	28.03.2026	06.02.2027
Odločitev o podpori	12.03.2026	10.07.2026	20.02.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	10.04.2026	08.08.2026	06.03.2027
Zaključek projekta	31.12.2026	30.04.2027	26.11.2027


Projekt 14: Središče Moravskih Toplic – zeleni sistem

12%

NAPREDEK

29. avgusta, 2025

3. marca, 2028



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 814.452,00 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

112 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je posamezne po prostorskih značilnostih in vsebini različne zelene površine povezati v za Moravske Toplice prepoznavno prostorsko in tudi pomensko celoto ter s tem prispevati k zmanjšanju in blaženju podnebnih sprememb v kraju, zdravju in družbenemu življenju ter dobrobiti prebivalcev in s tem obiskovalcev in turistov, omogočiti dostopnost za vse, izboljšati estetiko kraja ter prispevati k privlačnosti kraja ter zelenemu razvoju turizma v destinaciji. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 10 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.026

Uradne zamude pri projektu

Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	45	Zamik zaradi čakanja na pridobitev GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	692.284,20	0,00	0,00 %
SLO	122.167,80	0,00	0,00 %
SKUPAJ	814.452,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
Oddaja vloge NPO do konca februarja 2026, projektna dokumentacija je v pripravi. Vloga za pridobitev GD je vložena, v postopku manjka še ustna obravnava, ki bo 10.2.2026. Generalni zamik za 1 mesec in pol. JR za izbor izvajalca v marcu, bo zaključen do junija 2026. Začetek del predviden v juniju 2026.
- 07.05.2026: Sestanek z MNVP bo predvidoma v mesecu maju 2026. Načeloma je predvideno, da bo črpanje v letu 2026? Vloga NPO oddana 8. 4. 2026. Občina bo šla v izvedbo v 2026, želja občine je tudi črpanje v 2026. MNVP si bo prizadeval za prvi pregled vloge (osnovne zadeve) v maju 2026. V maju / juniju lahko upravičenec pričakuje poziv na sestanek. Upravičenec bo šel v JN z odložnim pogojem. Potencialno črpanje 2026.
- 02.06.2026: Na MNVP poteka pregled prejete vloge za NPO.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Odzivno poročilo MOP prejeto julija 2026, usklajevalni sestanek predviden 11. 8. 2026. Objava JN predvidena v avgustu, podpis pogodbe predvidoma oktobra. Izvedba jesen 2026 – september 2027. Črpanje 2026: 498.000 EUR.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (15.01.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (45 dni + 150 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +45 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	16.02.2026	02.04.2026	23.11.2026
Odločitev o podpori	16.03.2026	30.04.2026	07.12.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	16.04.2026	31.05.2026	21.12.2026
Zaključek projekta	30.11.2027	14.01.2028	05.08.2028

Projekt 15: Zeleno srce Radencev



Občina izvajanja projekta: Radenci

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.545.000,00 €

Real črpanja: 0,00 €

73%

ODLOČITEV

PT obravnava

243 dni

Kratek opis projekta:

Izboljšanje kakovosti in uporabnosti degradirane zelene površine ter vzpostavitev novih javnih zelenih površin v radenskem parku. Na območju cca 15.000 kvadratnih metrov površin, ki so v celoti del kulturnega spomenika lokalnega značaja in pod kontrolo ZVKD, bomo zgradili nova javna igrišča za otroke na parcelah št. 660/4 in zeleni poseg bo na parcelah 663/1, 661/2, 660/5, 661/19, 660/4, 661/21, 661/3, 660/3 in 661/16 vse k.o. Radenci, v skladu s konservatorskim in z arburističnim načrtom bomo odstranili stara drevesa in zasadili nova drevesa na celotni površini obravnave in površine ozelenili z grmovnicami in travo, umaknili asfaltne in betonske površine na delu parcele 661/19 in jih ozelenili, njihova zamenjava bo v skladu projektnimi pogoji ZVKD in vsebino konservatorskega načrta, dograditev manjkajočih povezovalnih potk. V obnovo bodo dodane moderne kompozicije sprehajalnih stez, izgradnja tematskih vsebin interaktivnih učilnic. Namestili bomo novo urbano opremo v skladu s katalogom urbane opreme, ki je v izdelavi. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 2.008

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.313.250,00	0,00	0,00 %
SLO	231.750,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.545.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: Eno GD že pridobljeno, drugo do 30. 11. 2025. Hkrati priprava vloge za NPO do 30. 11. 2025. Razpis za izbor izvajalca takoj po popolni dokumentaciji. MNVP: obvezno en razpis za izvajalca. Občina želi projekt dokončati do 25. 6. 2025.
- 30.01.2026:
Vloga NPO oddana 28.11.2025, je v pregledu pri MNVP. Izvajalec je že izbran, uvod v delo konec februarja 2026. Projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana.
- 31.03.2026: MNVP na podlagi prejete vloge za NPO pripravlja poročilo o pregledu, ki bo predvidoma izdano v aprilu 2026.
- 06.05.2026: MNVP je upravičencu izdalo poročilo o pregledu (nepopolne) vloge za NPO dne 14. 4. 2026.
- 07.05.2026: Popravki so oddani. Danes so oddali popolno dokumentacijo. Projekt je v izvajanju, zaključek 15. 12. 2026. Črpanje v letu 2026. 7. 5. 2026 dan odziv na MNVP (zadnji 4 dokumenti za dopolnitev vloge NPO). Projekt se izvaja, do zdaj porabljenih 300.000 EUR. Zaključek projekta 15. 12. 2026, zadnja situacija december 2026, gradbena dela bodo zaključena oktobra 2026, možno črpanje 2026. Takoj bi lahko poslali zahtevek za 600.000 EUR. MNVP obljudi prednostno obravnavno. Pred podpisom pogodbo o sofinanciranju PT/MNVP pregleda postopek JN (pred tem se odpre NPR). Upravičenec zagotovi, da bo podatki o JN zbrani in pripravljeni za posredovanje na MNVP.
- 02.06.2026: MNVP z upravičencem izvedlo operativni sestanek 6. in 22. 5. 2026, čakajo prejem dopolnjene vloge.
- 28.07.2026: Dopolnitev vloge NPO oddana 16. 6. 2026. Upravičenec izpostavlja težave pri pošiljanju dokumentov na PT. Manjša sprememba vrednosti projekta. Obvestila oz. obrazložitve na ministrstvu še nismo prejeli. Dela potekajo. Izvedba in črpanje predvideno v 2026 (1,545 mio EUR).

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M6 Pogodba z izvajalcem
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (01.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	29.08.2026
Odločitev o podpori	31.01.2026	27.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	24.10.2026
Zaključek projekta	31.12.2026	27.08.2027

Projekt 16: Zelena preobrazba Šafarskega



Občina izvajanja projekta: Razkrižje
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.082.950,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

422 dni

Kratek opis projekta:

Projekt je namenjen ozelenitvi naselja Šafarsko, ki je središče občine Razkrižje. Območje projekta zajema cca 16.995 kvadratnih metrov površin. Zelena preobrazba v projektu je urejena in predvidena tako, da bo po zaključku izvedbe projekta nastala trajnostna povezana enota. Poudarjamo, da so vse utrjene peš ali utrjene peš in kolesarske poti narejene iz naravnih materialov (v nadaljevanju utrjena peš ali peš in kolesarska pot), kjer bo to mogoče bomo te poti ozelenili s travo, saj sledimo sonaravnim načelom in pri vzpostavitvi nove zelene infrastrukture ne uporabljamo asfalta ali betona, vse poti želim čim bolj ozeleniti. Že grajene objekte iz asfalta ali betona ozelenjujemo. Stara drevesa bomo pomladili, po potrebi odstarnili in zasadili nova, površine bomo ozelenili z grmovnicami. Namestili bomo novo urbano opremo, umestili javno razsvetljavo. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,7 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 261

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	60	Zamik zaradi pridobivanja PZI in vloge NPO.
07.05.2026	30	Priprava vloge za NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	920.507,50	0,00	0,00 %
SLO	162.442,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.082.950,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026: Oddaja vloge NPO 31.5.2026, PZI predvidoma izdelan do konca aprila 2026. JR za izbor izvajalca objavljen v juniju, izbran v septembru 2026. Črpanje sredstev predvideno v letu 2027, možno tudi črpanje sredstev že v letu 2026 - odvisno od časa podpisa pogodbe. Dinamiko črpanja se bo prilagodilo. Generalni zamik 2 meseca zaradi priprave PZI in vloge NPO.
- 07.05.2026: Projektna dokumentacija bo popolna konec meseca maja. Vloga bo oddana konec 30. 6. 2026. Vloga NPO predvidena 30. 6. 2026 (dodatni zamik 1 mesec). Projekta dokumentacija v pripravi. Popolna naj bi bila do konca maja 2026. Črpanje v 2027.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Oddaja vloge NPO predvidoma avgusta 2026. Dokumentacija v pripravi. Predviden zamik projekta v 2028 (trajanje do 20. 6. 2028). Prenos sredstev iz 2026 v 2027 in 2028.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga:

 Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga:

 M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (90 dni + 212 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +90 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.03.2026	29.06.2026	26.01.2027
Oddaja vloge na OU	30.04.2026	29.07.2026	02.03.2027
Odločitev o podpori	29.05.2026	27.08.2026	26.03.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.06.2026	28.09.2026	27.04.2027
Zaključek projekta	31.12.2027	30.03.2028	27.10.2028

Projekt 17: Zeleni sistem v Šalovcih – zelena vez Šalovec



Občina izvajanja projekta: Šalovci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 347.090,00 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
96 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta Zelena vez Šalovci je izboljšati kakovost življenja v naselju Šalovci s povezovanjem ključnih delov kraja z zeleno in modro infrastrukturo. Projekt vključuje urejanje dostopnih, senčenih, naravno zasajenih in funkcionalnih javnih površin za pešce, kolesarje, otroke in rekreativce. Zeleni sistem bo pomagal pri blaženju podnebnih sprememb, izboljšal bivalne pogoje ter spodbudil trajnostni turizem in rekreacijo. Projekt omogoča tudi zadrževanje deževnice za namakanje in ohlajanje kraja ter spodbuja biodiverzitetu z avtohtonimi rastlinami. S tem občina naslavlja okoljske, družbene in razvojne izzive podeželskega okolja. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 0.5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 201

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	60	Zamik zaradi izpolnjevanja vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	295.026,50	0,00	0,00 %
SLO	52.063,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	347.090,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
Projektna dokumentacija je izdelana. JR za izbor izvajalca del objavljeno v januarju 2026, izbor izvajalec v marcu 2026. Izvedba del od marca do septembra 2026. Vloga NPO je v pripravi, oddati jo nameravajo v februarju 2026. Generalni zamik za 2 meseca. Izvedba in črpanje sredstev še vedno predvidena v celoti v 2026.
- 07.05.2026: Javno naročilo je izvedeno in izvajalec izbran. Vloga NPO oddana 24. 4. 2026. Skrbnik MNVP še ni bil dodeljen. JN za izvajalca pripravljen, podpisana tudi pogodba, naslednji teden predviden začetek del. Zaključek projekta 30. 9. 2026, Črpanje v celoti možno v 2026. MNVP pove, da bo vlogo obravnaval prednostno. Pričakuje se ažurne odzive s strani upravičenca.
- 02.06.2026: Na MNVP dne 24. 4. 2026 prejeli pomanjkljivo vlogo za NPO. Upravičenca so pozvali k dopolnitvam, pričakujejo odziv.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Dopolnitev vloge NPO oddana julij 2026. Dela že potekajo. JN za opremo je predvideno v avgustu 2026. Izvedba in črpanje v celotni vrednosti možno 2026. Min. sprememba kazalnika površine 1,06 na 1,1 ha.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (60 dni + 183 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	01.03.2026	26.01.2027
Odločitev o podpori	30.01.2026	31.03.2026	09.02.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	28.04.2026	23.02.2027
Zaključek projekta	31.12.2026	01.03.2027	27.12.2027

Projekt 18: Učni užitni park Turnišče



Občina izvajanja projekta: Turnišče
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 605.376,20 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
72 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je ureditev užitnega parka Turnišče, v sklopu katerega se bo zagotovila in izboljšala zelena in modra infrastruktura na območju Občine Turnišče. Uredil se bo prostor v občinskem središču z zasaditvijo in gojenjem užitnih avtohtonih rastlinskih vrst s pripadajočo vsebino za lokalno skupnost, občane ter ostale obiskovalce. Urbani vrtovi in sonaravna igrišča bodo služili tudi kot prostor za promocijo samooskrbe in srečevanje občanov, predajanje znanja med generacijami in vzpostavljanje spoštljivega odnosa do narave. Velik poudarek projekta bo na sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in razvoju inovativnih pristopov za ohranitev biodiverzitete že v fazi načrtovanja in oblikovanja prostora. S projektom bomo krepili modro in zeleno infrastrukturo v občinskem središču z uporabo novih zelenih tehnologij, materialov in na naravi temelječih rešitah ter s tem izboljšali kakovost urbanega okolja in bivanjske kakovosti ter tako prispevali k rasti odporne in trajnostno naravnane družbe. – Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest: 1 – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.615

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	60	Zamik 2 meseca zaradi priprave vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	514.569,77	0,00	0,00 %
SLO	90.806,43	0,00	0,00 %
SKUPAJ	605.376,20 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
Projektna dokumentacija je izdelana. Oddaja vloge NPO do 28.2.2026 – generalni zamik 2 meseca. JR za izbor izvajalca se ponovi. Izvedba še vedno planirana v celoti v 2026.
- 04.05.2026: Vloga NPO poslana v pregled na RRA 27. 3. 2026. Z oddajo vloge se počaka do potrditve bistvene spremembe projekta (sprememba skupne vrednosti projekta za več kot 20 %) na sejah regijskih organov.
- 07.05.2026: Javno naročilo bodo ponovno objavili. Po potrditvi oddaje vloge. Vprašanje je ali je lahko v letu 2026 sploh kaj izplačano? Vloga za NPO poslana v pregled na RRA 27. 3. 2026; vloga NPO še ni bila poslana na MNVP, bistvena sprememba projekta - skupna vrednost se poveča za več kot 20 %, deleži sofinanciranja DRR ostajajo enaki; sprememba potrjena na RSR in SR, 8. 5. 2026 MKRR/skrbnik pošlje v novo soglasje na PT/MNVP. Izvajanje naj bi se začelo letos, črpanje zamik v 2027.

- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Upravičenec čaka na odzivno poročilo MNVP/MOP (vloga oddana 18. 5. 2026) in na ponovno soglasje PT zaradi povečanje celotne vrednosti za 23 % (vloga dana 8. 5. 2026). Objava JN po uskladitvi vloge NPO. Predvidena izvedba sept / oktober 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (60 dni + 150 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	31.03.2026	17.01.2027
Odločitev o podpori	27.02.2026	28.04.2026	31.01.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	30.05.2026	14.02.2027
Zaključek projekta	31.12.2026	01.03.2027	16.11.2027

Projekt 19: Ureditev kolesarske poti Bratonci-Križevci



Občina izvajanja projekta: Beltinci, Križevci
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.892.080,33 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

422 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče kolesarske stezein sprememba potovalnih navad , opravljanja poti z avtomobilom preusmeriti na kolo,električno kolo ,peš hojo. Predvidena je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske poti (mestoma dvostranske) ob regionalni cesti R2-439/1302 Bratonci-Kiževci in R1-230/1415 Križevci v skupni dolžini 3280m.Predvidena je tudi ureditev priključka občinske ceste JP 724581 na R2-439/1302 v km 8+500,izgradnja premostitvenega objekta preko obstoječega jarka na R2-439/1302 vkm 8+812,ureditev avtobusne postaje na R2-439/1302 v km 9+295 ter ureditev javne razsvetljave v območju urejanja avtobusnih postajališč in prehodov za pešce. Kazalniki: nameska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo: 3,2 km; število potnikov, ki uporablja namensko kolesarsko infrastrukturo: 2.600.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.608.268,28	0,00	0,00 %
SLO	283.812,05	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.892.080,33 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026: Nosilec projekta je DRSI. Vloge NPO še niso oddali, ni še popolne projektne dokumentacije - odkupljena so vsa zemljišča razen 1, to pa je v postopku pridobivanja. Kontaktirati še DRSI za podatke o dejanskem stanju.
- 07.05.2026: Vloga je v pripravi. Pripravlja se nov DIIP. Vloga bo oddana v maju 2026. Vlogo NPO pripravlja DRSI. Oddaja vloge se zamika (januar – marec – maj). Vsa zemljišča so odkupljena, dokumentacija pripravljena, projekt bi lahko šel v izvajanje. Izvajalec je bil izbran, čaka se na vlog in odločitev OU (začetek izvedbe je bil predviden za 1. 3. 2026). Neja Saksida, DRSI pove, da je vloga NPO v zaključni fazi usklajevanja in naj bi bila do konca maja 2026 poslana na MZI.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Bistvena sprememba vrednosti projekta (skupna vrednost +22 %). Potrjeno na sejah SR in RSR 22. 7. 2026, 27. 7. vloga za dopolnjeno soglasje poslana na MZIE. Odkupljena so vsa zemljišča, dokumentacija je pripravljena za posredovanje vloge NPO na PT (MZIE).

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga:

Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga:

M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.12.2025	29.07.2026
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	01.09.2026
Odločitev o podpori	27.02.2026	24.09.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	26.10.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	27.07.2028

Projekt 20: Izgradnja KP Ključarovci – Ljutomer



Občina izvajanja projekta: Križevci, Ljutomer
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 3.578.543,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

272 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče kolesarske steze in sočasna rekonstrukcija ceste na relaciji Ljutomer – Ključarovci. Če odštejemo obstoječo dvosmerno kolesarsko stezo od km 2,62 do km 2,96 bo tako na novo zgrajeno 2.620m ločene dvosmerne kolesarske steze, 1.160m trase bo dograjene s pločnikom in na njem enosmerno kolesarsko stezo, ki bo s talno signalizacijo ločena od površin za pešce, ter 620m nove dvosmerne kolesarske steze, ki bo zgrajena na levi strani ceste na območju sedaj enosmerne kolesarske steze. Skupaj torej 4.400m novih kolesarskih stez. število potnikov, ki uporablja namensko kolesarsko infrastrukturo: 2.000.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.041.761,55	0,00	0,00 %
SLO	536.781,45	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.578.543,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026: Občina od novembra ni kontaktirala DRSI, treba preveriti stanje.
- 07.05.2026: Pridobivanje zemljišč je šele na začetku. Projektna dokumentacija bo v zaključni fazi. Vprašanje je ali bo sploh vloga tu pravočasno oddana. Vloga bo oddana julij. Vlogo NPO pripravlja DRSI. Investicijska dokumentacija v fazi recenzije. Odkupljenih 10 % zemljišč. Občina zagotovi polno sodelovanje pri odkupih zemljišč. Dogovorjeno, da RRA pripravi dopis za MZI in sporoči, da sta občini Križevci in Ljutomer pripravljeni sodelovati pri odkupih zemljišč in postopkih na terenih, da se zagotovi čimprejšnja priprava vloge NPO.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Intenzivno poteka odkup zemljišč. Aktivno sodelovanje občine. Možna sprememba vrednosti (več kot 20 %), Znano avgusta po zaključenih odkupih. Vloga NPO pripravlja DRSI, vodja Petra Zamejc, dokumentacijo za vlogo NPO pripravlja Neja Saksida. Predložitev na PT MZIE do 30. 9. 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.10.2026	01.10.2026
Oddaja vloge na OU	02.11.2026	05.11.2026
Odločitev o podpori	01.12.2026	01.12.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	04.01.2027	04.01.2027
Zaključek projekta	31.12.2029	31.12.2029

Projekt 21: Državna kolesarska povezava Bogojina – Gančani (G17)

8%

NAPREDEK

Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice

Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE

Višina sofinanciranja: 3.135.987,13 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

247 dni

Kratek opis projekta:

Cilji projekta: 1.) izgradnja odseka državne glavne (G17 Moravavske Toplice – Ljutomer – Ormož) kolesarske povezave od Bogojine do Gančanov ob regionalni cesti (R3-743/5606) 2.) navezava na vzpostavljeno Termalno kolesarsko pot Martjanci – Dobrovnik (D8) 3.) na prometno obremenjeni cesti, izvoz iz AC 5 (R3-743/5606) vzpostaviti ločeno kolesarsko pot za večjo varnost in dostopnost do turističnega središča Moravske Toplice in ostalih turističnih destinacij na ozemlju OBčine Beltinci 4.)promocija trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja in gibanj

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.665.589,06	0,00	0,00 %
SLO	470.398,07	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.135.987,13 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 30.01.2026:
Nov projekt z dodatkom 4. Finančno konstrukcijo pošljejo. Datum oddaje vloge NPO 30.9.2026. Projektna dokumentacija je pripravljena, GD ni potrebno, OCPS sprejeta. Vlogo NPO bodo pripravili zunanji izvajalci. Črpanje sredstev je predvideno v 2027 in 2028.
- 07.05.2026: Priprava vloge je v teku. Dinamika črpanja bo v letu 2027 in 2028. Vloga NPO je v pripravi, oddana bo do septembra. Izvajanje in črpanje predvideno v 2027 in 2028. Čakajo odziv projektanta. Letos so nameravali iti v odkupe parcel (18 parcel). Špela Jereb, MZI opozori, da ma biti NRP (vloga NPO) usklajena s projektno dokumentacijo in ta z dejansko dinamiko.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Vloga NPO je v pripravi (zunanji izvajalec), izjave v pridobivanju, oddaja predvidena 15. 9. 2026. Poteka odkup zemljišč. Objava JN po uskladitvi vloge za NPO, predvidoma septembra 2026. Sklenitev pogodbe z izvajalcem do 31. 12. 2026. Izvajanje in črpanje predvideno v 2027 in 2028.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (30.09.2026)


Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.09.2026	30.09.2026
Oddaja vloge na OU	30.10.2026	04.11.2026
Odločitev o podpori	30.11.2026	30.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.12.2026	31.12.2026

Projekt 22: Pomurski center mobilnosti



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS

Višina sofinanciranja: 263.250,00 €

Real črpanja: 0,00 €

IZVEDBA

148 dni

Kratek opis projekta:

Predmet projekta je vzpostavitev in delovanje Pomurskega centra mobilnosti (v nadaljevanju PCM)

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	223.762,50	0,00	0,00 %
SLO	39.487,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	263.250,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: Vloga NPO oddana, MOPE čaka soglasje MF. Sprememba dinamike črpanja (prenos iz 2025).
- 30.01.2026: Projekt poteka v skladu s predvidenim terminskim planom.
- 20.05.2026: TRD 7.5.2026 Odločitev OU 13. 1. 2026, pogodba o sofinanciranju podpisana 18. 3. 2026.
- 28.07.2026: TRD 22. 7., 2026 Aktivnosti potekajo po načrtu. Dobro sodelovanje z MZIE in drugimi RCM. Delovni načrti in drugi dokumenti objavljeni na spletni strani. SPTM.SI

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta


Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	31.12.2027	16.06.2028

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	146.412,50	25.837,50	172.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	77.350,00	13.650,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	223.762,50	39.487,50	263.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

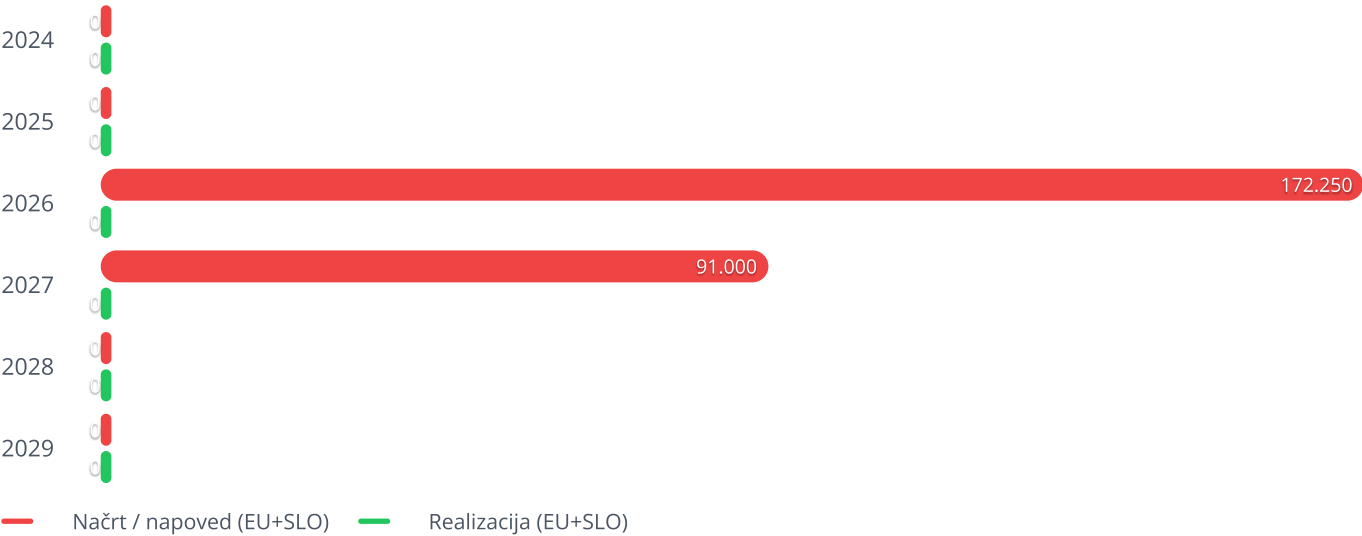


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Projekt 23: Regijska celostna prometna strategija za Pomurje



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 80.000,00 €
Real črpanja: 0,00 €

IZVEDBA

84 dni

Kratek opis projekta:

Vsebina projekta je priprava Regionalne celostne prometne strategije za Pomurje. Gre za strateški dokument, ki določa usmeritve za prihodnji razvoj prometa v regiji in ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Komentarji/opombe:

- 17.11.2025: Vloga NPO 14. 11. 2025. Sprememba dinamike črpanja, zamik iz 2025.
- 30.01.2026: JR za izbor izvajalca zaključen, pogodba bo podpisana 2.2.2026. Prejeli zahtevek za dopolnitev vloge NPO, dopolnitev bo oddana v prihodnjih dneh.
- 20.05.2026: TRD 7.5.2026 Odločitev OU 26. 3. 2026, pogodba o sofinanciranju podpisana 6. 5. 2026. Pogodba z izvajalcem 2.2. 2026, začetek del 3. 4. 2026.
- 28.07.2026: TRD 22. 7. 2026 Aktivnosti tečejo po načrtu. Projekt izvaja konzorcij, med njimi Urbanistični inštitut, ZUM Maribor. Koordinator aktivnosti Razvojna agencija sinergija.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta


Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	31.12.2027	11.06.2028

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	51.000,00	9.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	17.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	68.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

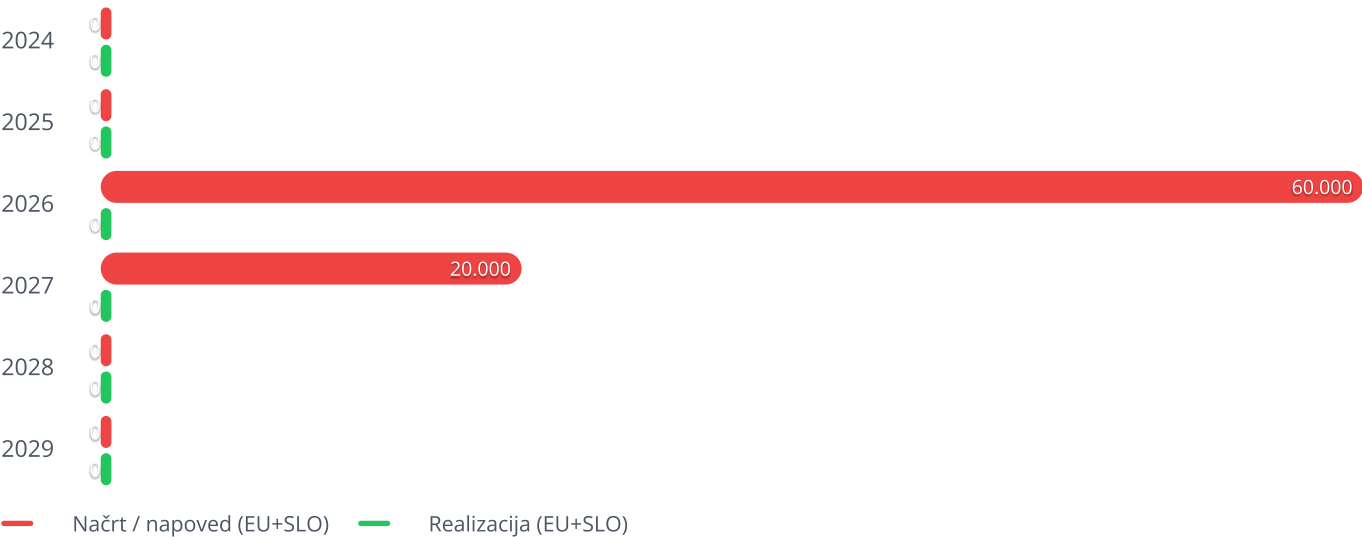

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Dodatne opombe:

Podatki, prikazani v poročilu, so informativne narave za namen spremljanja in prikaza izvajanja projektov iz Dogovora za razvoj regij. Pridobljeni so na podlagi informacij, posredovanih s strani upravičencev in regionalne razvojne agencije.

[Uredi opombe](#)

Metodološka pojasnila

Podatki v poročilu so pripravljeni na podlagi informacij, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov na dan priprave poročila.

Podatki o napredovanju projektov, terminskih načrtih, finančni dinamiki in kazalnikih temeljijo na podatkih, ki so jih posredovali upravičenci projektov, pristojne regionalne razvojne agencije, posredniška telesa in drugi sodelujoči deležniki.

Napovedi prehodov med fazami, napovedi zaključkov projektov in napovedi koriščenja sredstev predstavljajo informativne analitične ocene sistema in ne predstavljajo uradnih odločitev pristojnih organov.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, regionalne razvojne agencije in drugi sodelujoči deležniki ne prevzemajo odgovornosti za morebitna odstopanja med prikazanimi podatki oziroma napovedmi in dejanskim izvajanjem projektov.

Poročilo je informativne narave in je namenjeno spremljanju izvajanja projektov v okviru dogovorov za razvoj regij.

SKRBNIK REGIJE**ODGOVORNA OSEBA**
