




DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Pomurska

Število projektov v dogovoru:	22
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	1
Višina dodeljenih sredstev:	31.393.652,17 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	685.692,00 EUR

Črpanje (real/plan):

2%



Projekti zelo zamujajo

32% v časovnici

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real	% real.
1.	RSO1.3 - INKUBATOR	2	5.807.876,02	0,00	0,00 %
2.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	685.692,00	44,58 %
3.	RSO2.5 - OČOV	2	5.470.154,92	0,00	0,00 %
4.	RSO2.5 - VODOVODI	2	4.243.773,06	0,00	0,00 %
5.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	10	8.519.702,84	0,00	0,00 %
6.	RSO3.2 - KOLESARKE	3	5.470.623,33	0,00	0,00 %
7.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	343.250,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ		22	31.393.652,17	685.692,00	2,18 %

Pregled projektov po upravičencih


Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
DRSI	2	5.470.623,33	0,00
Občina Beltinci	1	837.176,41	0,00
Občina Dobrovnik	1	1.049.427,13	0,00
Občina Gornja Radgona	2	3.718.156,24	0,00
Občina Lendava	2	2.364.572,82	0,00
Občina Lendava	1	3.081.516,23	0,00
Občina Črenševci			
Občina Odranci			
Občina Turnišče			
Občina Dobrovnik			
Občina Velika Polana			
Občina Kobilje			
Občina Ljutomer	2	4.253.561,75	0,00
Občina Moravske Toplice	2	814.452,00	0,00
Občina Radenci	1	1.545.000,00	0,00

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Občina Razkrižje	1	1.082.950,00	0,00
Občina Turnišče	2	4.442.609,66	0,00
Občina Veržej	1	504.994,60	0,00
Občina Šalovci	1	347.090,00	0,00
Razvojni center Murska Sobota	1	1.538.272,00	685.692,00
Zavod za turizem razvoj Lendava	2	343.250,00	0,00
SKUPAJ	22	31.393.652,17	685.692,00

Predvideno črpanje po letih

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	259.039,20	45.712,80	304.752,00	228.201,20	40.270,80	268.472,00	88,1 %
2025	604.437,06	106.665,36	711.102,42	354.637,00	62.583,00	417.220,00	58,7 %
2026	14.879.523,54	2.625.798,26	17.505.321,80	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	8.195.733,99	1.446.306,00	9.642.039,99	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	1.574.109,02	277.783,94	1.851.892,96	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	1.171.761,55	206.781,45	1.378.543,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	26.684.604,36	4.709.047,81	31.393.652,17	582.838,20	102.853,80	685.692,00	2,2 %

Projekt 1: Državna kolesarska povezava Bogojina – Gančani (G17)



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 0,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Cilji projekta: 1.) izgradnja odseka državne glavne (G17 Moravavske Toplice – Ljutomer – Ormož) kolesarske povezave od Bogojine do Gančanov ob regionalni cesti (R3-743/5606) 2.) navezava na vzpostavljeno Termalno kolesarsko pot Martjanci – Dobrovnik (D8) 3.) na prometno obremenjeni cesti, izvoz iz AC 5 (R3-743/5606) vzpostaviti ločeno kolesarsko pot za večjo varnost in dostopnost do turističnega središča Moravske Toplice in ostalih turističnih destinacij na ozemlju OBčine Beltinci 4.)promocija trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja in gibanj

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	0,00	0,00	0,00 %
SLO	0,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	0,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
Nov projekt z dodatkom 4. Finančno konstrukcijo pošljejo. Datum oddaje vloge NPO 30.9.2026. Projektna dokumentacija je pripraavljena, GD ni potrebno, OCPS sprejeta. Vlogo NPO bodo pripravili zunanji izvajalci. Črpanje sredstev je predvideno v 2027 in 2028.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (30.09.2026)

Status časovnice projekta:Projekt je v časovnici

Projekt 2: Zeleno srce Radencev



Občina izvajanja projekta: Radenci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.545.000,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Izboljšanje kakovosti in uporabnosti degradirane zelene površine ter vzpostavitev novih javnih zelenih površin v radenskem parku. Na območju cca 15.000 kvadratnih metrov površin, ki so v celoti del kulturnega spomenika lokalnega značaja in pod kontrolo ZVKD, bomo zgradili nova javna igrišča za otroke na parcelah št. 660/4 in zeleni poseg bo na parcelah 663/1, 661/2, 660/5, 661/19, 660/4, 661/21, 661/3, 660/3 in 661/16 vse k.o. Radenci, v skladu s konservatorskim in z arburističnim načrtom bomo odstranili stara drevesa in zasadili nova drevesa na celotni površini obravnave in površine ozelenili z grmovnicami in travo, umaknili asfaltne in betonske površine na delu parcele 661/19 in jih ozelenili, njihova zamenjava bo v skladu projektnimi pogoji ZVKD in vsebino konservatorskega načrta, dograditev manjkajočih povezovalnih potk. V obnovo bodo dodane moderne kompozicije sprehajalnih stez, izgradnja tematskih vsebin interaktivnih učilnic. Namestili bomo novo urbano opremo v skladu s katalogom urbane opreme, ki je v izdelavi. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 2.008

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.313.250,00	0,00	0,00 %
SLO	231.750,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.545.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: Eno GD že pridobljeno, drugo do 30. 11. 2025. Hkrati priprava vloga za NPO do 30. 11. 2025. Razpis za izbor izvajalca takoj po popolni dokumentaciji. MNVP: obvezno en razpis za izvajalca. Občina želi projekt dokončati do 25. 6. 2025.
- 30.01.2026:
Vloga NPO oddana 30.11.2025, je v pregledu pri MNVP. Izvajalec je že izbran, uvod v delo konec februarja 2026. Projekt ostaja znotraj predvidenega terminskega plana.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M6 Pogodba z izvajalcem
Naslednja naloga: M3 Oddaja na OU (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 3: Zeleno – Modra povezovalna os naselja Dobrovnik



Občina izvajanja projekta: Dobrovnik
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.049.427,13 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Predmet investicije je celostna ureditev javnih površin z namenom povezovanja javnih površin znotraj centra občine Dobrovnik. Cilj projekta je ustvariti ustrezno povezavo (zelena pešpot in/ali zasaditev). Povezava je smiselno krožno speljana med posameznimi javnimi površinami, med katerimi so manjši parki in površine za rekreacijo oz. šole in vrtca, občinskega središča in ostalimi površinami ki so namenjene preživljanju prostega časa in sproščanja. Cilji projekta: – Vzpostavitev povezave med zelenimi in drugimi javnimi površinami z utrjeno pešpotjo – Ureditev novih in obstoječih javnih površin z zasaditvami, zatravitvami, drevoredi, ipd – Rekonstrukcija obstoječih brvi čez Bukovniški potok (3x), – Izvedba varčne razsvetljave ob pešpoteh. – Urbana oprema, – Informacijske table. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 6,5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 321

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	120
Obrazložitev:	Zamuda s pripravo projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	892.013,07	0,00	0,00 %
SLO	157.414,06	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.049.427,13 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
PZI še v izdelavi, usklajevanje s projektantom. Projekt ločen na dva sklopa – modro in zeleno. Popolna projektna dokumentacij bo pridobljena do konca aprila 2026, vloga NPO bo oddana predvideno do konca maja 2026. Generalni zamik 4 mesece.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



 Dokončano  V izvajanju  Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Zaznana zamuda (+120 dni) – projekt je še v časovnici

Projekt 4: Ozelenitev mesta Gornja Radgona



Občina izvajanja projekta: Gornja Radgona
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.339.306,24 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin ter njihovo povezovanje, za zagotavljanje t.i. zelenih koridorjev v mestu. S projektom želimo zagotoviti in izboljšati zeleno infrastrukturo v mestu, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev ter izboljšati dostop prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih. Prav tako želimo v luči podnebnih sprememb zagotoviti ustrezno kvaliteto življenja občanov in osenčiti dele mesta, kjer se občani največ gibajo. kazalnik: Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 17 ha Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture, 3.302

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.138.410,30	0,00	0,00 %
SLO	200.895,94	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.339.306,24 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026: Vloga NPO oddana 21.10.2025, vloga je v pregledu na MNVP. Objavo JR za izbor izvajalca predviden do konca januarja 2026, izvajalec izbran do konca marca 2026. Dela zaključena v 2027. Črpanje sredstev predvideno v 2026 in 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (21.10.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 5: Revitalizacija grajskega parka Beltinci



Občina izvajanja projekta: Beltinci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 837.176,41 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Občina Beltinci bo revitalizirala obstoječi javno dostopni grajski park Beltinci, ki je lociran v samem središču trškega naselja Beltinci. Izboljšali bomo zeleno in modro infrastrukturo, ki bo postala povezovalni element dvorca Beltinci, športno-rekreacijskih površin, upravnih objektov, cerkve in naselja Beltinci, na naravi temelječih rešitev. S prostorsko povezljivostjo in prepletenostjo različnih programov in vsebin, postane park bolj dostopen, povezljiv in privlačen za prebivalce in druge obiskovalce iz regije ter širše. Poleg tega bomo vzpostavili primer dobre prakse prepleta kulturne dediščine, zelene in modre infrastrukture v smislu biotske raznovrstnosti in pestrosti, športa/rekreacije ter zelenih koridorskih povezav z naseljem in kulturno krajino. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 11,3 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.274

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	30
Obrazložitev:	Zamik zaradi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z ZVKD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	711.599,95	0,00	0,00 %
SLO	125.576,46	0,00	0,00 %
SKUPAJ	837.176,41 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
Projektna dokumentacija bvo zaključena do 28.2.2026, do takrat tudi oddaja vloge NPO. Zamik projekta zaradi usklajevanja projekta z Zavodom za varovanje kulturne dediščine. JR predviden v maju 2026, z deli naj bi začeli do junlija 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Projekt 6: Središče Moravskih Toplic – zeleni sistem



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 814.452,00 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je posamezne po prostorskih značilnostih in vsebini različne zelene površine povezati v za Moravske Toplice prepoznavno prostorsko in tudi pomensko celoto ter s tem prispevati k zmanjšanju in blaženju podnebnih sprememb v kraju, zdravju in družbenemu življenju ter dobrobiti prebivalcev in s tem obiskovalcev in turistov, omogočiti dostopnost za vse, izboljšati estetiko kraja ter prispevati k privlačnosti kraja ter zelenemu razvoju turizma v destinaciji. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 10 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.026

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	45
Obrazložitev:	Zamik zaradi čakanja na pridobitev GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	692.284,20	0,00	0,00 %
SLO	122.167,80	0,00	0,00 %
SKUPAJ	814.452,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
Oddaja vloge NPO do konca februarja 2026, projektna dokumentacija je v pripravi. Vloga za pridobitev GD je vložena, v postopku manjka še ustna obravnava, ki bo 10.2.2026. Generalni zamik za 1 mesec in pol. JR za izbor izvajalca v marcu, bo zaključen do junija 2026. Začetek del predviden v juniju 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (28.11.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Projekt 7: Učni užitni park Turnišče



Občina izvajanja projekta: Turnišče
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 605.376,20 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je ureditev užitnega parka Turnišče, v sklopu katerega se bo zagotovila in izboljšala zelena in modra infrastrukture na območju Občine Turnišče. Uredil se bo prostor v občinskem središču z zasaditvijo in gojenjem užitnih avtohtonih rastlinskih vrst s pripadajočo vsebino za lokalno skupnost, občane ter ostale obiskovalce. Urbani vrtovi in sonaravna igrišča bodo služili tudi kot prostor za promocijo samooskrbe in srečevanje občanov, predajanje znanja med generacijami in vzpostavljanje spoštljivega odnosa do narave. Velik poudarek projekta bo na sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in razvoju inovativnih pristopov za ohranitev biodiverzitete že v fazi načrtovanja in oblikovanja prostora. S projektom bomo krepili modro in zeleno infrastrukture v občinskem središču z uporabo novih zelenih tehnologij, materialov in na naravi temelječih rešitah ter s tem izboljšali kakovost urbanega okolja in bivanjske kakovosti ter tako prispevali k rasti odporne in trajnostno naravnane družbe. – Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest: 1 – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.615

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamik 2 meseca zaradi priprave vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	514.569,77	0,00	0,00 %
SLO	90.806,43	0,00	0,00 %
SKUPAJ	605.376,20 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
Projektna dokumentacija je izdelana. Oddaja vloge NPO do 28.2.2026 – generalni zamik 2 meseca. JR za izbor izvajalca se ponovi. Izvedba še vedno planirana v celoti v 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



 Dokončano  V izvajanju  Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Zaznana zamuda (+60 dni) – projekt je še v časovnici

Projekt 8: Ureditev zelenih površin v Veržeu



Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 504.994,60 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Predvideva se ureditev zelene infrastrukture. Gre za specifično investicijo, s katero si investitor prizadeva ohraniti čim več zelenih površin v občinskem središču. Uresničitev investicijske namere prispeva k ciljem evropske kohezijske politike RSO 2.7, zlasti k izboljšanju varstva narave, biotske raznovrstnosti ter zelene infrastrukture v mestnem okolju, obenem pa k zmanjšanju onesnaževanja. Realizacija projekta bo izboljšala kakovost življenja, povečala delež uporabnih zelenih površin za rekreacijo, druženje in počitek ter prispevala k nadaljnjemu razvoju občine Veržej in njenega središča. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,3 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 975

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	429.245,41	0,00	0,00 %
SLO	75.749,19	0,00	0,00 %
SKUPAJ	504.994,60 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026: Vloga NPO oddana 12.1.2026, z zamudo, ker PZI ni bil pravočasno izdelan. JR za izbor izvajalca predviden v marcu 2026, po sprejemu občinskega proračuna. Izvedba del predvidena od julija do oktobra 2026. Skupna vrednost investicije po oddani vlogi je predvidena višja, vrednost sofinanciranja ostane nespremenjena.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 9: Zelena preobrazba Šafarskega



Občina izvajanja projekta: Razkrižje
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.082.950,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Projekt je namenjen ozelenitvi naselja Šafarsko, ki je središče občine Razkrižje. Območje projekta zajema cca 16.995 kvadratnih metrov površin. Zelena preobrazba v projektu je urejena in predvidena tako, da bo po zaključku izvedbe projekta nastala trajnostna povezana enota. Poudarjamo, da so vse utrjene peš ali utrjene peš in kolesarske poti narejene iz naravnih materialov (v nadaljevanju utrjena peš ali peš in kolesarska pot), kjer bo to mogoče bomo te poti ozelenili s travo, saj sledimo sonaravnim načelom in pri vzpostavitvi nove zelene infrastrukture ne uporabljamo asfalta ali betona, vse poti želimo čim bolj ozeleniti. Že grajene objekte iz asfalta ali betona ozelenjujemo. Stara drevesa bomo pomladili, po potrebi odstarnili in zasadili nova, površine bomo ozelenili z grmovnicami. Namestili bomo novo urbano opremo, umestili javno razsvetljavo. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,7 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 261

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamik zaradi pridobivanja PZI in vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	920.507,50	0,00	0,00 %
SLO	162.442,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.082.950,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026: Oddaja vloge NPO 31.5.2026, PZI predvidoma izdelan do konca aprila 2026. JR za izbor izvajalca objavljen v juniju, izbran v septembru 2026. Črpanje sredstev predvideno v letu 2027, možno tudi črpanje sredstev že v letu 2026 - odvisno od časa podpisa pogodbe. Dinamiko črpanja se bo prilagodilo. Generalni zamik 2 meseca zaradi priprave PZI in vloge NPO.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (30.09.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Projekt 10: Nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni



Občina izvajanja projekta: Gornja Radgona
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 2.378.850,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer izgradnja fekalne kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici v naselju Gornja Radgona, izgradnja fekalne kanalizacije od naselja Lomanoše do naselja Podgrad ter navezava na kanalizacijski sistem v Gornji Radgoni in obstoječo komunalno čistilno napravo Gornja Radgona, nadgradnja obstoječe komunalne čistilne naprave Gornja Radgona in razširitev zadrževalnega bazena B4. Z investicijo se bodo zagotovile ustrežnejše razmere na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zgradilo se bo 1.882 metrov novega kanalizacijskega omrežja (na novo bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih 36 uporabnikov) ter z nadgradnjo obstoječe komunalne čistilne naprave povečala učinkovitost čiščenja odpadnih voda, da bo le-ta skladna z Direktivo Sveta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Ministrstva za okolje in prostor z dne 17. 9. 2020. Kazalniki: Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode 1,882 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode 13.200 PE Prebivalci, priključeni vsaj na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode 5.719

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.022.022,50	0,00	0,00 %
SLO	356.827,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.378.850,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: Vloga NPO bo oddana 30. 11. 2025. Razpis za izvajalca 1.1. 2026, pogodba z izvajalcem in začetek del 1. 6. 2026 (če bo do takrat pogodba o sofinanciranju), del projekta se že izvaja. Občina opozori na povečanje vrednsoti projekta, zaradi česar je stopnja sofinanciranja pod 60 %. MKRR in MNVP dorečeta obravnavno tovrstnih primerov (ali se zagotavljajo dodatna sredstva iz DRR), za vse mora veljati enak pristop.
- 30.01.2026:
Vloga NPO je bila oddana na MNVP 17.12.2025, čakajo povratne informacije o morebitnih dopolnitvah. Povečana skupna vrednost projekta iz 3,3 MIO EUR na 4,6 MIO EUR (56% upravičenih sredstev). Naj občina kontaktira MNVP - potrebna bo dopolnitev oz. dodatek k Dogovoru, saj gre za večjo spremembo.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah




Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (12.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Projekt 11: Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnega sistema Pomurje A)



Občina izvajanja projekta: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 3.081.516,23 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Občina bo s sredstvi DRR izgradila cca. 6.428 metrov novega vodovodnega omrežja, ki bo v celoti nadomestilo staro, že amortizirano omrežje, ki večkrat poka in povzroča vodne izgube. Namen investicije je vzpostaviti pogoje za kvalitetno dobavo pitne vode gospodinjiskim odjemalcem in gospodarstvu ter posledično odpraviti vodne izgube na dotrajanem in amortiziranem vodu, starem več kot 40 let, za obdobje najmanj 50 let. Namen projekta je tudi vzpostaviti učinkovit sistem (telemetrijo) za zajem in obdelavo podatkov na celotnem vodovodnem sistemu v Občini Lendava in Občinah, ki so partnerice projekta ter inovativne programske rešitve za potrebe informacij, potrebnih za učinkovito upravljanje s sistemom, ki oskrbuje več kot 21.978 prebivalcev. Slednje pomeni, da se bodo v zadnjih letih, zaradi amortiziranosti mnogih odsekov v sistemu, povečane vodne izgube znižale za več kot zahtevanih 20% glede na izračunan ILI faktor (za zadnje triletno povprečje). Kazalniki: – Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda 6,4 km – Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod 21.978

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.619.288,80	0,00	0,00 %
SLO	462.227,43	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.081.516,23 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
Vloga NPO oddana 22.12.2026. Sprememba vrednosti projekta iz 4,1 MIO EUR na 5,3 MIO EUR – ker gre za spremembo večjo od 20%, bo potrebno podpisati dodatek k Dogovoru. Gradbena dela se na terenu že zaključujejo, temu bo sledila telemetrija (postopek JR). Predviden zaključek projekta je 2028.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Zadnja potrjena naloga: M9 50% izvedbe
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (10.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 12: Rekonstrukcija vodovodov v Občini Ljutomer (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mota -Lukavci)



Občina izvajanja projekta: Ljutomer
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.162.256,83 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer ter rekonstrukcija vodovoda v Precetinih-2. faza. Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja bo zagotovljena nemotena oskrba z zdravo pitno vodo iz svojih vodnih virov na območju Precetinci-Kuršinci in Ljutomer-Cven, uredile se bodo tlačne razmere v omrežju, vodne izgube se bodo zmanjšale, motenj v oskrbi bo manj in zato bodo zmanjšani tudi vzdrževalni stroški. Cilji investicije: > izvesti rekonstrukcijo na cca. 7,167 km vodovodnega omrežja, > povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema; > zmanjšanje stroškov vzdrževanja vodooskrbnega sistema; > zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju; > izboljšanje kakovosti življenja; > zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih; > zmanjšati razvojno ogroženost; > povečanje števila prebivalcev v občini in regiji; > priseljevanje mladih družin; > preprečiti odseljevanje mladih. Kazalniki: – Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda 7,167 km – Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod 16.505

Povzetek financiranja:


Vir	Načrt	Real	% real.
EU	987.918,30	0,00	0,00 %
SLO	174.338,53	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.162.256,83 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026: Vloga NPO oddana 13.1.2026, JR za izbor izbor izvajalca objavljen februarja 2026, začetek del v maju 2026, zaključek v avgustu 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 13: Mrežni podjetniški inkubator POVEZOVALNIK



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice, Puconci, Turnišče

Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR

Višina sofinanciranja: 3.837.233,46 €

Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen naložbe je dvigniti konkurenčnost občin Turnišče, Puconci in Moravske Toplice z vzpostavitvijo spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. Kvantitativni cilji oz. rezultati projekta so: – 3 nove lokacije podjetniškega okolja; – čez 1.100,00 m2 novih neto površin podjetniškega inkubatorja – vsaj 800 m2 uporabnih površin inkubatorja – zasedenost uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta bo najmanj 70 % – 20 vključenih podjetij v inkubator od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 10 izvedenih projektov z gospodarstvom, od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 30 izvedenih usposabljanj oz. delavnic v okviru inkubatorja, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 5 novo vključenih podjetij, ki preživijo na trgu, v obdobju treh let od zaključka projekta

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	45
Obrazložitev:	Zamik zaradi priprave projektne dokumentacij in vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.261.648,44	0,00	0,00 %
SLO	575.585,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.837.233,46 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: GD pridobljena kot napovedano, urejana PZI za 2 občini (Turnišče, Moravske Toplice), za Puconce se čaka PZI (kulturnovarstveno soglasje), popolna dokumentcija nov rok 31. 12. 2025. NPO začetek 2026. Objekt v Turnišču se že gradi.
- 30.01.2026: Projekt za 3 občine. Vloga NPO bo oddana do 15.3.2026, projektna dokumentacija v pripravi (IP in investicijska zasnova). Generalni zamik projekta za mesec in pol. Objava JR za izbor izvajalca v marcu, izvedba predvidena v 2026 in 2027. Dinamika črpanja se bo predvidoma spremenila.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije

Odločitev o podpori

Izvajanje

Zaključek

 Dokončano  V izvajanju  Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Zaznana zamuda (+45 dni) – projekt je še v časovnici

Projekt 14: Zeleni sistem v Šalovcih – zelena vez Šalovec



Občina izvajanja projekta: Šalovci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 347.090,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta Zelena vez Šalovci je izboljšati kakovost življenja v naselju Šalovci s povezovanjem ključnih delov kraja z zeleno in modro infrastrukturo. Projekt vključuje urejanje dostopnih, senčenih, naravno zasajenih in funkcionalnih javnih površin za pešce, kolesarje, otroke in rekreativce. Zeleni sistem bo pomagal pri blaženju podnebnih sprememb, izboljšal bivalne pogoje ter spodbudil trajnostni turizem in rekreacijo. Projekt omogoča tudi zadrževanje deževnice za namakanje in ohlajanje kraja ter spodbuja biodiverzitetu z avtohtonimi rastlinami. S tem občina naslavlja okoljske, družbene in razvojne izzive podeželskega okolja. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 0.5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 201

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	60
Obrazložitev:	Zamik zaradi izpolnjevanja vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	295.026,50	0,00	0,00 %
SLO	52.063,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	347.090,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
Projektna dokumentacija je izdelana. JR za izbor izvajalca del objavljeno v januarju 2026, izbor izvajalec v marcu 2026. Izvedba del od marca do septembra 2026. Vloga NPO je v pripravi, oddati jo nameravajo v februarju 2026. Generalni zamik za 2 meseca. Izvedba in črpanje sredstev še vedno predvidena v celoti v 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga:

M2 Oddaja NPO na PT (28.11.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Projekt 15: Fekalna kanalizacija v naselju Kamenščak



Občina izvajanja projekta: ^{25%} Ljutomer
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 3.091.304,92 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Naselje Spodnji Kamenščak se nahaja v aglomeraciji 493-Ljutomer 2019 s skupno obremenitvijo enako ali večjo 2.000 PE. Fekalne vode se bodo čistile na obstoječi čistilni napravi Ljutomer, ki ni predmet vloge. Z izgradnjo fekalne kanalizacije bo aglomeracija v celoti opremljena z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekt zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 9.889 m, izgradnja 9 črpališč in ureditev 165 revizijskih jaškov za izvedbo hišnih priključkov, na katere se bo priključilo cca. 399 prebivalcev.

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	30
Obrazložitev:	Zamik zaradi izpolnjevanja vloge NPO in pridobivanja GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.627.609,18	0,00	0,00 %
SLO	463.695,74	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.091.304,92 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: Vloga bo oddana 31. 12. 2025. Zamik 2-3 mesece zaradi pridobivanja službnosti (ena fizična oseba), zadeva urejena, GD se pričakuje 30. 11. 2025. Izbor izvajalca po potrditvi proračuna, predvidoma 31. 3. 2026. Dinamika se ne spremeni.
- 30.01.2026: Vloga NPO bo oddana do 15.2.2026 - generalni zamik za 1 mesec. GD je bilo pridobljeno v januarju 2026, čakajo pravnomočnost. JR predvideno po sprejetju občinskega proračuna, izbran izvajalec predvidoma do konca marca 2026. Znižana je vrednost projekta in vrednost sofinanciranja, nova dinamika bo vnešena, ko bo izdana odločitev o podpori.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



 Dokončano  V izvajanju  Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (31.12.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Projekt 16: Podjetniški inkubator Lendava



Občina izvajanja projekta: Lendava
Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR
Višina sofinanciranja: 1.970.642,56 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Namen projekta je obnova propadajoče mestne hiše v mestnem jedru Lendave za vzpostavitev novih (uporabnih) površin inkubatorja. Cilji: vzpostavitev novih uporabnih površin inkubatorja, krepitev podjetniške kulture, razvoj podjetništva v regiji in izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva v regiji, zagon novih podjetij v regiji, ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij. Objekt v katerem bo vzpostavljen podjetniški inkubator, bo trajnostno obnovljen z lokalnimi materiali (opeka, les,...), na novo opremljen z neto površino 650 m2, od tega najmanj 60 % uporabnih površin, ki bodo namenjene podjetniškemu inkubatorju oz. uporabnikom. BRUTO TLORISNA OBJEKTA: 1.079 m², Neto uporabna površina bo 650 m², Kazalniki projekta so: – Število podprtih investicijskih projektov: 1 na novo vzpostavljen podjetniški inkubator; – Bruto tlorisna površina objekta je 1.079 m2, neto površina podjetniškega inkubatorja bo 650 m2, Priloga IZRIS PROSTOROV; -zasedenost uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta bo najmanj 70 % – 20 vključenih podjetij v inkubator od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 10 izvedenih projektov z gospodarstvom, od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 30 izvedenih usposabljanj oz. delavnic v okviru inkubatorja, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 5 novo vključenih podjetij, ki preživijo na trgu, v obdobju treh let od zaključka projekta

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.675.046,18	0,00	0,00 %
SLO	295.596,38	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.970.642,56 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: Poslan poziv PT (MKRR) za dopolnitev vloge NPO. Občina na poziv še ni odgovorila. Poziv, da se odzvi pripravi čim prej. Pogodba z izvajalcem je podpisana. Datum zaključka iizvajanja se zamakne za 3 mesece, 25. 12. 2026.
- 30.01.2026: Dopolnitev vloge NPO oddana 15.1.2026, pogodba z izvajalcem sklenjena, čakajo odločitev o podpori. Zaključek izvajanja in črpanja predviden v celoti v 2026.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M6 Pogodba z izvajalcem
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (30.09.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja

Projekt 17: Ureditev kolesarske poti Bratonci-Križevci



Občina izvajanja projekta: Beltinci, Križevci
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 1.892.080,33 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče kolesarke stezin sprememba potovalnih navad , opravljanja poti z avtomobilom preusmeriti na kolo,električno kolo ,peš hojo. Predvidena je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske poti (mestoma dvostranske) ob regionalni cesti R2-439/1302 Bratonci-Kiževci in R1-230/1415 Križevci v skupni dolžini 3280m.Predvidena je tudi ureditev priključka občinske ceste JP 724581 na R2-439/1302 v km 8+500,izgradnja premostitvenega objekta preko obstoječega jarka na R2-439/1302 vkm 8+812,ureditev avtobusne postaje na R2-439/1302 v km 9+295 ter ureditev javne razsvetljave v območju urejanja avtobusnih postajališč in prehodov za pešce. Kazalniki: nameska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo: 3,2 km; število potnikov, ki uporablja namensko kolesarsko infrastrukturo: 2.600.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.608.268,28	0,00	0,00 %
SLO	283.812,05	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.892.080,33 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026: Nosilec projekta je DRSI. Vloge NPO še niso oddali, ni še popolne projektne dokumentacije - odkupljena so vsa zemljišča razen 1, to pa je v postopku pridobivanja. Kontaktirati še DRSI za podatke o dejanskem stanju.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 18: Izgradnja KP Ključarovci – Ljutomer



Občina izvajanja projekta: Križevci, Ljutomer
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 3.578.543,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče kolesarske steze in sočasna rekonstrukcija ceste na relaciji Ljutomer – Ključarovci. Če odštejemo obstoječo dvosmerno kolesarsko stezo od km 2,62 do km 2,96 bo tako na novo zgrajeno 2.620m ločene dvosmerne kolesarske steze, 1.160m trase bo dograjene s pločnikom in na njem enosmerno kolesarsko stezo, ki bo s talno signalizacijo ločena od površin za pešce, ter 620m nove dvosmerne kolesarske steze, ki bo zgrajena na levi strani ceste na območju sedaj enosmerne kolesarske steze. Skupaj torej 4.400m novih kolesarskih stez. število potnikov, ki uporablja namensko kolesarsko infrastrukturo: 2.000.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.041.761,55	0,00	0,00 %
SLO	536.781,45	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.578.543,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026: Občina od novembra ni kontaktirala DRSI, treba preveriti stanje.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Status časovnice projekta:Projekt je v časovnici

Projekt 19: Pomurski center mobilnosti



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 263.250,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Predmet projekta je vzpostavitev in delovanje Pomurskega centra mobilnosti (v nadaljevanju PCM)

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	223.762,50	0,00	0,00 %
SLO	39.487,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	263.250,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: Vloga NPO oddana, MOPE čaka soglasje MF. Sprememba dinamike črpanja (prenos iz 2025).
- 29.01.2026: št. vloge: V00359-1/1
- 30.01.2026: Projekt poteka v skladu s predvidenim terminskim planom.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M6 Pogodba z izvajalcem
Naslednja naloga: M5 Pogodba o sofinanciranju (11.02.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Projekt 20: Regijska celostna prometna strategija za Pomurje



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS 30%
Višina sofinanciranja: 80.000,00 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Odločitev

Kratek opis projekta:

Vsebina projekta je priprava Regionalne celostne prometne strategije za Pomurje. Gre za strateški dokument, ki določa usmeritve za prihodnji razvoj prometa v regiji in ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 17.11.2025: Vloga NPO 14. 11. 2025. Sprememba dinamike črpanja, zamik iz 2025.
- 30.01.2026: JR za izbor izvajalca zaključen, pogodba bo podpisana 2.2.2026. Prejeli zahtevek za dopolnitev vloge NPO, dopolnitev bo oddana v prihodnjih dneh.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (14.11.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Projekt 21: Zelena oaza ob starem mestnem jedru Lendave



Občina izvajanja projekta: Lendava
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 393.930,26 €
Realizacija črpanja: 0,00 €

Priprava

Kratek opis projekta:

Namen investicije je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v urbanih naseljih ter njihovo povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t. i. zelenih in modrih koridorjev, z vzpostavitvijo dveh območij parka z ribnikom in parka sadnih dreves. Glavni cilj investicije je gradnja zelenih površin z vzpostavitvijo dveh območij, parka z ribnikom in parka sadnih dreves. Zagotovljena bo kvalitetna ponudba površin za nemoteno izvajanje gibalnih spretnosti mlajših, dodatna možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine in ostalih občanov. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 0.52 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 2814

Zamuda pri projektu	
Datum:	30.01.2026
Zamuda (dni):	30
Obrazložitev:	Zamik zaradi pridobivanja GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	334.840,73	0,00	0,00 %
SLO	59.089,53	0,00	0,00 %
SKUPAJ	393.930,26 €	0,00 €	0,00 %

Kratek povzetek:

- 30.01.2026:
GD bo pridobljeno do 31.1.2026, predvidena oddaja NPO 15.2.2026. JR za izbor izvajalca bo objavljen v februarju, izbran bo v aprilu 2026. Izvedba del od maja 2026 do septembra 2027. Črpanje predvideno v 2026 in 2027.

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Naslednja naloga:

M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja

Projekt 22: Podjetno nad izzive v Pomurski regiji – PONI Pomurje



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Realizacija črpanja: 685.692,00 €

Izvedba

Kratek opis projekta:

Usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Zaposlitev oseb za 4 mesece. Vsebinska podpora s strani notranjih, zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.307.531,20	582.838,20	44,58 %
SLO	230.740,80	102.853,80	44,58 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	685.692,00 €	44,58 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena
Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (08.09.2026)

Status časovnice projekta:


Projekt je v časovnici

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Sofinanciranje

Leto	Plan EU	Plan SLO	Plan EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	259.039,20	45.712,80	304.752,00	228.201,20	40.270,80	268.472,00	88,1 %
2025	292.961,00	51.699,00	344.660,00	354.637,00	62.583,00	417.220,00	121,1 %
2026	329.966,60	58.229,40	388.196,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	289.877,20	51.154,80	341.032,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	135.687,20	23.944,80	159.632,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.307.531,20	230.740,80	1.538.272,00	582.838,20	102.853,80	685.692,00	44,6 %

Dinamika črpanja po letih (EU+SLO)

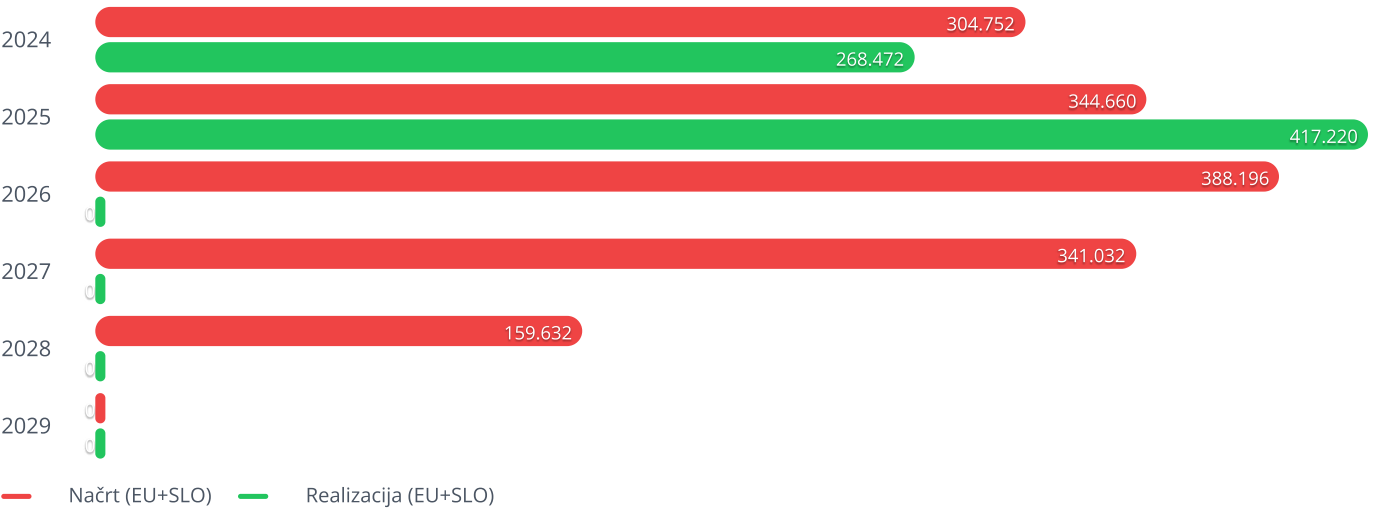


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RC004	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RC005	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	0%

Poročilo je pripravil: Ana Stružnik

Datum in čas priprave: 06.02.2026 13:23

Dodatne opombe:

Ni opomb.

Uredi opombe

Skrbnik regije

Odgovorna oseba
