




DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Poročilo o projektih – Razvojna regija Pomurska

Število projektov v dogovoru:	23
Število projektov v izvajanju (omogočeno črpanje):	4
Višina dodeljenih sredstev:	40.410.926,30 EUR
Višina koriščenja sredstev – realizacija:	925.140,00 EUR

Črpanje (real/plan):

2%



Projekti zelo zamujajo

22% v časovnici

Kako brati poročilo

Poročilo prikazuje trenutno stanje projektov, fazo izvedbe, finančne podatke, kazalnike in napovedi na podlagi podatkov, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov.

Pomen faz projekta

Faza	Pomen
Priprava dokumentacije	Priprava investicijske in projektne dokumentacije ter oddaja vloge.
Odločitev	Projekt je v obravnavi pri posredniškem telesu, organu upravljanja ali v pripravi pogodbe.
Izvajanje	Pogodba o sofinanciranju je podpisana in projekt se izvaja.
Zaključek	Projekt je izvedbeno oziroma finančno zaključen.

Pomen barv

- Upravičenec / priprava dokumentacije
- PT obravnava
- OU odločanje
- PT pogodba
- Izvajanje
- Zaključeno

Napovedi in finančni podatki

Predvideni datumi prehodov med fazami in napovedi koriščenja sredstev so analitične ocene, pripravljene na podlagi evidentiranih podatkov o projektih, pogodbeni dinamiki, realizaciji in napredovanju projektov.

Kazalo projektov

1. Podjetniški inkubator Lendava — Lendava · RSO1.3 - INKUBATOR
2. Mrežni podjetniški inkubator POVEZOVALNIK — Moravske Toplice, Puconci, Turnišče · RSO1.3 - INKUBATOR
3. Tehnološko kompetenčni park Soboško jezero — Murska Sobota · RSO1.3 - INKUBATOR
4. Podjetno nad izzive v Pomurski regiji – PONI Pomurje — RSO1.3 - PONI
5. Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnegasistema Pomurje A) — Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana · RSO2.5 - VODOVODI
6. Rekonstrukcija vodovodov v Občini Ljutomer (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mota - Lukavci) — Ljutomer · RSO2.5 - VODOVODI
7. Nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni — Gornja Radgona · RSO2.5 - OČOV
8. Fekalna kanalizacija v naselju Kamenščak — Ljutomer · RSO2.5 - OČOV
9. Ureditev zelenih površin v Veržaju — RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
10. Revitalizacija grajskega parka Beltinci — Beltinci · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
11. Zeleno – Modra povezovalna os naselja Dobrovnik — Dobrovnik · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
12. Ozelenitev mesta Gornja Radgona — Gornja Radgona · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
13. Zelena oaza ob starem mestnem jedru Lendave — Lendava · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
14. Središče Moravskih Toplic – zeleni sistem — Moravske Toplice · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
15. Zeleno srce Radencev — Radenci · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
16. Zelena preobrazba Šafarskega — Razkrižje · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
17. Zeleni sistem v Šalovcih – zelena vez Šalovec — Šalovci · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
18. Učni užitni park Turnišče — Turnišče · RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

19. **Ureditev kolesarske poti Bratonci-Križevci** — Beltinci, Križevci · RSO3.2 - KOLESARKE
20. **Izgradnja KP Ključarovci – Ljutomer** — Križevci, Ljutomer · RSO3.2 - KOLESARKE
21. **Državna kolesarska povezava Bogojina – Gančani (G17)** — Moravske Toplice · RSO3.2 - KOLESARKE
22. **Pomurski center mobilnosti** — RSO3.2 - RCM - RCPS
23. **Regijska celostna prometna strategija za Pomurje** — RSO3.2 - RCM - RCPS

Kratek povzetek projektov

Trenutne faze projektov



Pregled po specifičnih ciljih

Št.	Specifični cilj	Št. pr.	Načrt	Real	% real.
1.	RSO1.3 - INKUBATOR	3	11.689.163,02	0,00	0,00 %
2.	RSO1.3 - PONI	1	1.538.272,00	925.140,00	60,14 %
3.	RSO2.5 - OČOV	2	5.470.154,92	0,00	0,00 %
4.	RSO2.5 - VODOVODI	2	4.243.773,06	0,00	0,00 %
5.	RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA	10	8.519.702,84	0,00	0,00 %
6.	RSO3.2 - KOLESARKE	3	8.606.610,46	0,00	0,00 %
7.	RSO3.2 - RCM - RCPS	2	343.250,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ		23	40.410.926,30	925.140,00	2,29 %

Pregled projektov po upravičencih

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
DRSI	2	5.470.623,33	0,00
Mestna občina Murska Sobota	1	5.881.287,00	0,00
Občina Beltinci	1	837.176,41	0,00
Občina Dobrovnik	1	1.049.427,13	0,00
Občina Gornja Radgona	2	3.718.156,24	0,00
Občina Lendava	2	2.364.572,82	0,00
Občina Lendava	1	3.081.516,23	0,00
Občina Črenšovci			
Občina Odranci			
Občina Turnišče			
Občina Dobrovnik			
Občina Velika Polana			
Občina Kobilje			

Upravičenec	Št. projektov	NAČRT (EU+SLO)	REAL (EU+SLO)
Občina Ljutomer	2	4.253.561,75	0,00
Občina Moravske Toplice	2	3.950.439,13	0,00
Občina Radenci	1	1.545.000,00	0,00
Občina Razkrižje	1	1.082.950,00	0,00
Občina Turnišče	2	4.442.609,66	0,00
Občina Veržej	1	504.994,60	0,00
Občina Šalovci	1	347.090,00	0,00
Razvojni center Murska Sobot	1	1.538.272,00	925.140,00
Zavod za turizem razvoj Lendava	2	343.250,00	0,00
SKUPAJ	23	40.410.926,30	925.140,00

Načrt in realizacija koriščenja sredstev

Leto	Dinamika EU	Dinamika SLO	Dinamika EU+SLO	Realizacija EU	Realizacija SLO	Realizacija EU+SLO	% realizacije
2024	259.039,20	45.712,80	304.752,00	228.201,20	40.270,80	268.472,00	88,1 %
2025	292.961,00	51.699,00	344.660,00	354.637,00	62.583,00	417.220,00	121,1 %
2026	15.328.402,10	2.705.012,12	18.033.414,22	203.530,80	35.917,20	239.448,00	1,3 %
2027	13.474.333,25	2.377.823,52	15.852.156,77	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	3.822.790,27	674.610,04	4.497.400,31	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	1.171.761,55	206.781,45	1.378.543,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	34.349.287,37	6.061.638,93	40.410.926,30	786.369,00	138.771,00	925.140,00	2,3 %


Kazalniki

Kazalniki

Vključeni projekti 23

Projekti z vnesenimi kazalniki 21 / 23

Skupni napredek kazalnikov




RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež dos
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	93	—	
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	53	—	

Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež dos
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	37	—	


RSO25



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (s
RCO30	Dolžina novih ali nadgrajenih cevi vodovoda	km	—	14
RCO31	Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode	km	—	12
RCO32	Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode	PE	9	1320
RCR41	Prebivalci na izboljšanem javnem vodovodu	osebe	—	3848
RCR42	Prebivalci, priključeni na javno omrežje za čiščenje odpadne vode	osebe	—	6118




RSO27



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Do
INNOV	Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest	število	—	1	
RCO36	Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo	ha	9	40	
RCR95	Prebivalci z dostopom do nove ali izboljšane zelene infrastrukture	osebe	—	14297	




RSO32



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029
RCO58	Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo	km	0	1
RCRXX	Število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo	uporabniki	—	76



Projekt 1: Podjetniški inkubator Lendava



Občina izvajanja projekta: Lendava
Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR
Višina sofinanciranja: 1.970.642,56 €
Real črpanja: 0,00 €



Kratek opis projekta:

Namen projekta je obnova propadajoče mestne hiše v mestnem jedru Lendave za vzpostavitev novih (uporabnih) površin inkubatorja. Cilji: vzpostavitev novih uporabnih površin inkubatorja, krepitev podjetniške kulture, razvoj podjetništva v regiji in izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva v regiji, zagon novih podjetij v regiji, ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij. Objekt v katerem bo vzpostavljen podjetniški inkubator, bo trajnostno obnovljen z lokalnimi materiali (opeka, les,...), na novo opremljen z neto površino 650 m2, od tega najmanj 60 % uporabnih površin, ki bodo namenjene podjetniškemu inkubatorju oz. uporabnikom. BRUTO TLORISNA OBJEKTA: 1.079 m², Neto uporabna površina bo 650 m², Kazalniki projekta so: – Število podprtih investicijskih projektov: 1 na novo vzpostavljen podjetniški inkubator; – Bruto tlorisna površina objekta je 1.079 m2, neto površina podjetniškega inkubatorja bo 650 m2, Priloga IZRIS PROSTOROV; - zasedenost uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta bo najmanj 70 % – 20 vključenih podjetij v inkubator od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 10 izvedenih projektov z gospodarstvom, od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 30 izvedenih usposabljanj oz. delavnic v okviru inkubatorja, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 5 novo vključenih podjetij, ki preživijo na trgu, v obdobju treh let od zaključka projekta

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.675.046,18	0,00	0,00 %
SLO	295.596,38	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.970.642,56 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek (31.03.2026)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta


Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	28.12.2026	11.09.2027

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	1.675.046,18	295.596,38	1.970.642,56	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.675.046,18	295.596,38	1.970.642,56	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

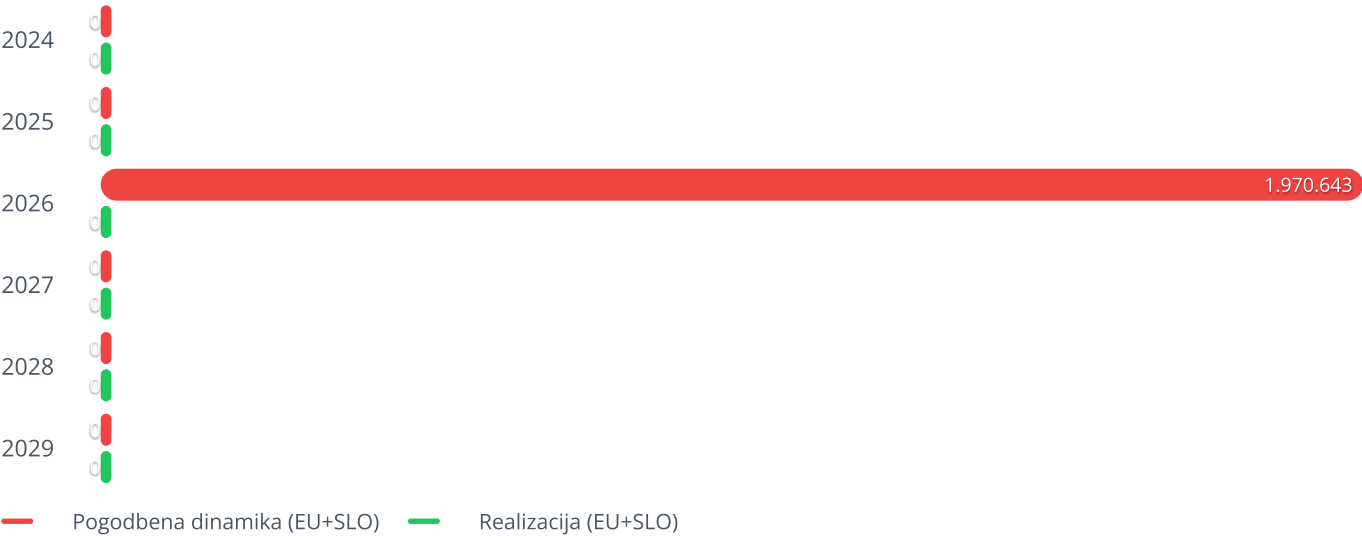


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13




Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	20	—	0%
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	5	—	0%

Poročilo je pripravil: Metka Farič

Datum in čas priprave: 14.09.2026 14:27

Projekt 2: Mrežni podjetniški inkubator POVEZOVALNIK



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice, Puconci, Turnišče

Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR

Višina sofinanciranja: 3.837.233,46 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

60 dni

Kratek opis projekta:

Namen naložbe je dvigniti konkurenčnost občin Turnišče, Puconci in Moravske Toplice z vzpostavitvijo spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. Kvantitativni cilji oz. rezultati projekta so: – 3 nove lokacije podjetniškega okolja; – čez 1.100,00 m2 novih neto površin podjetniškega inkubatorja – vsaj 800 m2 uporabnih površin inkubatorja – zasedenost uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta bo najmanj 70 % – 20 vključenih podjetij v inkubator od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 10 izvedenih projektov z gospodarstvom, od tega 5 na prednostnih področjih S5, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 30 izvedenih usposabljanj oz. delavnic v okviru inkubatorja, v obdobju treh let od zaključka projekta; – 5 novo vključenih podjetij, ki preživijo na trgu, v obdobju treh let od zaključka projekta

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	45	Zamik zaradi priprave projektne dokumentacij in vloge NPO.
06.05.2026	60	PIZ in IP bosta potrjena v mesecu maju.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.261.648,44	0,00	0,00 %
SLO	575.585,02	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.837.233,46 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (30.01.2026)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +105 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	27.02.2026	12.06.2026	30.03.2027
Odločitev o podpori	31.03.2026	14.07.2026	13.04.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.04.2026	13.08.2026	27.04.2027
Zaključek projekta	30.09.2027	13.01.2028	26.09.2028

Projekt 3: Tehnološko kompetenčni park Soboško jezero



Občina izvajanja projekta: Murska Sobota^{35%}
Specifični cilj: RSO1.3 - INKUBATOR
Višina sofinanciranja: 5.881.287,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
469 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je izgradnja novih prostorskih kapacitet in nakup opreme za delovanje podjetniškega inkubatorja in krepitev podpornega podjetniškega ekosistema v Pomurju in mestni občini Murska Sobota. Podjetniški inkubator bo nudil podporno okolje za nastanek, rast in razvoj novih podjetij (inkubirancev) v mestni občini in pomurski regiji z zagotavljanjem prostorov za delovanje podjetij (pisarne, skupni prostori, coworking, ipd.) in nudenje podpornih storitev. Namen novozgrajene infrastrukture je zagotovi odporni program s poudarkom na vzpodbujanju tehnoloških in visokotehnoloških podjetij, v podporo katerim se bo omogočilo tudi raziskovalno razvojno in laboratorijsko okolje na potencialnih S5 področjih na katerih je regija izpostavila svoje razvojne potenciale (krožno gospodarstvo, IKT tehnologije, hrana, zdravje – medicina, okolje, tovarne prihodnosti, novi materiali, ipd). Hkrati bo inkubator predstavljal stičišče sodelovanja med podjetji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami s prenosom znanja. Inkubator bo tako zagotavljal nove poslovne priložnosti in možnost za ustvarjanje novih kakovostnih in tudi visoko-tehnoloških delovnih mest.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
22.07.2026	60	Zamik oddaje vloge na december.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	4.999.093,95	0,00	0,00 %
SLO	882.193,05	0,00	0,00 %
SKUPAJ	5.881.287,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/PZI (30.10.2026)

Status časovnice projekta: Zaznana zamuda (+60 dni) – projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.10.2026	29.12.2026	29.12.2026

Projekt 4: Podjetno nad izzive v Pomurski regiji – PONI Pomurje



Specifični cilj: RSO1.3 - PONI
Višina sofinanciranja: 1.538.272,00 €
Real črpanja: 925.140,00 €

IZVEDBA
846 dni

Kratek opis projekta:

Usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Zaposlitev oseb za 4 mesece. Vsebinska podpora s strani notranjih, zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.307.531,20	786.369,00	60,14 %
SLO	230.740,80	138.771,00	60,14 %
SKUPAJ	1.538.272,00 €	925.140,00 €	60,14 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M2 Zaključena
Naslednja naloga: M9 50% izvedbe (08.09.2026)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja


Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	15.11.2028	16.03.2031

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	259.039,20	45.712,80	304.752,00	228.201,20	40.270,80	268.472,00	88,1 %
2025	292.961,00	51.699,00	344.660,00	354.637,00	62.583,00	417.220,00	121,1 %
2026	329.966,60	58.229,40	388.196,00	203.530,80	35.917,20	239.448,00	61,7 %
2027	289.877,20	51.154,80	341.032,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	135.687,20	23.944,80	159.632,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	1.307.531,20	230.740,80	1.538.272,00	786.369,00	138.771,00	925.140,00	60,1 %

Načrt in realizacija po letih

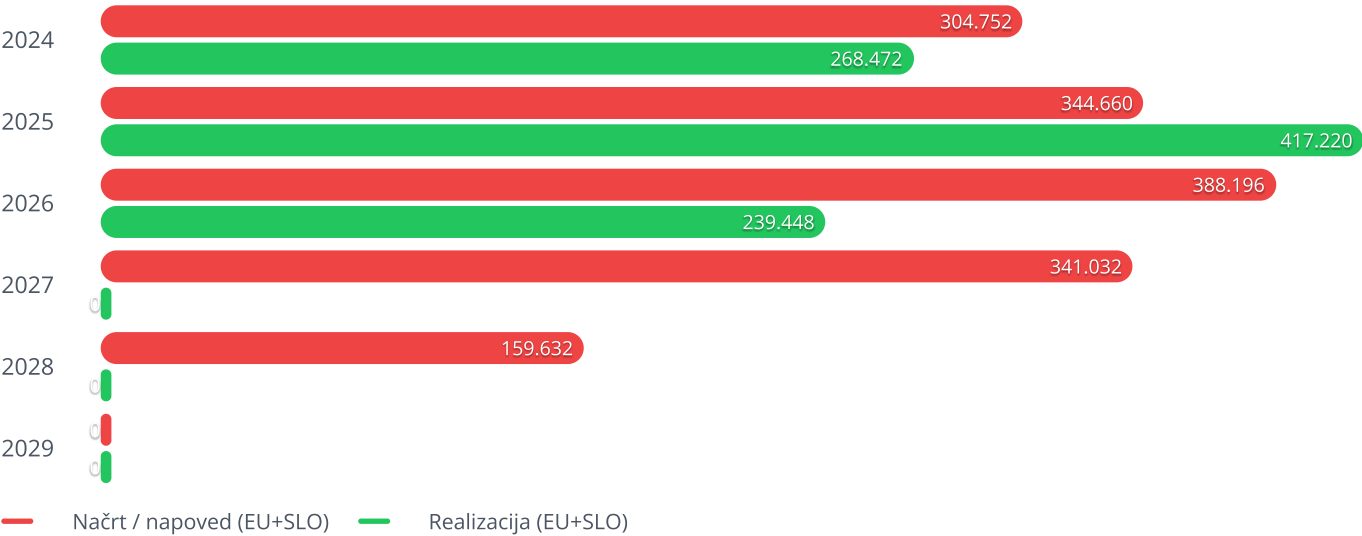


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta


Vključeni projekti 1

Projekti z vnesenimi kazalniki 1 / 1

Skupni napredek kazalnikov



RSO13



Koda	Kazalnik	Enota	Mejnik 2024 (skupaj)	Cilj 2029 (skupaj)	Doseženo (skupaj)	Delež doseženega cilja
RCO04	Podjetja z nefinančno podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCO05	Nova podjetja, ki so prejela podporo	podjetja	—	32	—	0%
RCR17	Nova podjetja, ki preživijo na trgu	podjetja	—	21	—	0%

Poročilo je pripravil: Metka Farič

Datum in čas priprave: 14.09.2026 14:27

Projekt 5: Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« (predlog naziva: Nadgradnja vodovodnegasistema Pomurje A)



Občina izvajanja projekta: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana

Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI

Višina sofinanciranja: 3.081.516,23 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

265 dni

Kratek opis projekta:

Občina bo s sredstvi DRR izgradila cca. 6.428 metrov novega vodovodnega omrežja, ki bo v celoti nadomestilo staro, že amortizirano omrežje, ki večkrat poka in povzroča vodne izgube. Namen investicije je vzpostaviti pogoje za kvalitetno dobavo pitne vode gospodinjskim odjemalcem in gospodarstvu ter posledično odpraviti vodne izgube na dotrajanem in amortiziranem vodu, starem več kot 40 let, za obdobje najmanj 50 let. Namen projekta je tudi vzpostaviti učinkovit sistem (telemetrijo) za zajem in obdelavo podatkov na celotnem vodovodnem sistemu v Občini Lendava in Občinah, ki so partnerice projekta ter inovativne programske rešitve za potrebe informacij, potrebnih za učinkovito upravljanje s sistemom, ki oskrbuje več kot 21.978 prebivalcev. Slednje pomeni, da se bodo v zadnjih letih, zaradi amortiziranosti mnogih odsekov v sistemu, povečane vodne izgube znižale za več kot zahtevanih 20% glede na izračunan ILI faktor (za zadnje triletno povprečje). Kazalniki: – Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda 6,4 km – Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod 21.978

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.619.288,80	0,00	0,00 %
SLO	462.227,43	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.081.516,23 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (10.12.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	12.01.2026	27.10.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	12.02.2026	12.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	12.03.2026	10.12.2026
Zaključek projekta	29.12.2028	28.09.2029

Projekt 6: Rekonstrukcija vodovodov v Občini Ljutomer (predlog naziva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mota -Lukavci)



Občina izvajanja projekta: Ljutomer
Specifični cilj: RSO2.5 - VODOVODI
Višina sofinanciranja: 1.162.256,83 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
244 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer ter rekonstrukcija vodovoda v Precetinih-2. faza. Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja bo zagotovljena nemotena oskrba z zdravo pitno vodo iz svojih vodnih virov na območju Precetinci-Kuršinci in Ljutomer-Cven, uredile se bodo tlačne razmere v omrežju, vodne izgube se bodo zmanjšale, motenj v oskrbi bo manj in zato bodo zmanjšani tudi vzdrževalni stroški. Cilji investicije: > izvesti rekonstrukcijo na cca. 7,167 km vodovodnega omrežja, > povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema; > zmanjšanje stroškov vzdrževanja vodooskrbnega sistema; > zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju; > izboljšanje kakovosti življenja; > zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih; > zmanjšati razvojno ogroženost; > povečanje števila prebivalcev v občini in regiji; > priseljevanje mladih družin; > preprečiti odseljevanje mladih. Kazalniki: – Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda 7,167 km – Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod 16.505

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	987.918,30	0,00	0,00 %
SLO	174.338,53	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.162.256,83 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	27.10.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	27.02.2026	10.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	08.12.2026
Zaključek projekta	30.08.2027	08.05.2028

Projekt 7: Nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni



Občina izvajanja projekta: Gornja Radgona
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 2.378.850,00 €
Real črpanja: 0,00 €

74%

ODLOČITEV

PT obravnava

271 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer izgradnja fekalne kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici v naselju Gornja Radgona, izgradnja fekalne kanalizacije od naselja Lomanoše do naselja Podgrad ter navezava na kanalizacijski sistem v Gornji Radgoni in obstoječo komunalno čistilno napravo Gornja Radgona, nadgradnja obstoječe komunalne čistilne naprave Gornja Radgona in razširitev zadrževalnega bazena B4. Z investicijo se bodo zagotovile ustrežnejše razmere na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zgradilo se bo 1.882 metrov novega kanalizacijskega omrežja (na novo bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih 36 uporabnikov) ter z nadgradnjo obstoječe komunalne čistilne naprave povečala učinkovitost čiščenja odpadnih voda, da bo le-ta skladna z Direktivo Sveta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Ministrstva za okolje in prostor z dne 17. 9. 2020. Kazalniki: Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode 1,882 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode 13.200 PE Prebivalci, priključeni vsaj na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode 5.719

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.022.022,50	0,00	0,00 %
SLO	356.827,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	2.378.850,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (12.12.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	19.10.2026
Odločitev o podpori	30.01.2026	02.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	25.11.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	27.09.2028

Projekt 8: Fekalna kanalizacija v naselju Kamenščak



Občina izvajanja projekta: Ljutomer
Specifični cilj: RSO2.5 - OČOV
Višina sofinanciranja: 3.091.304,92 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
208 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Naselje Spodnji Kamenščak se nahaja v aglomeraciji 493-Ljutomer 2019 s skupno obremenitvijo enako ali večjo 2.000 PE. Fekalne vode se bodo čistile na obstoječi čistilni napravi Ljutomer, ki ni predmet vloge. Z izgradnjo fekalne kanalizacije bo aglomeracija v celoti opremljena z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekt zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 9.889 m, izgradnja 9 črpališč in ureditev 165 revizijskih jaškov za izvedbo hišnih priključkov, na katere se bo priključilo cca. 399 prebivalcev.

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	30	Zamik zaradi izpolnjevanja vloge NPO in pridobivanja GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.627.609,18	0,00	0,00 %
SLO	463.695,74	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.091.304,92 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano

V izvajanju

Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (31.12.2025)

Status časovnice projekta:Projekt zamuja (30 dni + 227 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +30 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	01.03.2026	02.12.2026
Odločitev o podpori	27.02.2026	29.03.2026	16.12.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	30.04.2026	30.12.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	30.01.2028	30.09.2028

Projekt 9: Ureditev zelenih površin v Veržaju



Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 504.994,60 €
Real črpanja: 0,00 €

87%

ODLOČITEV
PT obravnava
245 dni

Kratek opis projekta:

Predvideva se ureditev zelene infrastrukture. Gre za specifično investicijo, s katero si investitor prizadeva ohraniti čim več zelenih površin v občinskem središču. Uresničitev investicijske namere prispeva k ciljem evropske kohezijske politike RSO 2.7, zlasti k izboljšanju varstva narave, biotske raznovrstnosti ter zelene infrastrukture v mestnem okolju, obenem pa k zmanjšanju onesnaževanja. Realizacija projekta bo izboljšala kakovost življenja, povečala delež uporabnih zelenih površin za rekreacijo, druženje in počitek ter prispevala k nadaljnjemu razvoju občine Veržej in njenega središča. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,3 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 975

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	429.245,41	0,00	0,00 %
SLO	75.749,19	0,00	0,00 %
SKUPAJ	504.994,60 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	28.11.2026
Odločitev o podpori	30.01.2026	12.12.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	26.12.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	31.12.2026	29.10.2027

Projekt 10: Revitalizacija grajskega parka Beltinci



Občina izvajanja projekta: Beltinci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 837.176,41 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
49 dni

Kratek opis projekta:

Občina Beltinci bo revitalizirala obstoječi javno dostopni grajski park Beltinci, ki je lociran v samem središču trškega naselja Beltinci. Izboljšali bomo zeleno in modro infrastrukturo, ki bo postala povezovalni element dvorca Beltinci, športno-rekreacijskih površin, upravnih objektov, cerkve in naselja Beltinci, na naravi temelječih rešitev. S prostorsko povezljivostjo in prepletenostjo različnih programov in vsebin, postane park bolj dostopen, povezljiv in privlačen za prebivalce in druge obiskovalce iz regije ter širše. Poleg tega bomo vzpostavili primer dobre prakse prepleta kulturne dediščine, zelene in modre infrastrukture v smislu biotske raznovrstnosti in pestrosti, športa/rekreacije ter zelenih koridorskih povezav z naseljem in kulturno krajino. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 11,3 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.274

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	30	Zamik zaradi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z ZVKD.
07.05.2026	90	Manjkala soglasje ZVKD. Prvo mnenje je bilo negativno.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	711.599,95	0,00	0,00 %
SLO	125.576,46	0,00	0,00 %
SKUPAJ	837.176,41 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju


Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (120 dni + 137 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	27.02.2026	27.06.2026	10.04.2027
Odločitev o podpori	31.03.2026	29.07.2026	24.04.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.04.2026	28.08.2026	08.05.2027
Zaključek projekta	31.07.2026	28.11.2026	08.08.2027

Projekt 11: Zeleno – Modra povezovalna os naselja Dobrovnik



Občina izvajanja projekta: Dobrovnik
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.049.427,13 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV
PT obravnava
77 dni

Kratek opis projekta:

Predmet investicije je celostna ureditev javnih površin z namenom povezovanja javnih površin znotraj centra občine Dobrovnik. Cilj projekta je ustvariti ustrezno povezavo (zelena pešpot in/ali zasaditev). Povezava je smiselno krožno speljana med posameznimi javnimi površinami, med katerimi so manjši parki in površine za rekreacijo oz. šole in vrtca, občinskega središča in ostalimi površinami ki so namenjene preživljanju prostega časa in sproščanja. Cilji projekta: – Vzpostavitev povezave med zelenimi in drugimi javnimi površinami z utrjeno pešpotjo – Ureditev novih in obstoječih javnih površin z zasaditvami, zatravitvami, drevoredi, ipd – Rekonstrukcija obstoječih brvi čez Bukovniški potok (3x), – Izvedba varčne razsvetljave ob pešpoteh. – Urbana oprema, – Informacijske table. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 6,5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 321

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	120	Zamuda s pripravo projektne dokumentacije.
07.05.2026	30	Zaradi priprave PZI se zadeva zamakne za mesec dni.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	892.013,07	0,00	0,00 %
SLO	157.414,06	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.049.427,13 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ (31.12.2025)

Status časovnice projekta: Projekt zamuja (150 dni + 107 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +150 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	02.03.2026	30.07.2026	10.03.2027
Odločitev o podpori	02.04.2026	30.08.2026	24.03.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	04.05.2026	01.10.2026	07.04.2027
Zaključek projekta	31.12.2027	29.05.2028	03.12.2028

Projekt 12: Ozelenitev mesta Gornja Radgona



Občina izvajanja projekta: Gornja Radgona
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.339.306,24 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

326 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin ter njihovo povezovanje, za zagotavljanje t.i. zelenih koridorjev v mestu. S projektom želimo zagotoviti in izboljšati zeleno infrastrukturo v mestu, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev ter izboljšati dostop prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih. Prav tako želimo v luči podnebnih sprememb zagotoviti ustrezno kvaliteto življenja občanov in osenčiti dele mesta, kjer se občani največ gibajo. kazalnik: Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 17 ha Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture, 3.302

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.138.410,30	0,00	0,00 %
SLO	200.895,94	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.339.306,24 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (21.10.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	21.11.2025	16.10.2026
Odločitev o podpori	22.12.2025	10.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	21.01.2026	10.12.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	30.06.2027	18.05.2028

Projekt 13: Zelena oaza ob starem mestnem jedru Lendave



Občina izvajanja projekta: Lendava
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 393.930,26 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

88 dni

Kratek opis projekta:

Namen investicije je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v urbanih naseljih ter njihovo povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t. i. zelenih in modrih koridorjev, z vzpostavitvijo dveh območij parka z ribnikom in parka sadnih dreves. Glavni cilj investicije je gradnja zelenih površin z vzpostavitvijo dveh območij, parka z ribnikom in parka sadnih dreves. Zagotovljena bo kvalitetna ponudba površin za nemoteno izvajanje gibalnih spretnosti mlajših, dodatna možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine in ostalih občanov. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 0.52 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 2814

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	30	Zamik zaradi pridobivanja GD.
07.05.2026	90	Zamik je nastal zaradi priprave projektne dokumentacije.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	334.840,73	0,00	0,00 %
SLO	59.089,53	0,00	0,00 %
SKUPAJ	393.930,26 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (12.01.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (120 dni + 125 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +120 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	28.11.2025	28.03.2026	21.03.2027
Odločitev o podpori	12.03.2026	10.07.2026	04.04.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	10.04.2026	08.08.2026	18.04.2027
Zaključek projekta	31.12.2026	30.04.2027	08.01.2028


Projekt 14: Središče Moravskih Toplic – zeleni sistem

12%

NAPREDEK

29. avgusta, 2025

3. marca, 2028



Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice 41%

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 814.452,00 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

159 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je posamezne po prostorskih značilnostih in vsebini različne zelene površine povezati v za Moravske Toplice prepoznavno prostorsko in tudi pomensko celoto ter s tem prispevati k zmanjšanju in blaženju podnebnih sprememb v kraju, zdravju in družbenemu življenju ter dobrobiti prebivalcev in s tem obiskovalcev in turistov, omogočiti dostopnost za vse, izboljšati estetiko kraja ter prispevati k privlačnosti kraja ter zelenemu razvoju turizma v destinaciji. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 10 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.026

Uradne zamude pri projektu

Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	45	Zamik zaradi čakanja na pridobitev GD.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	692.284,20	0,00	0,00 %
SLO	122.167,80	0,00	0,00 %
SKUPAJ	814.452,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (15.01.2026)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (45 dni + 197 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +45 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	16.02.2026	02.04.2026	05.01.2027
Odločitev o podpori	16.03.2026	30.04.2026	19.01.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	16.04.2026	31.05.2026	02.02.2027
Zaključek projekta	30.11.2027	14.01.2028	17.09.2028

Projekt 15: Zeleno srce Radencev



Občina izvajanja projekta: Radenci
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 1.545.000,00 €
Real črpanja: 0,00 €

81%

ODLOČITEV

PT obravnava

290 dni

Kratek opis projekta:

Izboljšanje kakovosti in uporabnosti degradirane zelene površine ter vzpostavitev novih javnih zelenih površin v radenskem parku. Na območju cca 15.000 kvadratnih metrov površin, ki so v celoti del kulturnega spomenika lokalnega značaja in pod kontrolo ZVKD, bomo zgradili nova javna igrišča za otroke na parcelah št. 660/4 in zeleni poseg bo na parcelah 663/1, 661/2, 660/5, 661/19, 660/4, 661/21, 661/3, 660/3 in 661/16 vse k.o. Radenci, v skladu s konservatorskim in z arburističnim načrtom bomo odstranili stara drevesa in zasadili nova drevesa na celotni površini obravnave in površine ozelenili z grmovnicami in travo, umaknili asfaltne in betonske površine na delu parcele 661/19 in jih ozelenili, njihova zamenjava bo v skladu projektnimi pogoji ZVKD in vsebino konservatorskega načrta, dograditev manjkajočih povezovalnih potk. V obnovo bodo dodane moderne kompozicije sprehajalnih stez, izgradnja tematskih vsebin interaktivnih učilnic. Namestili bomo novo urbano opremo v skladu s katalogom urbane opreme, ki je v izdelavi. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 2.008

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.313.250,00	0,00	0,00 %
SLO	231.750,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.545.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M6 Pogodba z izvajalcem
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (01.12.2025)

Status časovnice projekta:


Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	11.10.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	31.01.2026	09.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	06.12.2026
Zaključek projekta	31.12.2026	09.10.2027

Projekt 16: Zelena preobrazba Šafarskega



Občina izvajanja projekta: Razkrižje

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 1.082.950,00 €

Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA

469 dni

Kratek opis projekta:

Projekt je namenjen ozelenitvi naselja Šafarsko, ki je središče občine Razkrižje. Območje projekta zajema cca 16.995 kvadratnih metrov površin. Zelena preobrazba v projektu je urejena in predvidena tako, da bo po zaključku izvedbe projekta nastala trajnostna povezana enota. Poudarjamo, da so vse utrjene peš ali utrjene peš in kolesarske poti narejene iz naravnih materialov (v nadaljevanju utrjena peš ali peš in kolesarska pot), kjer bo to mogoče bomo te poti ozelenili s travo, saj sledimo sonaravnim načelom in pri vzpostavitvi nove zelene infrastrukture ne uporabljamo asfalta ali betona, vse poti želimo čim bolj ozeleniti. Že grajene objekte iz asfalta ali betona ozelenjujemo. Stara drevesa bomo pomladili, po potrebi odstarili in zasadili nova, površine bomo ozelenili z grmovnicami. Namestili bomo novo urbano opremo, umestili javno razsvetljavo. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 1,7 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 261

Uradne zamude pri projektu

Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	60	Zamik zaradi pridobivanja PZI in vloge NPO.
07.05.2026	30	Priprava vloge za NPO.
07.09.2026	90	Ni še dokumentacije

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	920.507,50	0,00	0,00 %
SLO	162.442,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.082.950,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (180 dni + 169 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta			
Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +180 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.03.2026	27.09.2026	09.03.2027
Oddaja vloge na OU	30.04.2026	27.10.2026	13.04.2027
Odločitev o podpori	29.05.2026	25.11.2026	07.05.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	30.06.2026	27.12.2026	08.06.2027
Zaključek projekta	31.12.2027	28.06.2028	08.12.2028

Projekt 17: Zeleni sistem v Šalovcih – zelena vez Šalovec

12%

NAPREDEK

2. junija, 2025

22. januarja, 2027

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

78%

Občina izvajanja projekta: Šalovci

Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA

Višina sofinanciranja: 347.090,00 €

Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

143 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta Zelena vez Šalovci je izboljšati kakovost življenja v naselju Šalovci s povezovanjem ključnih delov kraja z zeleno in modro infrastrukturo. Projekt vključuje urejanje dostopnih, senčenih, naravno zasajenih in funkcionalnih javnih površin za pešce, kolesarje, otroke in rekreativce. Zeleni sistem bo pomagal pri blaženju podnebnih sprememb, izboljšal bivalne pogoje ter spodbudil trajnostni turizem in rekreacijo. Projekt omogoča tudi zadrževanje deževnice za namakanje in ohlajanje kraja ter spodbuja biodiverzitetu z avtohtonimi rastlinami. S tem občina naslavlja okoljske, družbene in razvojne izzive podeželskega okolja. Kazalniki: – Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe, 0.5 ha – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 201

Uradne zamude pri projektu

Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	60	Zamik zaradi izpolnjevanja vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	295.026,50	0,00	0,00 %
SLO	52.063,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	347.090,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (28.11.2025)

Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (60 dni + 230 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	31.12.2025	01.03.2026	10.03.2027
Odločitev o podpori	30.01.2026	31.03.2026	24.03.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	27.02.2026	28.04.2026	07.04.2027
Zaključek projekta	31.12.2026	01.03.2027	08.02.2028

Projekt 18: Učni užitni park Turnišče



Občina izvajanja projekta: Turnišče
Specifični cilj: RSO2.7 - ZELENA INFRASTRUKTURA
Višina sofinanciranja: 605.376,20 €
Real črpanja: 0,00 €

ODLOČITEV

PT obravnava

119 dni

Kratek opis projekta:

Osnovni namen projekta je ureditev užitnega parka Turnišče, v sklopu katerega se bo zagotovila in izboljšala zelena in modra infrastruktura na območju Občine Turnišče. Uredil se bo prostor v občinskem središču z zasaditvijo in gojenjem užitnih avtohtonih rastlinskih vrst s pripadajočo vsebino za lokalno skupnost, občane ter ostale obiskovalce. Urbani vrtovi in sonaravna igrišča bodo služili tudi kot prostor za promocijo samooskrbe in srečevanje občanov, predajanje znanja med generacijami in vzpostavljanje spoštljivega odnosa do narave. Velik poudarek projekta bo na sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in razvoju inovativnih pristopov za ohranitev biodiverzitete že v fazi načrtovanja in oblikovanja prostora. S projektom bomo krepili modro in zeleno infrastrukturo v občinskem središču z uporabo novih zelenih tehnologij, materialov in na naravi temelječih rešitah ter s tem izboljšali kakovost urbanega okolja in bivanjske kakovosti ter tako prispevali k rasti odporne in trajnostno naravnane družbe. – Inovativni ukrepi na področju spodbujanja ozelenitve mest: 1 – Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšanje zelene infrastrukture 1.615

Uradne zamude pri projektu		
Datum	Zamuda (dni)	Obrazložitev
30.01.2026	60	Zamik 2 meseca zaradi priprave vloge NPO.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	514.569,77	0,00	0,00 %
SLO	90.806,43	0,00	0,00 %
SKUPAJ	605.376,20 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Vloga je prispela na PT in je v obravnavi (31.12.2025)


Status časovnice projekta:

Projekt zamuja (60 dni + 197 dni)

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Upravičenec +60 dni	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	31.03.2026	01.03.2027
Odločitev o podpori	27.02.2026	28.04.2026	15.03.2027
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	30.05.2026	29.03.2027
Zaključek projekta	31.12.2026	01.03.2027	29.12.2027

Projekt 19: Ureditev kolesarske poti Bratonci-Križevci

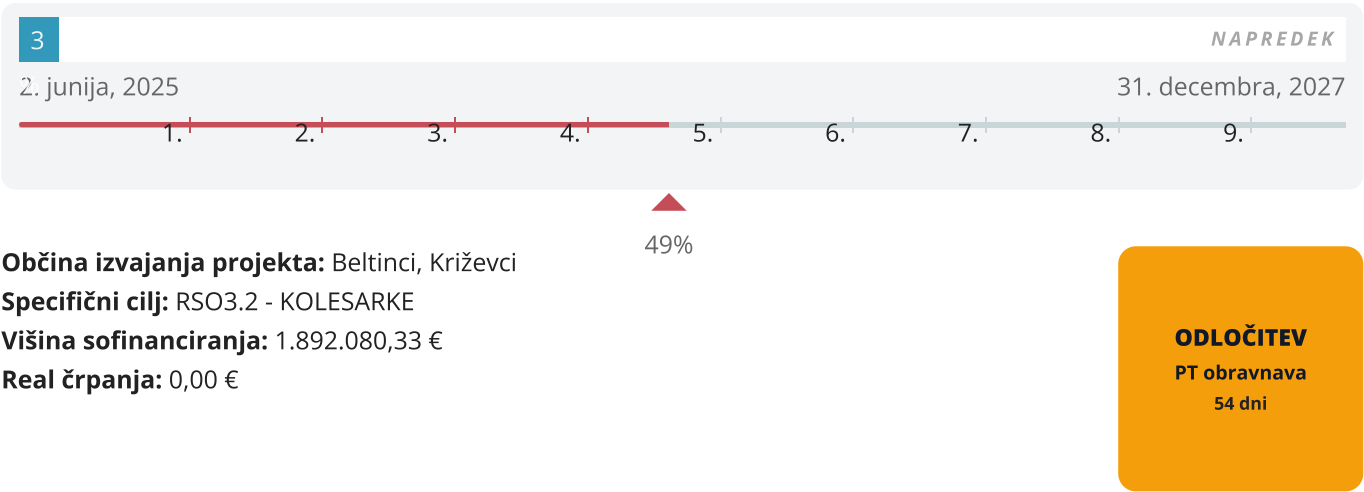

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče kolesarke stezein sprememba potovalnih navad , opravljanja poti z avtomobilom preusmeriti na kolo,električno kolo ,peš hojo. Predvidena je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske poti (mestoma dvostranske) ob regionalni cesti R2-439/1302 Bratonci-Kiževci in R1-230/1415 Križevci v skupni dolžini 3280m.Predvidena je tudi ureditev priključka občinske ceste JP 724581 na R2-439/1302 v km 8+500,izgradnja premostitvenega objekta preko obstoječega jarka na R2-439/1302 vkm 8+812,ureditev avtobusne postaje na R2-439/1302 v km 9+295 ter ureditev javne razsvetljave v območju urejanja avtobusnih postajališč in prehodov za pešce. Kazalniki: nameska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo: 3,2 km; število potnikov, ki uporablja namensko kolesarsko infrastrukturo: 2.600.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	1.608.268,28	0,00	0,00 %
SLO	283.812,05	0,00	0,00 %
SKUPAJ	1.892.080,33 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Status časovnice projekta:


Projekt zamuja

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	31.12.2025	14.09.2026
Oddaja vloge na OU	30.01.2026	14.10.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Odločitev o podpori	27.02.2026	06.11.2026
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.03.2026	08.12.2026
Zaključek projekta	31.12.2027	08.09.2028

Projekt 20: Izgradnja KP Ključarovci – Ljutomer



Občina izvajanja projekta: ^{21%} Križevci, Ljutomer
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 3.578.543,00 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
319 dni

Kratek opis projekta:

Namen projekta je izgradnja manjkajoče kolesarske steze in sočasna rekonstrukcija ceste na relaciji Ljutomer – Ključarovci. Če odštejemo obstoječo dvosmerno kolesarsko stezo od km 2,62 do km 2,96 bo tako na novo zgrajeno 2.620m ločene dvosmerne kolesarske steze, 1.160m trase bo dograjene s pločnikom in na njem enosmerno kolesarsko stezo, ki bo s talno signalizacijo ločena od površin za pešce, ter 620m nove dvosmerne kolesarske steze, ki bo zgrajena na levi strani ceste na območju sedaj enosmerne kolesarske steze. Skupaj torej 4.400m novih kolesarskih stez. število potnikov, ki uporablja namensko kolesarsko infrastrukturo: 2.000.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	3.041.761,55	0,00	0,00 %
SLO	536.781,45	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.578.543,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: Ni potrjenih nalog.
Naslednja naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ

Status časovnice projekta: Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Nasha napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	01.10.2026	01.10.2026
Oddaja vloge na OU	02.11.2026	05.11.2026
Odločitev o podpori	01.12.2026	01.12.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Podpis pogodbe o sofinanciranju	04.01.2027	04.01.2027
Zaključek projekta	31.12.2029	31.12.2029

Projekt 21: Državna kolesarska povezava Bogojina – Gančani (G17)

8%

NAPREDEK

Občina izvajanja projekta: Moravske Toplice
Specifični cilj: RSO3.2 - KOLESARKE
Višina sofinanciranja: 3.135.987,13 €
Real črpanja: 0,00 €

PRIPRAVA
294 dni

Kratek opis projekta:

Cilji projekta: 1.) izgradnja odseka državne glavne (G17 Moravavske Toplice – Ljutomer – Ormož) kolesarske povezave od Bogojine do Gančanov ob regionalni cesti (R3-743/5606) 2.) navezava na vzpostavljeno Termalno kolesarsko pot Martjanci – Dobrovnik (D8) 3.) na prometno obremenjeni cesti, izvoz iz AC 5 (R3-743/5606) vzpostaviti ločeno kolesarsko pot za večjo varnost in dostopnost do turističnega središča Moravske Toplice in ostalih turističnih destinacij na ozemlju OBčine Beltinci 4.)promocija trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja in gibanj

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	2.665.589,06	0,00	0,00 %
SLO	470.398,07	0,00	0,00 %
SKUPAJ	3.135.987,13 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah

Priprava dokumentacije	Odločitev o podpori	Izvajanje	Zaključek
------------------------	---------------------	-----------	-----------

■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M1 Potrditev DIIP/IDZ
Naslednja naloga: M2 Oddaja NPO na PT (30.09.2026)

Status časovnice projekta:


Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Oddaja vloge za NPO	30.09.2026	30.09.2026
Oddaja vloge na OU	30.10.2026	04.11.2026
Odločitev o podpori	30.11.2026	30.11.2026

Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Podpis pogodbe o sofinanciranju	31.12.2026	31.12.2026

Projekt 22: Pomurski center mobilnosti



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS

Višina sofinanciranja: 263.250,00 €

Real črpanja: 0,00 €

IZVEDBA

195 dni

Kratek opis projekta:

Predmet projekta je vzpostavitev in delovanje Pomurskega centra mobilnosti (v nadaljevanju PCM)

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	223.762,50	0,00	0,00 %
SLO	39.487,50	0,00	0,00 %
SKUPAJ	263.250,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



■ Dokončano ■ V izvajanju ■ Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja

Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici

Predvideni nadaljnji potek projekta


Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	31.12.2027	02.08.2028

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	146.412,50	25.837,50	172.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	77.350,00	13.650,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	223.762,50	39.487,50	263.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

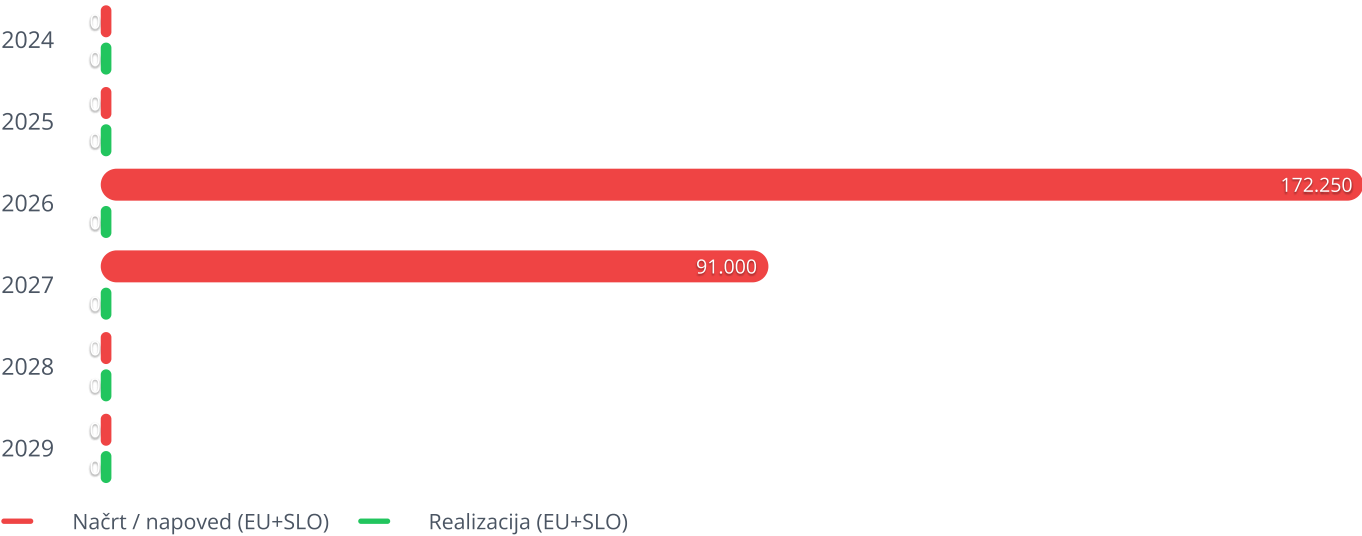


Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Projekt 23: Regijska celostna prometna strategija za Pomurje



Specifični cilj: RSO3.2 - RCM - RCPS
Višina sofinanciranja: 80.000,00 €
Real črpanja: 0,00 €

IZVEDBA
131 dni

Kratek opis projekta:

Vsebina projekta je priprava Regionalne celostne prometne strategije za Pomurje. Gre za strateški dokument, ki določa usmeritve za prihodnji razvoj prometa v regiji in ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Povzetek financiranja:

Vir	Načrt	Real	% real.
EU	68.000,00	0,00	0,00 %
SLO	12.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Časovni vidik izvedbe projekta

Pregled projekta po fazah



Dokončano V izvajanju Na čakanju

Zadnja potrjena naloga: M7 Začetek izvajanja
Naslednja naloga: M8 Ključni vmesni zahtevek

Status časovnice projekta:

Projekt je v časovnici


Predvideni nadaljnji potek projekta		
Aktivnost	Upravičenec	Naša napoved (FE)
Zaključek projekta	31.12.2027	28.07.2028

Sofinanciranje projekta po letih in kazalniki

Načrt in realizacija

Leto	Načrt EU	Načrt SLO	Načrt / napoved EU+SLO	Real EU	Real SLO	Real EU+SLO	% realizacije
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2026	51.000,00	9.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2027	17.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
SKUPAJ	68.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Načrt in realizacija po letih

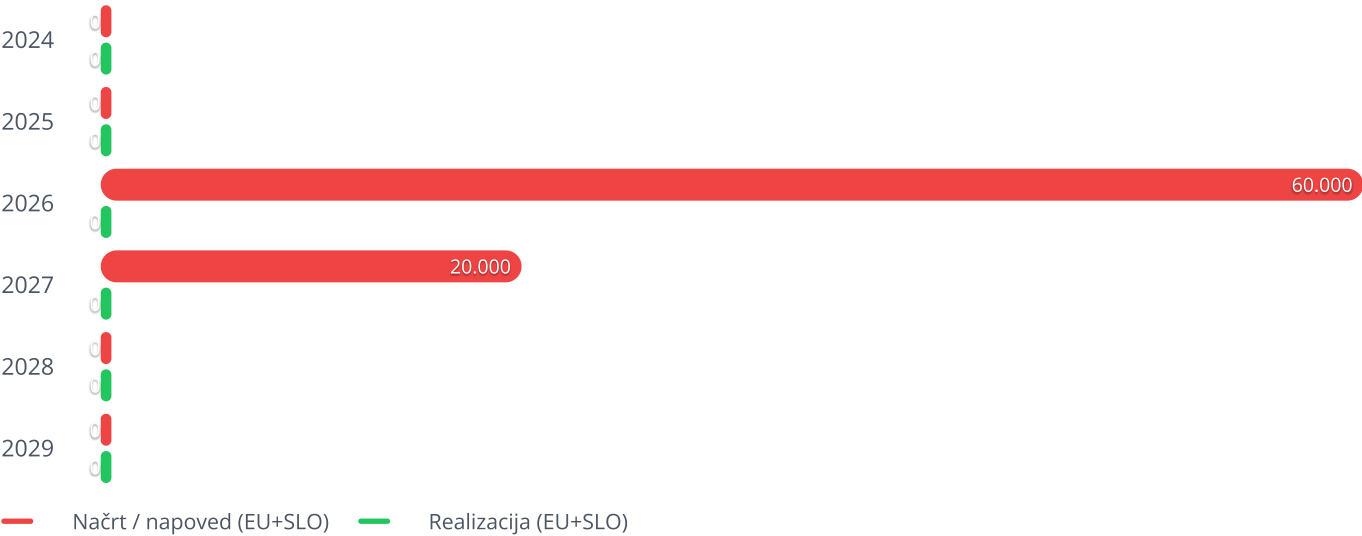

Kazalniki projekta

Kazalniki projekta

Za izbrani obseg ni vnesenih kazalnikov.

Metodološka pojasnila

Podatki v poročilu so pripravljeni na podlagi informacij, evidentiranih v informacijskem sistemu spremljanja projektov na dan priprave poročila. Podatki o napredovanju projektov, terminskih načrtih, finančni dinamiki in kazalnikih temeljijo na podatkih, ki so jih posredovali upravičenci projektov, pristojne regionalne razvojne agencije, posredniška telesa in drugi sodelujoči deležniki. Napovedi prehodov med fazami, napovedi zaključkov projektov in napovedi koriščenja sredstev predstavljajo informativne analitične ocene sistema in ne predstavljajo uradnih odločitev pristojnih organov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, regionalne razvojne agencije in drugi sodelujoči deležniki ne prevzemajo odgovornosti za morebitna odstopanja med prikazanimi podatki oziroma napovedmi in dejanskim izvajanjem projektov. **Poročilo je informativne narave in je namenjeno spremljanju izvajanja projektov v okviru dogovorov za razvoj regij.**

SKRBNIK REGIJE

ODGOVORNA OSEBA
