

DOGOVOR ZA RAZVOJ GORENJSKE REGIJE

vmesno poročilo - februar 2026

INFORMACIJE O POTEKU SKLENITVE DOGOVORA ZA RAZVOJ GORENJSKE REGIJE

Vmesno poročilo je pripravljeno na osnovi ugotovitev na sestanku v mesecu januarju 2026.

Gorenjska razvojna regija je v okviru dogovora za razvoj regij 2021–2027 prijavila skupaj 21 projektovnih predlogov. Od 18 občin Gorenjske razvojne regije predloga ni podala Občina Jezersko, v projekte sta le kot partnerja vključeni Občina Jesenice (nosilec projekta je Občina Žirovnica) in Občina Šenčur (nosilec projekta je Občina Preddvor).


Tabela 1: Projektne predlogi za Dogovor za razvoj Gorenjske regije glede na vrednost sofinanciranja (EU + SLO) v EUR in število projektov po nosilcih projektov

Nosilec projekta	Predvideno sofinanciranje skupaj EU+SLO, v EUR EU + SLO	Število predlaganih projektov	Delež vrednosti glede na skupno vrednost sofinanciranja vseh projektov
BSC, d.o.o., Kranj (regionalna razvojna agencija za Gorenjsko)	2.103.765,77	3	5,3 %
Mestna občina Kranj	9.206.036,08	1	23,0 %
Občina Bled	1.590.201,18	1	4,0 %
Občina Bohinj	1.094.014,04	2	2,7 %
Občina Cerklje na Gorenjskem	1.576.094,90	1	3,9 %
Občina Gorenja vas - Poljane	1.521.566,54	1	3,8 %
Občina Gorje	702.491,50	1	1,8 %
Občina Kranjska Gora	1.122.969,76	1	2,8 %
Občina Naklo	1.196.969,75	1	3,0 %
Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)	2.631.050,71	1	6,6 %
Občina Radovljica	3.312.563,57	1	8,3 %
Občina Škofja Loka	4.051.187,96	2	10,1 %
Občina Tržič	2.628.906,91	2	6,6 %
Občina Železniki	1.372.404,39	1	3,4 %
Občina Žiri	1.146.873,96	1	2,9 %
Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)	4.742.875,96	1	11,9 %
Skupaj	39.999.972,98	21	100,0%

Tabela 2: Posredovani projektni predlogi Gorenjske razvojne regije za dogovor za razvoj regije 2021–2027 po vsebini, celotni vrednosti projekta, vrednosti predvidenega sofinanciranja v EUR ter deležu vrednosti sofinanciranja glede na vrednost sofinanciranja vseh projektov v Gorenjski razvojni regiji

Vsebina	Vrednost projektov v EUR	Predvideno sofinanciranje projektov EU + SLO	% od predvidenih skupnih sredstev sofinanciranja vseh projektov EU + SLO	Število projektnih predlogov
Državno kolesarsko omrežje	8.662.512,30	7.424.949,83	18,6 %	4
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	34.702.064,96	13.340.566,85	33,4 %	3
Podjetno nad izzive (PONI)	1.538.272,00	1.538.272,00	3,8 %	1
Regionalni center mobilnosti	485.493,77	485.493,77	1,1 %	1
Regionalne celostne prometne strategije	100.000,00	80.000,00	0,3 %	1
Pitna voda	13.096.522,78	8.076.418,17	20,2 %	3
Zelena infrastruktura	18.172.848,93	9.054.272,36	22,6 %	8
Gorenjska skupaj	76.767.714,74	39.999.972,98	100,0 %	21

Slika 1: Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije; predvidena vrednost sofinanciranja projektov EU + SLO v EUR po vsebinah

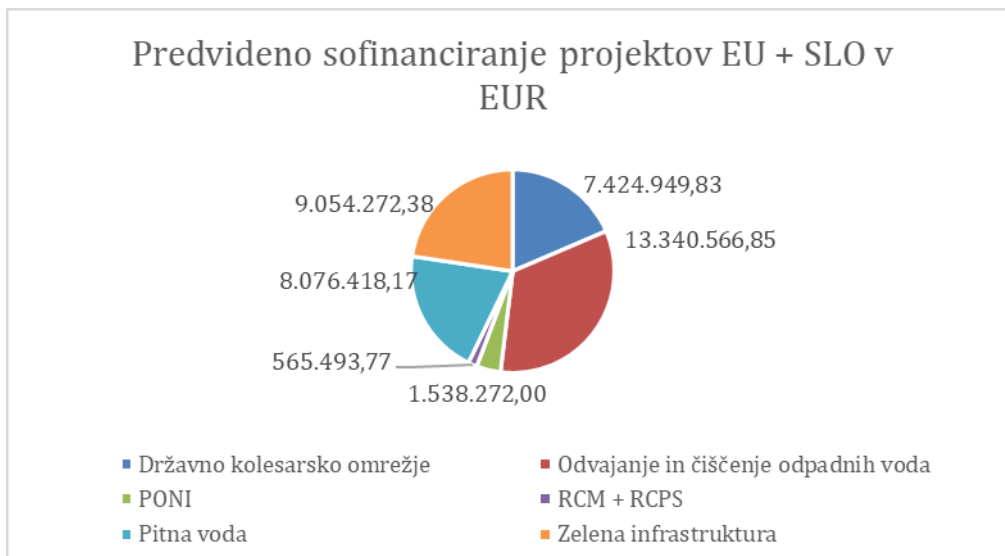

Dogovor za razvoj Gorenjske regije, ki je vključeval le projekt PONI Gorenjska, je bil podpisan 20. decembra 2023. Z dodatkom št. 1, ki je bil za vse dogovore podpisan 10. aprila 2025, je bilo dodatno vključenih 7 projektov, tako da je bila skupna predvidena vrednost sofinanciranja EU+SLO (PONI in dodatnih 7 projektov) 22.698.783,59 EUR.

29. maja 2025 je bil podpisan dodatek št. 2, s katerim je bilo vključenih dodatno še 7 projektov, tako da je skupno v dogovoru 15 projektov s skupno predvideno vrednostjo sofinanciranja EU+SLO 33.220.384,48 EUR.

Z dodatkom št. 3, podpisanim 5. septembra. 2025, je vključenih v dogovor 20 projektov s skupno predvideno vrednostjo sofinanciranja EU+SLO 39.178.005,75. Od 21 projektnih predlogov le še za enega ni izdanega soglasja.


Projekt Občine Bohinj »Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica« še ni vključen v dogovor za razvoj regije, saj ob oddaji projektnega predloga ni ustrezal vsem kriterijem iz povabila. 29. 12. 2025 je bila sprejeta Uredba o aglomeracija Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki v prilogi I določa Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. V ta seznam so uvrščene tudi aglomeracije občin Bohinj (zap. št. 5), Divača (zap. št. 14) in Vodice (zap. št. 120). Vse tri občine so oddale projektne predloge, ki še niso prejeli soglasja MNVP.

Za projekt PONI je že sklenjena pogodba.

Tabela 3: Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije, načrtovano črpanje sredstev (EU + SLO) za projekte po letih, vključno s projektom, za katerega še ni prejetega soglasja

Načrtovano črpanje sredstev/leto	Stanje februar 2026; predvidena vrednost, EUR	Stanje december 2025, predvidena vrednost, EUR	Predhodno predvidena vrednost, EUR
2024; EU + SLO	232.192,00	319.264,00	319.264,00
2025; EU + SLO	319.264,00	319.264,00	726.438,12
2026; EU + SLO	11.987.491,10	12.473.655,26	13.872.742,88
2027; EU + SLO	17.017.352,88	16.595.666,76	16.480.852,89
2028; EU + SLO	10.059.872,31	9.908.322,31	7.456.414,09
2029; EU + SLO	383.800,64	383.800,64	1.144.261,00
Skupaj načrtovano črpanje sredstev, EUR	39.999.972,93	39.999.972,99	39.999.972,98

Slika 2: Načrtovano črpanje sredstev (EU + SLO) po letih, Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije, v EUR

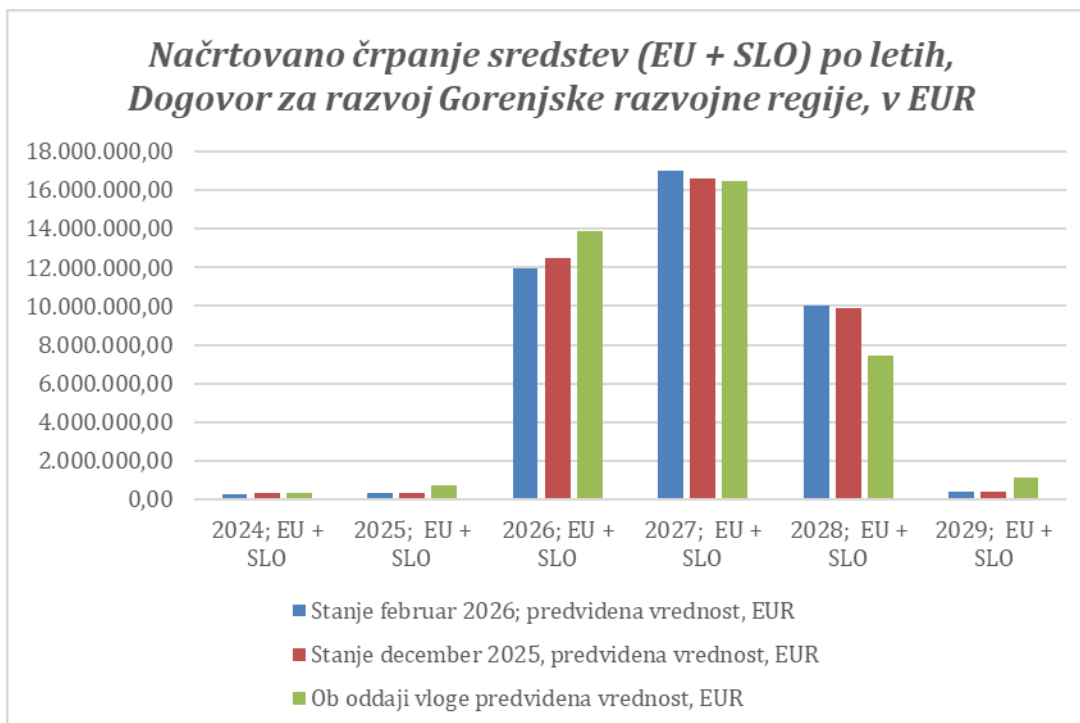

NAVEDBA PROJEKTOV GLEDE NA SPECIFIČNE CILJE¹

Specifični cilj: RS01.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami; Evropski sklad za regionalni razvoj

Podjetno nad izzive (PONI) - PONI Gorenjska

- **Nosilec projekta: BSC, d.o.o., Kranj**
- Predvidena vrednost investicije (po pogodbi): 1.538.272,00 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.538.272,00 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO; po pogodbi): 1.538.272,00 EUR; 100 % financiranje operacije
- Že izplačano: 478.896,00 EUR
- Obdobje izvedbe: 1. 1. 2024–31. 12. 2028

¹ Podatki so povzeti iz dokumentacije, ki smo jo prejeli od BSC, d.o.o., Kranj, regionalne razvojne agencije za Gorenjsko.

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje podjetništva. Projekt je bil prvi, ki je bil vključen v Dogovor za razvoj Gorenjske regije 2021–2027, podpisan je bil 20. 12. 2023 z vrednostjo projekta 1.538.851,82 EUR.

Za projekt je bila izdana odločitev o podpori št. 3032-85/2024-1630-6 z dne 23. 4. 2024 in dne 22. 5. 2024 podpisana pogodba; skupna vrednost projekta je 1.538.272,00, pogodbeni vrednost sofinanciranja je 1.538.272,00 EUR, torej za 579,82 EUR nižja od predvidene v dogovoru. 1. 12. 2025 je bil podpisan dodatek k pogodbi, z dodatkom je nekoliko spremenjeno financiranje projekta po letih (Tabela 3)

Izplačani so bili že zahtevki za izplačilo v skupni vrednosti 551.456,00 EUR.

Tabela 4: Podjetno nad izzive (PONI Gorenjska); predvideno črpanje sredstev in realizacija do konca leta 2025, v EUR

Finančni viri/leto	2024	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Skupaj EU+SLO po pogodbi, EUR	319.264,00	319.264,00	319.264,00	290.240,00	290.240,00	1.538.272,00
Dodatek št. 1. k pogodbi, sklenjen 1. 12. 2025	232.192,00	319.264,00	319.264,00	304.752,00	362.800,00	1.538.272,00
Realizacija izplačil EU+SLO	232.192,00	319.264,00	0,00	0,00	0,00	551.456,00

Projekt se izvaja v skladu s sklenjenim dodatkom št. 1, ki je bil podpisan 1. 12. 2025.

Ureditev inkubatorjev v Gorenjski regiji ni predvidena.

Specifični cilj: RS03.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo; Evropski kohezijski sklad

Regijski center mobilnosti Gorenjska (RCM Gorenjska)

- **Nosilec projekta: BSC, d. o. o., Kranj**
- Skupna vrednost investicije: 485.493,77 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 485.493,77 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 485.493,77 EUR; 100 % financiranje operacije
- Obdobje izvedbe: 1. 1. 2025–1. 7. 2028

- Datum oddaje popolne vloge za NPO: 22. 8. 2025

RCM Gorenjska kot eden izmed demonstracijskih projektov ima za osrednji cilj prispevati k blaženju posledic podnebnih sprememb in prilagajanju nanje s pomočjo neinfrastrukturnih ukrepov za izboljšanje trajnostne mobilnosti v regiji. Trije specifični cilji so: 1/ izboljšan sistem načrtovanja in uvajanja trajnostne mobilnosti v gorenjski regiji v sinergiji s sosednjimi regijami, 2/ izboljšanje strokovnih kapacitet ter okrepljeno trajno sodelovanje strokovnih ciljnih skupin na področju trajnostne mobilnosti (RCM Gorenjska kot povezovalni subjekt izvaja aktivnosti za nacionalno raven in lokalne skupnosti), 3/ višja stopnja ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti.

Odločitev o podpori je bila izdana 20. 11. 2025.

Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske

- **Nosilec projekta: BSC, d. o. o., Kranj**
- Skupna vrednost investicije: 100.000,00 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 100.000,00 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 80.000,00 EUR (80 % sofinanciranje upravičenih stroškov)
- Obdobje izvedbe: do 30. 9. 2027
- Zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 9. 2027
- Vloga za NPO je bila oddana 22. 8. 2025,


Namen projekta je izdelava RCPS Gorenjske, ki bo za sedemletno obdobje opredelila ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v regiji. Skozi proces priprave RCPS se bo vzpostavilo strateško in ciljno usmerjeno prometno načrtovanje na regionalni ravni, celostno upravljanje prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu.

Odločitev o podpori je bila izdana 9. 2. 2026.

Tabela 5: Projekta Regijski center mobilnosti Gorenjska in Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

	2026	2027	2028	Skupaj
Regijski center mobilnosti Gorenjska	149.382,70	149.382,70	186.728,37	485.493,77
Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Skupaj	189.382,70	189.382,70	186.728,37	565.493,77

Slika 3: Predvideno črpanje po letih za projekta Regijski center mobilnosti Gorenjska in Regijska celostna prometna strategija

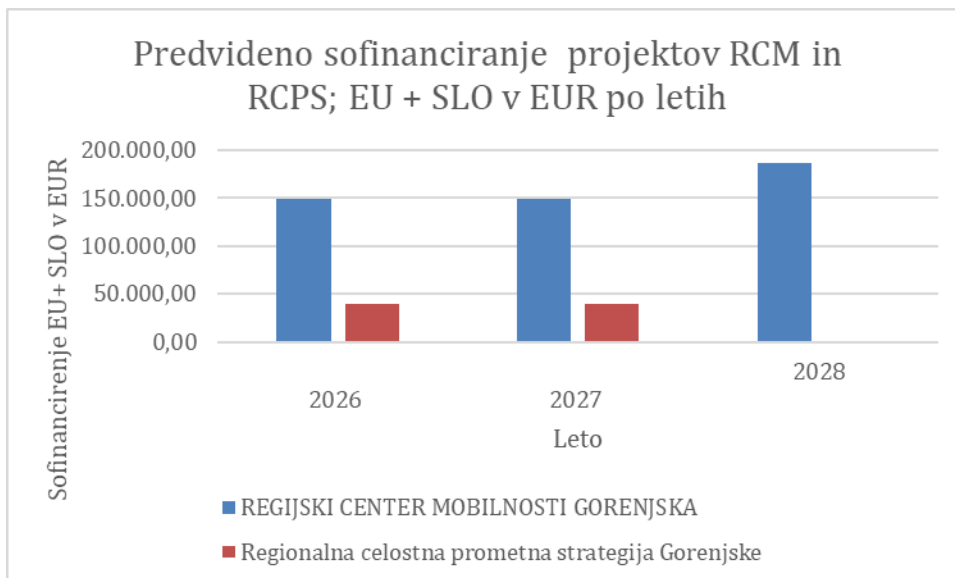

Kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo

- **Nosilec projekta: Občina Naklo,**
- Skupna vrednost investicije: 1.313.082,45 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.196.969,75 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.196.969,75 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: 20. 10. 2025–31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 1. 4. 2026, kot je bilo določeno že na sestanku v mesecu novembru 2025.
- Predviden datum izbora izvajalca: januar 2026 (1. faza)
- Predviden začetek del na terenu: marec 2026 (1. faza)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): september 2029 (zadnja faza), ni spremembe
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
- Kazalnik učinka: 4,838 km ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 5000 uporabnikov letno

Osnovni namen projekta je urediti varne kolesarske povezave, ki so del državnega kolesarskega omrežja, ki bo v bodoče s kolesarskimi povezavami povežalo Občino Naklo v regionalno kolesarsko omrežje in v evropsko kolesarsko mrežo. Strateški cilj je pristop k realizaciji strateških izzivov, ki si jih je zadala celostna prometna strategija občine, predvsem v strategiji definiran strateški izziv III. Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja ter prispevati k zmanjšanju emisij oziroma ogljičnega odtisa Občine.

Zgrajenih 4,838 km kolesarskih povezav v obe smeri.

Pričakovani in povsem merljivi (konkretni) cilji investicije (učinki) bodo merljivi preko zgrajenih metrov kolesarskih povezav, kazalniki učinka pa dolžina novih daljinskih kolesarskih povezav.

Za prvi odsek je izvajalec že izbran, v naslednjih dneh je predviden podpis pogodbe; dela naj bi bila zaključena v maju 2026 izvajalec ima rok do konca avgusta 2026. Projektna dokumentacija je za vse odseke popolna, manjka morebitna recenzija. Del projekta vključuje tudi državno cesto. Vsa lastništva še niso urejena. Projekt (črpanje sredstev) naj bi se kljub temu odvijalo v skladu z načrtom.

Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3)

- **Nosilec projekta: Občina Škofja Loka**
- Skupna vrednost investicije: 4.387.139,29 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 3.549.339,52 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 3.549.339,52 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 6. 2026 (zaradi daljšega obdobja za zbiranje soglasij lastnikov zemljišč) – predhodno je bil predviden rok 28. 2. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: 1. 9. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 1. 10. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 6. 2029
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
- Kazalnik učinka: 3,69 km ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 30.000 uporabnikov letno

Osnovni namen projekta je urediti varne kolesarske povezave, ki povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem. Gre za dograditev manjkajočih odsekov v smeri Železnikov (R6) in Gorenje vasi (G3), vključenih v DIIP št. 37164-3/2020/230, DRSI, februar 2021. V mestnem središču pa gre za novo vzporedno povezavo (R7) za smer Železniki. Ta povezava je ključna za varno odvijanje kolesarskega prometa v mestnem središču Škofje Loke. Za ta del je že potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za kolesarje vzdolž regionalne ceste R2-403/1076 v Škofji Loki, št. 371-29/2023, datum potrditve 28.5.2024.

Ker gre za posodobitev prometne infrastrukture na enem od prometno bolj obremenjenih delov lokalnega cestnega omrežja, znotraj katerega se navezujeta tako regionalna kot lokalna prometna infrastruktura, se pričakujejo učinki na več področjih. V prometnem smislu je to prispevek k blažitvi zastojev ob prometnih konicah ter prispevek k preusmeritvi prometnih tokov oziroma krepitev trajnostno bolj sprejemljivih oblik prometa (kolesarstvo, bus), krepitev kolesarjenja kot oblike prometa med posameznimi naselji na lokalni ravni. Posledično investitor pričakuje pozitivne učinke na zmanjševanje emisiji v ozračje in k dvigu prometne varnosti, kar predstavlja družbenogospodarsko korist prav tako pa se bo z investicijo močno dvignila prometna varnost.

Strateški cilj je pristop k realizaciji strateških izzivov, ki si jih je zadala celostna prometna strategija občine, predvsem v strategiji definiran strateški izziv 1: Celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in hkrati omogočala ekonomski, družbeni in gospodarski razvoj. S sledenjem strateškim ciljem strategije pa stremenje k realizaciji prometne vizije občine, ki je definirana v sloganu: »Občina Škofja Loka bo s celostno ureditvijo in organizacijo prometa po načelih trajnostne mobilnosti nadgradila svojo bogato kulturno in naravno dediščino.«.

Cilj za leto 2029 je povečati število prebivalcev, ki imajo dostop do novih ali izboljšanih kolesarskih poti. Do leta 2029 je cilj doseči skupno 120 kilometrov novih ali prenovljenih kolesarskih poti na nacionalni ravni, z določenim deležem (528 m) v občini Škofja Loka.

Projekt vsebuje 3 kolesarske povezave, so v fazi pridobivanja soglasij za popolno dokumentacijo. PZI je pridobljen le za enega od treh odsekov, začeli bodo s pogovori z lastniki zemljišč, zagotavljajo, da bodo del sredstev črpali še letos, predvidena dinamika črpanja se ne spreminja.

Izgradnja kolesarske povezave Zadruga – Tržič G6

- **Nosilec projekta: Občina Tržič**
- Skupna vrednost investicije: 1.852.323,68 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.306.236,17 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.306.236,17 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 31. 3. 2026, predhodno 28. 2. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: 1. 6. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 1. 7. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2029
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
- Kazalnik učinka: 5,97 km ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 9000 uporabnikov letno

S projektom se pristopa k vzpostavitvi celostnega državnega omrežja. Na odseku G6 Zadruga–Križe–Pristava je predvidena izgradnja kolesarske steze v dolžini 3.070 m, na odseku Pristava–Tržič je predvidena umestitev kolesarskega pasu v dolžini 2.900 m. Zgrajena kolesarska steza se bo navezovala na zgrajeno kolesarsko stezo Zadruga–Sp. Duplje–Strahinj–Naklo.

Izvedba projekta zajema 3 faze:

- faza 1: izgradnja odseka Zadruga–Žiganja vas
- faza 2: izgradnja odseka Žiganja vas–Križe
- faza 3: izgradnja odseka Križe–Pristava–Tržič

Z izvedbo vseh treh faz bo zagotovljena tudi zveznost kolesarske povezave z Naklom. Trenutno se kolesarska steza G6 zaključi v naselju Zadraga od tam pa se nadaljuje po občinskih cestah.

V sklopu za razvoj regij DRR je bila v Občini Naklo v letu 2022 zgrajena kolesarska povezava Zadraga–Sp. Duplje–Strahinj–Naklo. Z izgradnjo kolesarske povezave Zadraga– Tržič bi se vzpostavila kolesarska povezava od Tržiča do Nakla, kjer je načrtovana izgradnja nove potniške železniške postaje, s čimer bi se spodbujala sprememba potovalnih navad (preusmeritev uporabnikov na intermodalnost kolo/vlak).

Za odsek Zadraga–Tržič je Občina Tržič izdelala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije IZP odsek Pristava–Križe–Zadraga ter projektno dokumentacijo PZI Žiganja vas–Zadraga. Na odseku Zadraga–Križe–Pristava je predvidena izgradnja kolesarske steze v dolžini 3.070 m na odseku Pristava–Tržič je predvidena umestitev kolesarskega pasu v dolžini **2.900 m**.

Kazalniki rezultata: Prebivalci z dostopom do kolesarske infrastrukture: Cilj za leto 2028 je povečati število prebivalcev, ki imajo dostop do novih ali izboljšanih kolesarskih poti.

Cilj za leto 2028 je povečati število prebivalcev, ki imajo dostop do novih ali izboljšanih kolesarskih poti. Do leta 2028 je cilj doseči skupno 120 kilometrov novih ali prenovljenih kolesarskih poti na nacionalni ravni, z določenim deležem (5.970 m) v občini Tržič.

Projektna dokumentacija je izdelana. Lastništva še niso povsem urejena, morda bo treba traso kolesarske prestaviti zaradi pritiskov – nasprotovanja kmetov. So v fazi pridobivanja zemljišč / služnosti, prav tako poteka postopek pridobivanja soglasja Telekomu in plinovoda. Načrtujejo sestanek s kmetijsko zbornico. Predvideno je, da bi kolesarska steza potekala v bližini ceste, če to ne bo mogoče zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč, bo treba potek steze prestaviti.

V februarju 2026 bo več znanega glede dogovora z lastniki zemljišč, potekom trase – izvedbo projekta. Za zdaj naj bi ostali pri predvidenem črpanju sredstev po letih.

Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje

- **Nosilec projekta: Občina Železniki**
- Skupna vrednost investicije: 1.372.404,39 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.372.404,39 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.372.404,39 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 5. 2026 **ni spremembe**
- Predviden datum izbora izvajalca: 30. 9. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 15. 10. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 11. 2028
- Kazalnik učinka: 3,2 km ob zaključku projekta

- Kazalnik rezultata: 4500 uporabnikov letno
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.


Osnovni namen projekta je vzpostavitev kolesarskih poveza med naselji Selca, Dolenja vas in Ševlje z mestom Železniki. Urejene bodo kolesarske poti v skupni dolžini 3,2 km. Cilj za leto 2029 je povečati število prebivalcev, ki imajo dostop do novih ali izboljšanih kolesarskih poti. Do leta 2029 je cilj doseči skupno približno 120 km novih ali prenovljenih kolesarskih poti na nacionalni ravni, z določenim deležem (3,2 km) v občini Železniki.

PZI dokumentacija je v zaključni fazi, sredi marca je predvidena recenzijska razprava, pri predvidenem datumu oddaje vloge za NPO ni spremembe: 30. 5. 2026. Pripravljajo popis del za javno naročilo, ki naj bi bilo objavljeno istočasno z oddajo popolne vloge za NPO. Predvidoma bi bil izvajalec izbran v septembru letos, z deli bi začeli takoj po podpisu pogodbe, zaključek projekta je predviden za konec novembra 2028.

Tabela 6: Projekti državnega kolesarskega omrežja – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

Naziv projekta	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo	844.919,82	352.049,93	0,00	0,00	1.196.969,75
Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3)	430.230,18	1.474.931,97	1.544.177,33	100.000,00	3.549.339,52
Izgradnja kolesarske povezave Zadruga – Tržič G6	668.323,03	500.000,00	137.913,14	0,00	1.306.236,17
Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje	269.873,00	616.466,68	486.064,71	0,00	1.372.404,39
Skupaj	2.213.346,03	2.943.448,58	2.168.155,18	100.000,00	7.424.949,83

Slika 4: Dogovor za razvoj Gorenjske regije; projekti državnega kolesarskega omrežja, predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

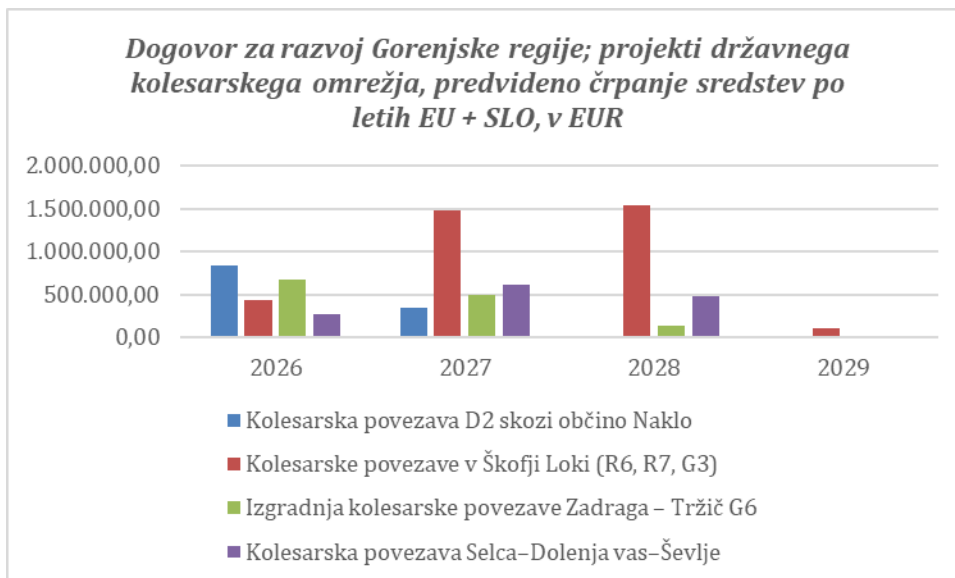

Specifični cilj: RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE

Nadgradnja CČN Radovljica

- **Nosilec projekta: Občina Radovljica**
- Skupna vrednost investicije: 7.435.440,12 EUR
- Predvidena višina upravičenih stroškov: 5.502.199,51 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 3.312.563,57 EUR; 60,2 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum izdelave PZI projektne dokumentacije (za potrebe oddaje popolne vloge – natančno ovrednotenje in razmejitev upravičenih in neupravičenih stroškov): 15. 7. 2026
- Datum oddaje popolne vloge za NPO: 25. 8. 2025, vloga naj bi bila dopolnjena 14. 8. 2026
- Predviden datum izbora gradbenega in obračunskega nadzora (vključno z izvajanjem projektne in obratovalnega kontrolinga): 30. 4. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: 27. 11. 2026
- Predviden začetek del na terenu (uvedba izvajalca v delo): 15. 1. 2027
- Predviden zaključek del na terenu: 30. 6. 2028
- Predviden pričetek enoletnega poskusnega obratovanja: 1. 7. 2028
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): do 31. 12. 2029

- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 8. 9. 2023 (pravnomočno 5. 10. 2023)
- Kazalnik učinka – populacijski ekvivalent (RC032); mejnik 2024: 17.320, cilj 2029: 25.323
- Kazalnik rezultata (RCR 42): število oseb: 11.287 v letu 2024, cilj 2029: 11.978

Projekt se nanaša na odpravo neskladij v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE. Predmet projekta je nadgradnja obstoječe CČN Radovljica, ki bo zagotovila možnost priključitve na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda za potencialne nove priključitve (iz aglomeracija Radovljica 2019 in Zgoša 2019 z obremenitvijo nad 2000 PE). CČN Radovljica bo nadgrajena tako, da bo končna kapaciteta znašala 25.323 PE (sedaj 17.320 PE).

Poteka izbor projektanta za PZI. Z MNVP so prejeli ustno obvestilo, da naj bi projekt izvajali po rdeči knjigi – ne rumeni, saj sicer ne bodo mogli potrjevati upravičenih stroškov. Zato bodo morali popraviti – prilagoditi dokumentacijo. Razpis za javno naročilo je bil objavljen na EU portalu. So v sklepni fazi izbora. Pripravljajo razpis za izbor izvajalca za gradbeni nadzor / obračunsko kontrolo projekta (objavljen naj bi bil v februarju 2026).

Zaradi zapletov – prilagoditve projekta – dokumentacije (rumena-rdeča knjiga) letos ne bo črpanja sredstev, v dopolnitvi vloge bodo pripravili tudi novo finančno konstrukcijo projekta po letih.

Izvajalec del bo izbran do konca leta 2026, z deli se bo začelo januarja 2027, v roku leta in pol naj bi bila nadgradnja zaključena.

Opremljanje aglomeracije Kranj 2019

- **Nosilec projekta: Mestna občina Kranj** - manjkajoče podatke bodo lahko dopolnili konec meseca februarja 2026
- Skupna vrednost investicije: 26.124.163,12 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 13.628.397,59 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 9.206.036,08 EUR; 67,55 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 28. 2. 2026, za zadaj ni spremembe
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 31. 1. 2026, ni spremembe
- Predviden datum izbora izvajalca:
- Predviden začetek del na terenu:
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja):
- Kazalnik učinka RCO31, km, leto 2024 0, leta 2029 cilj 18,162
- Kazalnik rezultata RCR42, osebe, leta 2024 46.516, ob zaključku 49.853

Namen naložbe je dograditev javnega sistema odvajanja odpadnih voda tako, da bo aglomeracija Kranj (ID 20594) opremljena 98 %. S tem bo dosežena skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode za področje odvajanja in čiščenje odpadnih voda.

V januarju 2026 imajo pridobljena naslednja pravnomočna gradbena dovoljenja:

- Čirče;
- Savska cesta;
- Veliki hrib;
- Gorenja Sava.

Za edino manjkajoče območje Hrastje je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja dne 10. 12. 2025 vložena na UE Kranj. Pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili v začetku februarja 2026.

Trenutno so v fazi izdelave PZI dokumentacije (Veliki hrib, Gorenja Sava in Hrastje). Pričakujejo, da bodo imeli PZI dokončane do sredine februarja in s tem tudi točnejše projektantske ocene. Za območje Čirč je bila 13. 1. 2026 podpisana pogodba z izvajalcem del. Izvajalca del za Savsko cesto imajo prav tako že izbranega in že dela na terenu.

Za ostala območja, za katere še nimajo izbranih izvajalcev, je bilo na prejšnjem sestanku, ki je potekal na BSC-ju, dogovorjeno, da bodo pripravili 1 javno naročilo s 3 sklopi.

Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica – projekt še čaka na uvrstitev v DRR

- **Nosilec projekta: Občina Bohinj**
- Skupna vrednost investicije: 1.142.461,72 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.102.627,52 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 821.967,20 EUR; 74,55 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: še ni podatka, projekt še nima soglasja za vključitev v DRR
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: še ni podatka, projekt še nima soglasja za vključitev v DRR
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: še ni podatka, projekt še nima soglasja za vključitev v DRR
- Predviden datum izbora izvajalca: september 2026 (na sestanku januar 2026)
- Predviden začetek del na terenu: september 2026 (na sestanku januar 2026)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): september 2027 (na sestanku januar 2026)
- Kazalnik učinka – populacijski ekvivalent (RC032); mejnik 2024: 9.350 PE, cilj 2029:10.500 PE.

Namen naložbe je posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica na kapaciteto 10. 500 PE, kar bo izboljšalo zanesljivost in kvaliteto delovanja ČN Bohinjska Bistrica, s tem pa tudi kvaliteto izvajanja storitve GJS čiščenja odpadnih voda.

Projekt še ni vključen v dogovor za razvoj regije, saj ne ustreza vsem kriterijem iz povabila. 29. 12. 2025 je bila sprejeta Uredba o aglomeraciji Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki v prilogi I določa Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. V ta seznam so uvrščene tudi aglomeracije občin Bohinj (zap. št. 5), Divača (zap. št. 14) in Vodice (zap. št. 120). Vse tri občine so oddale projektne predloge, ki še niso prejeli soglasja MNVP.


Vrednost projekta je še vedno enaka kot je bila v poslani dokumentaciji, da pa bo treba, glede na dejstvo, da projekt še vedno ni uvrščen v DRR, časovnico izvajanja prilagoditi.

Tabela 7: Projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

Naziv projekta	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	Skupaj
Nadgradnja CČN Radovljica	1.420.718,00	1.598.307,75	293.537,82	3.312.563,57
Opremljanje aglomeracije Kranj 2019	2.523.568,00	4.336.579	2.345.889,08	9.206.036,08
*Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica	335.803,08	407.174,12	78.990,00	821.967,20
Skupaj	4.280.089,08	6.342.060,87	2.718.416,90	13.340.566,85

** ŠTEVILKE NA PODLAGI VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA OBČINO BOHINJ ZA 2026; potek izvajanja bo treba prilagoditi*

Slika 5: Dogovor za razvoj Gorenjske regije; projekti odvajanja in čiščenja odpadnih vodnih virov, predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

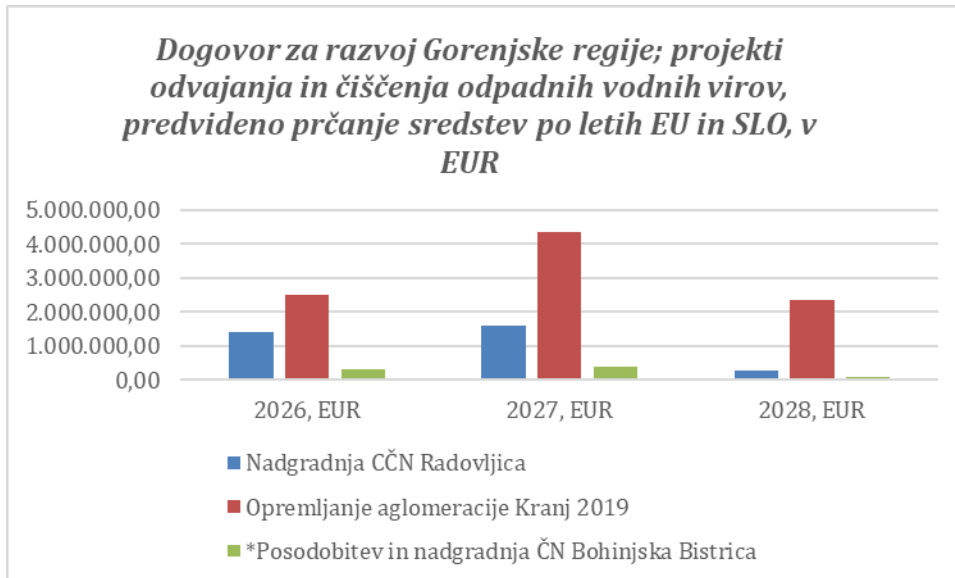

**ŠTEVILKE NA PODLAGI VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA OBČINO BOHINJ ZA 2026; potek izvajanja bo treba prilagoditi*

Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj

- **Nosilec projekta: Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)**
- Skupna vrednost investicije: 4.440.551,49 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 4.232.105,47 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 2.631.050,71 EUR; 62,17 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 28. 2. 2026, predhodno predvideno 10. 1. 2026
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: februar 2026, predhodno predvideno 31. 12. 2025
- Predviden datum izbora izvajalca: april 2026
- Predviden začetek del na terenu: september 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 2029
- Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0 , ob zaključku projekta: 7,9
- Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024 10.013, ob zaključku projekta 10.262

Namen projekta je posodobitev, razširitev in nadgradnja VS Kranj (ID 1190) na način, ki bo zagotavljal zmanjšanje vodnih izgub ter omogočil priključitev novih uporabnikov na javni sistem oskrbe s pitno vodo. Izvedba naložbe bo imela pozitivni učinek na vse prebivalce, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema, s posebnim poudarkom na prebivalcih občin Preddvor in Šenčur. Do leta 2029 naj bi bile urejene nove ali nadgrajene cevi v

distribucijskih sistemih javnega vodovoda v dolžini 7.900 m, 10.262 prebivalcev bo do leta 2030 priključenih na izboljšano vodovodno omrežje.

Na območju MO Kranj so morali predvideti novo traso vodovoda, zato bo zamik pri pridobitvi gradbenega dovoljenja – gradbeno dovoljenje za Bašelj že imajo in dela se že izvajajo, predvidoma bodo zaključena poleti 2026.

Januarja letos so oddali vlogo za gradbeno dovoljenje, pričakujejo, da bo izdano v februarju 2026.

Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170)

- **Nosilec projekta: Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)**
- Skupna vrednost investicije: 7.444.760,59 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 6.843.988,36 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 4.742.875,96 EUR; 69,30 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 15. 5. 2026, predhodno 1. 5. 2026; 31. 12. 2025
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 1. 4. 2026, predhodno 1. 3. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: 15. 9. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 1. 10. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2028
- Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0 , ob zaključku projekta: 8,99675
- Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024: 10.560, ob zaključku projekta 10.560

Namen projekta je posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170) na način, ki bo zagotavljal zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje energetske učinkovitosti vodovodnega sistema. Izvedba naložbe bo imela pozitiven učinek na vse prebivalce, ki se oskrbujejo iz VS Završnica.

Do leta 2029 naj bi bile urejene nove ali nadgrajene cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda v dolžini 8.996,75 m, 10.560 prebivalcev bo do leta 2029 priključenih na izboljšano vodovodno omrežje.

Projekt poteka v skladu z načrtom, imajo nekaj težav pri pridobivanju služnosti, kar pa ne bo vplivalo na dinamiko črpanja sredstev.

Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna

- **Nosilec projekta: Občina Gorje**
- Skupna vrednost investicije: 1.211.210,70 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.146.345,05 EUR

- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 702.491,50 EUR; 61,28 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 28. 2. 2026, predhodno 15. 2. 2025, 29. 12. 2025
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 15. 2. 2026, predhodno 31. 1. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: maj 2026
- Predviden začetek del na terenu: junij 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): oktober 2027
- Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0 , ob zaključku projekta: 3,73;
- Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024: 0, ob zaključku projekta 19,151

Namen projekta je posodobitev vodovodnega sistema Radovna (ID 1216) na način, ki bo zagotavljal zmanjšanje vodnih izgub in s tem izboljšanje snovne učinkovitosti sistem. Izvedba naložbe bo imela pozitivni učinek na vse prebivalce občine Gorje, posredno pa tudi na vse prebivalce, ki se oskrbujejo iz VS Radovna.


Do leta 2029 naj bi bile urejene nove ali nadgrajene cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda v dolžini 3.730 m, 10.151 prebivalcev bo do konca leta 2028 priključenih na izboljšano vodovodno omrežje. Vodne izgube bodo zmanjšale tako, da bo koeficient ILI izboljšan za 20 %.

Za projekt imajo že tri pravnomočna gradbena dovoljenja, čakajo še na eno – naročena je mejna obravnava, ki naj bi bila v roku dveh tednov. Pripravljajo že vlogo za NPO, ne pričakujejo sprememb pri predvideni dinamiki črpanja sredstev.

Tabela 7: Dogovor za razvoj Gorenjske regije; projekti oskrbe s pitno vodo, predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

Naziv projekta	2026	2027	2028	Skupaj
Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj	896.928,55	1.204.829,49	529.292,67	2.631.050,71
Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170)	1.327.414,54	1.946.841,50	1.468.619,92	4.742.875,96
Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna	185.911,88	516.579,62	0,00	702.491,50
Skupaj	2.410.254,97	3.668.250,61	1.997.912,59	8.076.418,17

Slika 6: Dogovor za razvoj Gorenjske regije; projekti oskrbe s pitno vodo, predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v

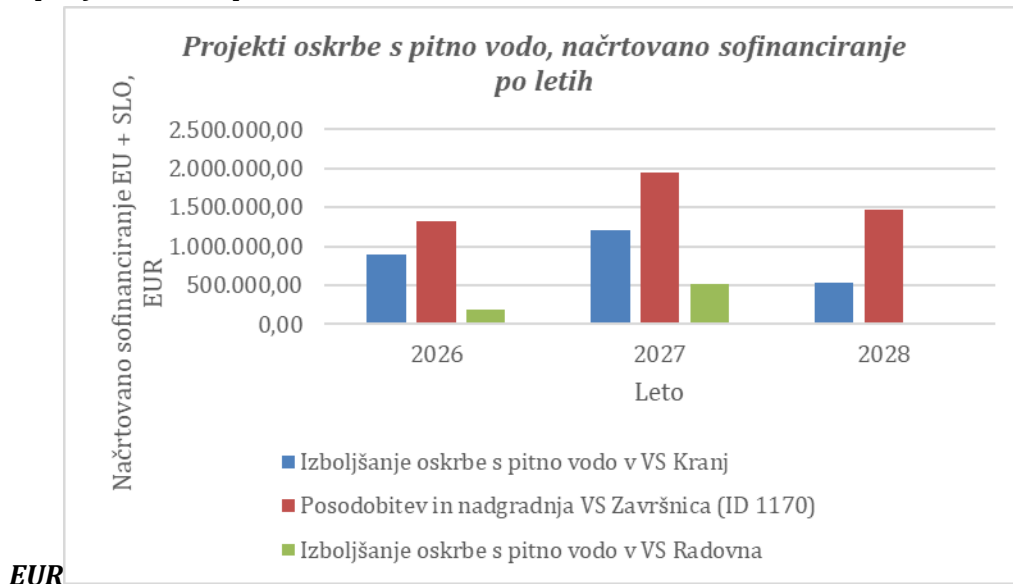

Specifični cilj: RSO 2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja; Evropski sklad za regionalni razvoj

Zeleno zaledje Škofje Loke

- **Nosilec projekta: Občina Škofja Loka**
- Skupna vrednost investicije: 1.104.915,62 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 720.281,91 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 501.848,44 EUR; 69,67 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 1.4.2026, ni spremembe
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: ni potrebno
- Predviden datum izbora izvajalca: 15. 5. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 1. 7. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja):
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 5,77
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe; leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 10.011

Namen investicije je ureditev širšega območja športno rekreacijskega parka Kamnitnik kot zelenega zaledja mesta Škofje Loke in s tem izboljšanje infrastrukturnih pogojev za šport in rekreacijo v občini, vzpostavitev urejenega območja urbanih vrtičkov ter revitalizacija ter

dograditev zelenih površin v neposredni bližini mestnega jedra, skupna površina 5,77 ha. S tem bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb in posledic ekstremnih vremenskih pojavov v mestu Škofja Loka (npr. vročinski ekstremi, suša, padavinski ekstremi) in zagotovili višjo kakovost bivanja.

Imajo že PZI za ureditev območja, projektna dokumentacija je vsa pridobljena. Verjetno bo skupna vrednost projekta za približno 5 % nižja od predvidene. Pri črpanju sredstev po letih ni predvidenih sprememb.

Zeleno srce mesta – faza 2

- **Nosilec projekta: Občina Tržič**
- Skupna vrednost investicije: 3.206.682,24 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.893.713,48 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.322.670,74 EUR; 69,85 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 10. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 4. 2026; predhodno 30. 3. 2026
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 28. 2. 2026, predhodno predvideno 31. 12. 2025
- Predviden datum izbora izvajalca: 30. 11. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 4. 1. 2027
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 10. 2029
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,5
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 2.331

Projekt Zeleno srce mesta - faza 2 predstavlja celovito trajnostno ureditev in ozelenitev parkirišča s tržnico in kakovostno preureditev zelenega obrečnega pasu Tržiške Bistrice, vključno z zagotovitvijo dostopnosti do vodotoka. Projekt vključuje: preureditev talnih površin parkirišča s tržnico, intenzivno ozelenitev parkirišča, urbano opremo, krajinsko-hortikulturno ureditev in razširitev zelenega obvodnega pasu z ureditvijo dostopov in poti; skupna površina 0,5 ha. Podlaga za urejanje je zmagovalna rešitev javnega arhitekturno-urbanistično-krajinskega natečaja (Vir: Elaborat urbanistične zmagovalne natečajne rešitve za ureditev atrija občinske stavbe in območja tržnice v Tržiču, a2o2 arhitekti, 2024.)

V letu 2026 bo marca zaključeno projektiranje in bo v tem letu oddan zahtevek za izdelavo projektne dokumentacije. Z izvedbo v 2026 še ne bodo začeli (oz. po sedanjih podatkih ne bomo začeli), vsekakor v 2026 ne bo nobenega zahtevka iz naslova izvedbe GOI del. Potrebno bo prilagoditi dinamiko črpanja sredstev.

Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru

- **Nosilec projekta: Občina Bled**
- Skupna vrednost investicije: 2.703.698,54 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 2.258.715,83 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.590.201,18 EUR; 70,40 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 31. 3. 2026, morda že do konca februarja 2026.
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: Vloga za gradbeno dovoljenje vložena 17. 11. 2025. Vloga je s strani UE pregledana in v teku je poziv k priglasiitvi zainteresiranih strank, predvidoma naj bi bilo GD izdano 16. 2. 2026, predhodno 31. 12. 2025.
- Predviden datum izbora izvajalca: jesen 2026
- Predviden začetek del na terenu: še v letu 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): jesen 2027
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 5,7
- Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 890

Namen projekta je sonaravna ureditev dela obale in izboljšanje kakovosti obstoječih parkovnih površin v skupni površini 5,57 ha na vzhodnem dela Blejskega jezera v urbanem središču Bleda.

Sprememba dinamike financiranja projekta: premikajo del sredstev iz 2026 v 2027!

Dokumentacija za obalni del je pripravljena, nekaj težav imajo s pridobitvijo stavbne pravice. Z deli bodo pričeli predvidoma v oktobru 2026, po zaključku turistične sezone; pogodba z izvajalcem naj bi bila podpisana do septembra 2026. Projekt se bo izvajal v glavnem v letu 2027, dela naj bi potekala približno 3 mesece.

Tabela 8: Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru – novo	134.972,20	328.875,00	1.126.353,98	0,00	1.590.201,18
Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru	463.847,20	0,00	1.126.353,98	0,00	1.590.201,18

Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem

- **Nosilec projekta: Občina Cerklje na Gorenjskem**
- Skupna vrednost investicije: 3.214.829,78 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 2.456.869,06 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.576.094,90 EUR; 63,92 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 7. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 31. 3. 2026, predhodno 28. 2. 2026
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: februar 2026; predhodno predvideno 31. 12. 2025
- Predviden datum izbora izvajalca: april 2026
- Predviden začetek del na terenu: junij 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): l. 2028
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,93
- Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 1.078

Namen naložbe je zagotovitev celostne in kakovostnejše krajinske ureditve, ozelenitve, razširitve, boljše poveztivosti in dostopnosti območja javnih površin v občinskem središču Cerklje na Gorenjskem, ki se raztezajo od parkovnega območja pri OŠ in Hribarjevi vili na severu prek osrednjega trga z javnimi stavbami do pokopališča na jugu; skupna površina 1,93 ha.

Pridobiti morajo še soglasje DRSV; lastništvo zemljišč še ni povsem urejeno. Javno naročilo bo objavljeno v februarju 2026. Predvidena dinamika črpanja sredstev ostaja nespremenjena.

Zeleno tromostovje Gorenja vas

- **Nosilec projekta: Občina Gorenja vas - Poljane**
- Skupna vrednost investicije: 2.284.706,53 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.962.860,70 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.521.566,54 EUR; 77,52 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 10. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 1. 6. 2026,
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 28. 2. 2026, predhodno 31. 1. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: september 2026
- Predviden začetek del na terenu: september 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2028
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,277
- Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 744

Namen naložbe je celostna in inovativna krajinska obnova in ozelenitev obvodnega zelenega pasu Poljanske Sore v naselju Gorenja vas, ki bo z novo krožno pešpotjo, ureditvijo

naravnega kopališča in izpostavitvijo posameznih elementov dediščine Rupnikove linije postal osrednja povezovalna zelena promenada med levim in desnim bregom ter med stanovanjskimi in centralnimi dejavnostmi občinskega središča; skupna površina 12.770 m².

Pri izvedbi projekta so naleteli na težavo zaradi poseganja v območje Natura 2000, Zavod za varstvo narave je razširil pristojnost na obrežje, so v postopku usklajevanja. Projekt bo zdaj še boljši! Začeli so s pripravo PZI. V aprilu 2026 naj bi izbrali izvajalca, v septembru 2026 pričeli z deli.

Zeleni sistem v Kranjski Gori

- **Nosilec projekta: Občina Kranjska Gora**
- Skupna vrednost investicije: 2.280.916,03 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 2.079.660,90 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.122.969,76 EUR; 54,00 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: april 2026, predhodno 31. 3. 2026
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: GD je v postopku na Upravni enoti, predvidoma naj bi bilo izdano konec februarja 2026, predhodno predvideno 21. 11. 2025.
- Predviden datum izbora izvajalca: avgust 2026
- Predviden začetek del na terenu: sep/okt 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): december 2028
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,21
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 625

Namen naložbe je celostna krajinska preobrazba in preureditev obstoječe 1,21 ha velike zelene in grajene razvrednotene javne površine v sklopu osrednjih območij za turizem v urbanem središču Kranjske Gore v kakovostno in sklenjeno zeleno javno površino, ki bo sonaravno ureja, odražala identiteto in biodiverziteto alpske krajine ter bolje povezana v smiselni zeleni sistem.

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se je nepričakovano pojavil stranski udeleženec, ki se z ureditvijo ne strinja – zaradi umika parkirnih prostorov; gre pa za površino, ki je v lasti Občine Kranjska Gora. To bi lahko bil razlog za zamudo pri črpanju sredstev. Za zdaj sprememba črpanja sredstev po letih še ni predvidena.

Ureditev območja pred KD Joža Ažmana

- **Nosilec projekta: Občina Bohinj**
- Skupna vrednost investicije: 1.322.658,15 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 690.013,50 EUR

- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 272.046,84 EUR; 39,43 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2027
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,59318
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 949

Predvidena je bila celostna ureditev zelene površine; 5.931,8 m² zelene površine.

Občina Bohinj je z dopisom dne 21. 1. 2026 obvestila BSC, d.o.o., Kranj, da od projekta odstopajo. Sredstva se bodo po sklepu Razvojnega sveta Gorenjske regije prerazporedila na druge projekte. Projekt je za zdaj še vedno uvrščen v dogovor za razvoj regije.

Ureditev in zazelenitev centra Žirov

- **Nosilec projekta: Občina Žiri**
- Skupna vrednost investicije: 2.054.442,04 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.463.459,80 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.146.873,96 EUR; 78,37 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 28. 2. 2026, ni spremembe
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: je gradbeno dovoljenje že pridobljeno? Da, obe potrebni gradbeni dovoljenji sta že pridobljeni. Eno gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25. 8. 2025 in postalo pravnomočno dne 8. 9. 2025, drugo GD pa je bilo izdano dne 4. 11. 2025 in je postalo pravnomočno dne 15. 11. 2025. Predhodno je bilo predvideno za 4. 11. 2025.
- Predviden datum izbora izvajalca: marec 2026
- Predviden začetek del na terenu: april 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2029
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,9344
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 1804

Namen projekta je prenova obstoječih zelenih površin v katerih se ohrani ali poveča velikost zelene površine, delež raščenege terena ter oblikovanje in opremljenost oziroma prenova obstoječih vodnih površin, v katerih se ohrani ali izboljša kakovost vode, ureditev in dostopnost priobalnega pasu. Nova ali izboljšana zelena infrastruktura v mestih bo javno dostopna in bo sledila načelom na naravi temelječih rešitev (angl. Nature-based Solutions, NBS).

Projektna dokumentacija je popolna. Objavljen je bil že razpis – javno naročilo, rok za ponudbe je 17. 2. 2026. V mesecu marcu naj bi bil izbran izvajalec. Predvidoma se bo nekoliko zvišala vrednost projekta, a ne več kot za 20 %. Verjetno bo potrebna sprememba dinamika črpanja evropskih sredstev, projekt bo morda zaključen prej kot predvideno.

Tabela 9: Projekti Zelene infrastrukture – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

Projekti	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Zeleno zaledje Škofje Loke	116.693,42	186.145,24	156.693,42	42.316,36	501.848,44
Zeleno srce mesta – faza 2	139.892,08	680.395,20	502.383,46	0,00	1.322.670,74
Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru – novo	134.972,20	328.875,00	1.126.353,98	0,00	1.590.201,18
Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem	1.007.499,96	568.594,94	0,00	0,00	1.576.094,90
Zeleno tromostovje Gorenja vas	456.469,96	912.939,94	152.156,64	0,00	1.521.566,54
Zeleni sistem v Kranjski Gori	109.681,90	457.559,46	555.728,40	0,00	1.122.969,76
Ureditev območja pred KD Joža Ažmana*	0,00	272.046,84	0,00	0,00	272.046,84
Ureditev in zazelenitev centra Žirov	609.944,80	162.901,50	132.543,38	241.484,28	1.146.873,96
Skupaj	2.575.154,32	3.569.458,12	2.625.859,28	283.800,64	9.054.272,36

*Občina Bohinj je z dopisom dne 21. 1. 2026 obvestila BSC, d.o.o., Kranj, da od projekta odstopajo. Sredstva se bodo prerazporedila na druge projekte. Za zdaj je projekt še vključen v DRR.

Pripravila:
Andreja Erdlen, sekretarka

Marko Drofenik
Namestnik generalnega direktorja
Direktorata za regionalni razvoj

Številka: 3030-41/2023-1630-178

Ljubljana, 24. 2. 2026
