

KC 1

#zajem

Projekt e-ARH.si: ESS 2016 – 2020

Šesti delovni sestanek projektne skupine e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Kompetenčni center 1 (KC1)

9.20 – 10.20

Tatjana Hajtnik

Vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Ljubljana 15. oktober 2019

Naloge KC1

KC1.1
STROKOVNO-TEHNIČNA NAVODILA
31.12.2019
Tatjana Hajtnik

KC1.4
OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih
31.10.2020
Tatjana Hajtnik

KC1.2
PILOTSKI PREVZEMI
31.10.2020
Aleksandra Mrdavšič

KC1.5
PROGRAMSKA ORODJA
30.10.2020
Tatjana Hajtnik

KC1.3
NP in USPOSABLJANJA
1.10.2020
Jože Škofljanec

KC1.6
PREDPISI
30.6.2019
Tatjana Hajtnik

KC1.1
STROKOVNO-TEHNIČNA NAVODILA
31.12.2019
Tatjana Hajtnik

KC1.1

STROKOVNO-TEHNIČNA NAVODILA (pSTN)

KC1.1 pSTN – EKIPA

ARS

Aleksandra Mrdavšič
Anja Paulič
Boris Domajnko
Tine Završnik
Tatjana Hajtnik
Jože Škofljanec
Aida Škoro Babić
Klavdija Krivec
Maja Povalej

RA

Drago Trpin (PANG)
Hana Habjan (ZAL)
Hedvika Zdovc (ZAC)
Jože Glavič (ZAL)
Nataša Majerič (ZAP)

KC1.1 STROKOVNO TEHNIČNA NAVODILA - podnaloge

- **R_KC1.1.3 Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV (SKUPNI DELI)**
 - *R_KC1.1.1 Metodologija priprave STN*
 - *R_KC1.1.2 Seznam identificiranih vrst eAG*
 - **R_KC1.1.3 Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV (skupni deli)**
 - **R_KC1.1.3.1 Vprašalnik po vrstah eAG**
 - **R_KC1.1.3.2**
 - .. → **Predloge STN za posamezne vrste eAG: NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV**
 - ... → **(vsebina in struktura SIP, formati, nosilci itd.)**
 - **R_KC1.1.3.8**
 - *R_KC1.1.4 Implementacija pSTN (pri pilotskih prevzemih)*

Koncept pSTN

PISNA STROKOVNA NAVODILA ZA ODBIRANJE IN IZROČANJE (PSN)

(ZVDAGA, 34 člen)

predloga pSTN

I. SPLOŠNI DEL

1. Uvodne določbe
2. Področja urejanja
3. Pomen izrazov
4. Vsebinska in teh. urejenost eAG
5. Postopek priprave gradiva s spremljajočo dokum.
6. Postopek in način izročitve eAG
7. ...

II. PODROČNE pSTN

1. NS
2. @
3. www
4. Geo
5. ISUD
6. Pbaze
7. A/V

Specifične zaht. npr:


- Formati
- Metapodatki
- SIP

KC1.1 Strokovno-tehnična navodila napredek po 13. 6. 2019

Oznaka	Rezultat	Napredek (%)
R_KC1.1.1	Metodologija priprave STN	100
R_KC1.1.2	Seznam identificiranih vrst eAG	100
R_KC1.1.3	Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV (skupni deli)	(22) -23
R_KC1.1.4	Implementacija pSTN (pri pilotskih prevzemih)	0

KC1.1 Strokovno-tehnična navodila napredek po 13. 6. 2019

Oznaka	Rezultat	Napredek (%)
R_KC1.1.1	Metodologija priprave STN	100
R_KC1.1.2	Seznam identificiranih vrst eAG	100
R_KC1.1.3	Predloge STN po vrstah eAG - NS, DB, ISUD, @, www, Geo, AV (skupni deli)	(22) -23
R_KC1.1.4	Implementacija pSTN (pri pilotskih prevzemih)	0

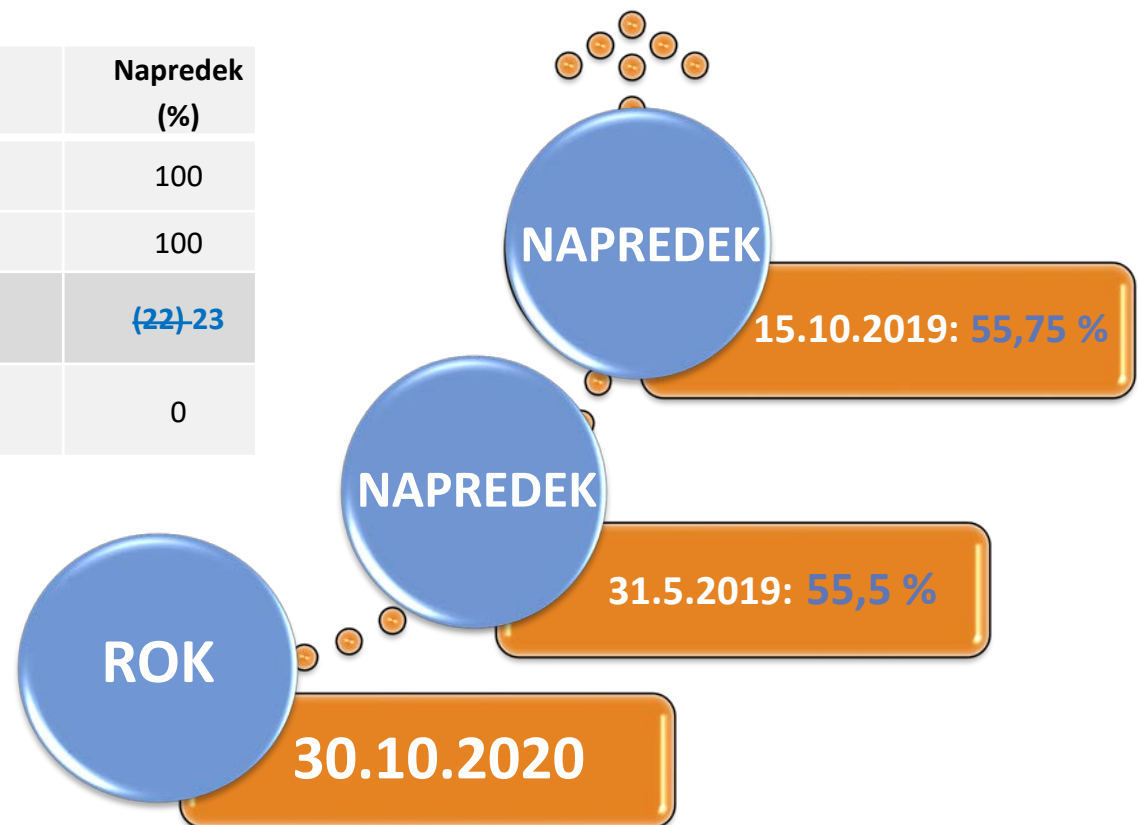

KC1.2
PILOTSKI PREVZEMI
31.10.2020
Aleksandra Mrdavšič

KC1.2
PILOTSKI PREVZEMI
31.10.2020
Aleksandra Mrdavšič

KC1.2 PILOTSKI PREVZEMI

KC1.2.2 Načrt prevzemov

Koordinira: Anja Paulič



KC1.2 PILOTSKI PREVZEMI

KC1.2.2 Načrt prevzemov

.....

KC1.2.2.3 Pilot prevzema 3: Državni zbor (zvočni zapisi)

Koordinira Jože Glavič

Namen:

- **Pridobiti uporabniško izkušnjo** (*predlog predstavitve na konferenci*)
- Izdelati SIP z Urejevalnikom SIP na primeru zvočnih zapisov (profil,...)
- Preveriti celoten postopek od priprave SIP, prevzema, uvoza v scopeArchive, dostop preko VAČ
- Preveriti celoten postopek
- Sodeluje: Državni zbor (Bojan Verbič)
- Gradivo: seje Državnega zbora (digitalizirane, izvorno digitalne)

KC1.3
NP in USPOSABLJANJA
1.10.2020
Jože Škofljanec

KC1.3.1.1 Metodologija poenotenja usposabljanj v SJAS

Aleksandra Mrdavšič

KC1.3.1.2 Katalog znanj

Maja Povalej

KC1.3.3 Usposabljanje za pripravo NP

Jože Škofljanec



KC1.3.4 Svetovanje za pripravo, uvedbo, izvajanje in vzdrževanje NP za zaposlene SJAS in ustvarjalce

Jože Škofljanec

KC1.4
OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih
31.10.2020
Tatjana Hajtnik

KC1.4

OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na področju dolgoročne hrambe e-gradiva



KC1.4 OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na področju dolgoročne hrambe e-gradiva - EKIPA

ARS

Anja Paulič
Tine Završnik
Tatjana Hajtnik
Aida Škoro Babić
Klavdija Krivec


RA

Uroš Lavrenčič Mugerli (PANG)
Hana Habjan (ZAL)
Urh Kopitar (ZAC)
Jože Glavič (ZAL)
Nataša Majerič (ZAP)

KC1.4 OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na področju dolgoročne hrambe e-gradiva - NAPREDEK

Oznaka	Izdelek	Planiran zaključek	Napredek
R_KC1.4.1	Razvoj metodologije		100 %
R_KC1.4.2	Nabava programskega orodja z morebitnimi dopolnitvami ali razvoj za izvedbo ocene tveganja		18,75% 19 %
R_KC1.4.2.1	<i>Raziskava tržišča</i>		75% 76%
R_KC1.4.2.2	<i>Javno naročilo (specifikacija, razpisna dok., izbira, pogodba)</i>		0%
R_KC1.4.2.3	<i>Namestitev in konfiguracija orodja, navodila</i>		0%
R_KC1.4.2.4	<i>Šolanje uporabnikov v arhivih)</i>		0%
R_KC1.4.3	<i>Pilotske izvedbe ocen in upravljanj s tveganji pri ustvarjalcih</i>		0%
R_KC1.4.3.1	<i>Načrt pilotov in izbira ustvarjalcev vključno z dogovori o sodelovanju</i>		0%
R_KC1.4.3.2	<i>Usposabljanje ustvarjalcev za uporabo orodja</i>		0%
R_KC1.4.3.3	<i>Izdelava ocene tveganja in načrta za upravljanje s tveganji pri izbranih ustvarjalcih</i>		0%

KC1.4 Ocena tveganj pri ustvarjalcih na področju dolgoročne e-hrambe – ROK IN SKUPNI NAPREDEK

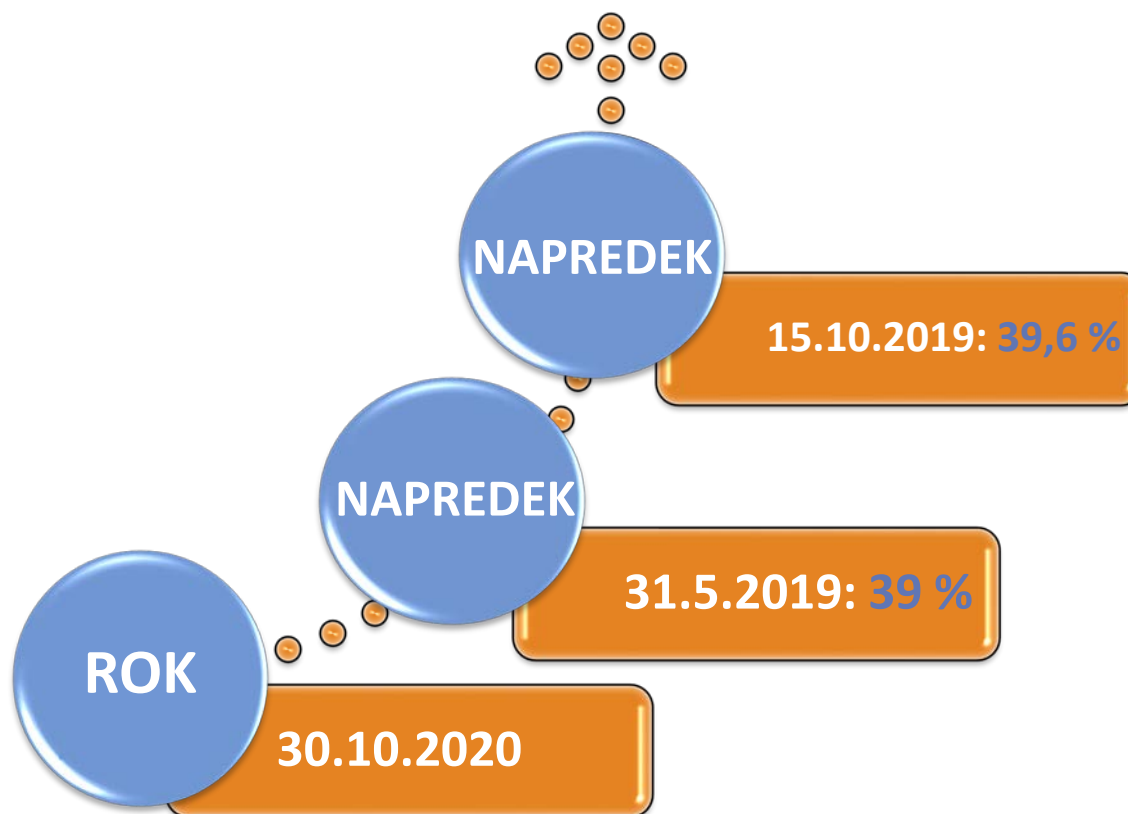

KC1.5
PROGRAMSKA ORODJA
30.10.2020
Tatjana Hajtnik

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (PETZ)

KC1.5.5 Koordinacija in spremljanje razvoja Urejevalnika SIP
(koordiniral Vladimir Torov, po 15.5.2019 prevzela Anja Paulič)

KC1.5.7 Testiranje
(koordinacija Anja Paulič)

KC1.5.8 Prenos, implementacija in integracija Urejevalnika SIP v
obstoječe okolje e-ARH.si

Dne 13.6.2019 na petem projektnem sestanku:

- Beta testiranje **Urejevalnika SIP, ver. 1.2**
- testiramo člani KC1
- 6 pozivov na testiranje
- cca. 20 odzivov
- prijavljenih 138 napak
- zadnji rok za prijavo napak je 14. 6. 2019

1.1 → 1.2 → ???



Razvoj Urejevalnika SIP od verzije 1.2 naprej



Predmet prevzema 30. 09. 2019:

- Programsko orodje Urejevalnik SIP, ver 2.0
- Izvorna kodo za Urejevalnik SIP 2.0
- Uporabniška navodila – napredni, 44 strani
- Uporabniška navodila – 65 strani

QNAP:


/ESS/kc1/aTemp/___Beta Testiranje SIP//Verzija 2.0

Garancijska doba: 30. 09. 2021

Plan: v 2020 po potrebi izboljšana različica 3.0



KC1.5 Razvoj in testiranje Urejevalnika SIP v 2019 – število ur

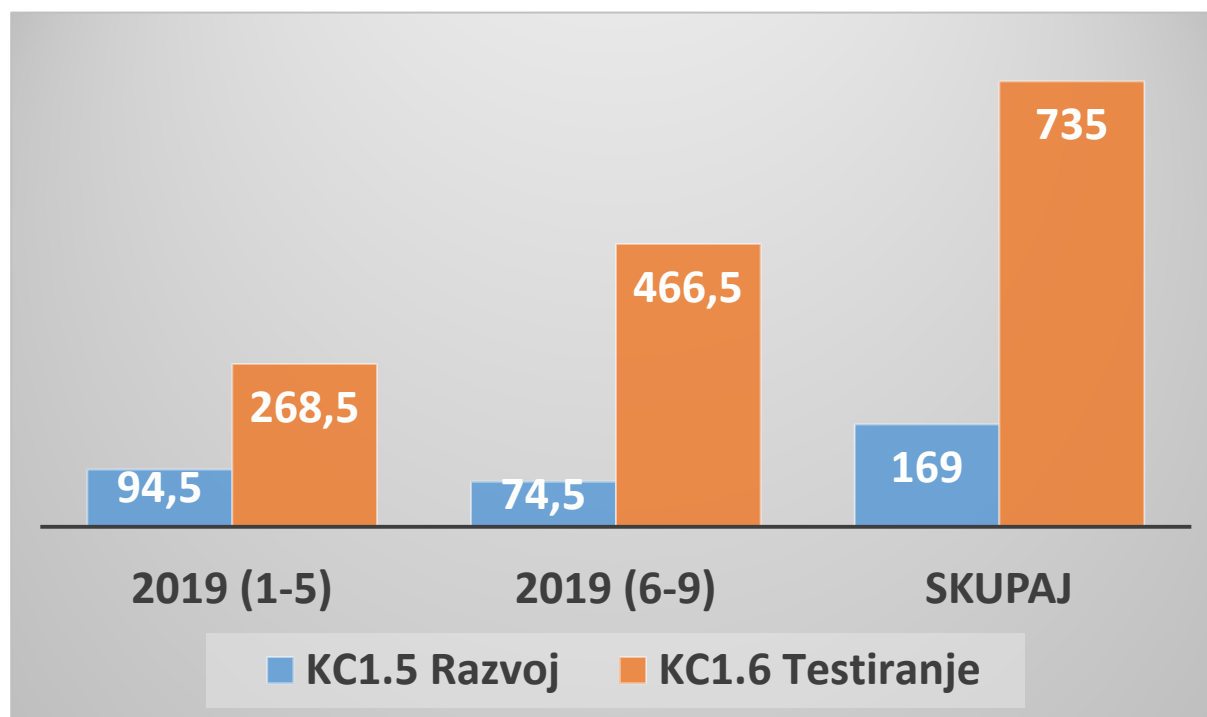

Predstavitev programskega orodja

Urejevalnik SIP 2.0

Maja Ferle, *Noema Cooperating d.o.o*

KC1.6
PREDPISI
30.6.2019
Tatjana Hajtnik

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (PETZ)

KC1.6 PREDPISI (P-ETZ)- EKIPA

ARS

Tatjana Hajtnik

Boris Domajnko

Jože Škofljanec

Tine Završnik

Klavdija Krivec

Primož Tanko

Vlado Torov

*KC5 (Nada Čibej, Damjan Lindental,
Gregor Jenuš,...)*

RA

Miran Novak (PAM)


PRAVILNIK ETZ (PETZ)

– postopek priprave


- **PETZ – različica 0.25 (Februar 2019):**
 - *Neformalno usklajevanje 11.2.2019 – 9.4.2019*
 - *16 odzivov*
- **PETZ – različica 0.32:**
 - *29. 5. 2019 Poslano na MK različica 0.31*
 - 18. 6. 2019 Odziv MK – pravni pregled
 - 29. 7. 2019 Poslano na MK za objavo na e-demokracija
 - **6. 8. 2019 PETZ, različica 0.32**
 - ***objavljen na portalu e-demokracija***
 - *rok za zbiranje pripomb 9. 9. 2019*
 - *prispelo 19 odzivov (do roka 15, po roku do 23.9.2019 še 4)*
 - *v začetku oktobra obravnava pripomb v okviru del. skupine*



P-ETZ (različica 0.32)

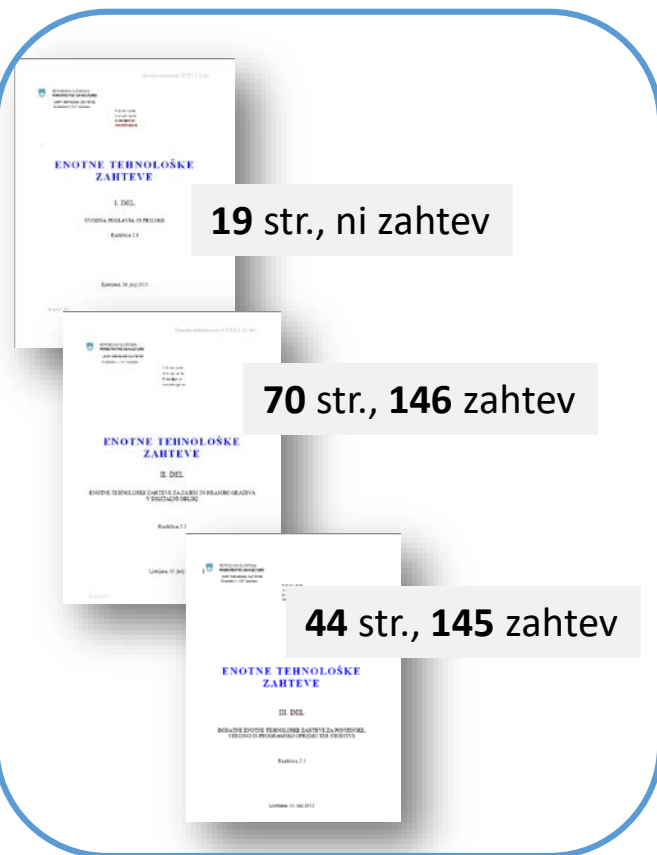


Skupaj: 133 strani, 291 zahtev

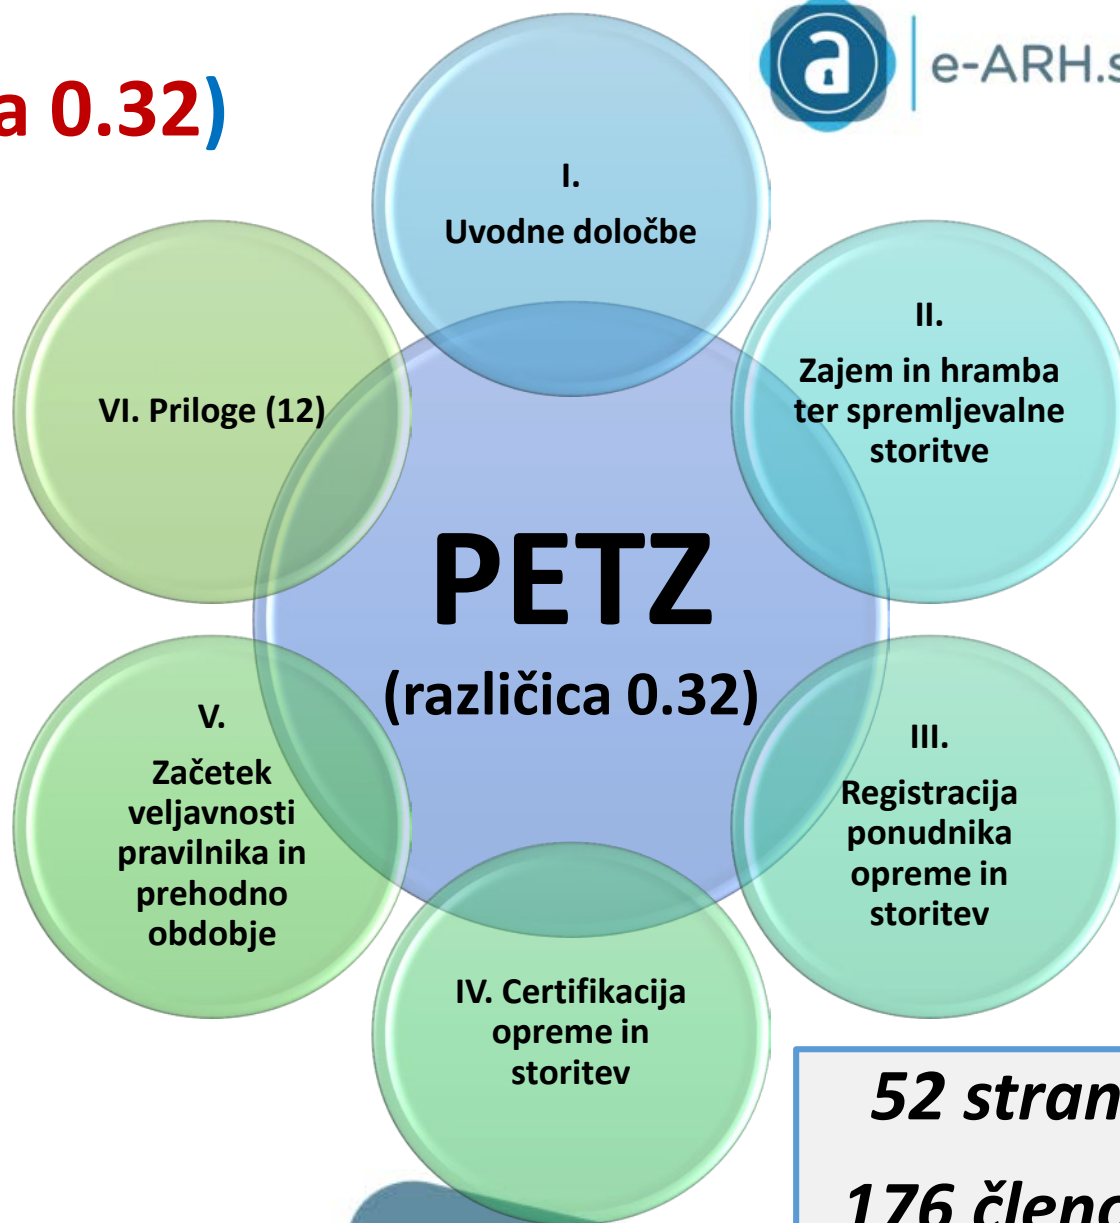


52 strani
176 členov

P-ETZ (ver 0.32)

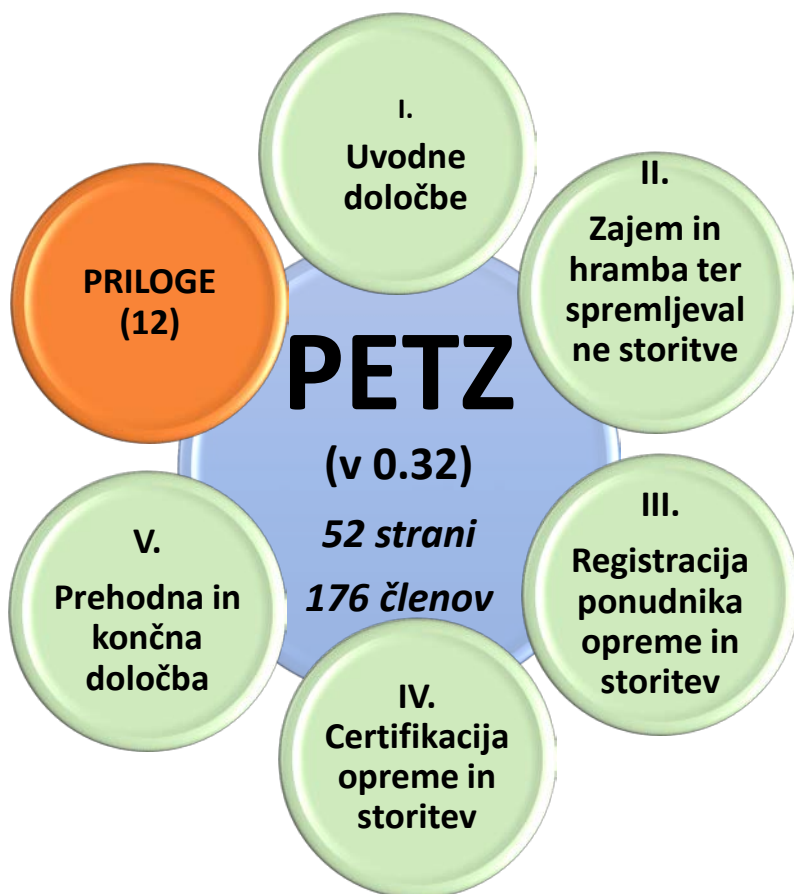


1	Zahteva za potrditev NP
2	Zahteva za potrditev VNP
Splet	KS za samoocenitev in potrditev NP
Splet	Izbor oblik zapisa, primernih za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki
5	Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za izvajanje storitev
6	Zahteva za certificiranje strojne opreme
7	Zahteva za certificiranje programske opreme
8	Zahteva za certificiranje storitev
Splet	KS za samoocenitev in certificiranje strojne in programske opreme ter storitev
Splet	Zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezen funkcionalni tip programske opreme
	Mapiranje ETZ_2.1 v P-ETZ
	Mapiranje P-ETZ v ETZ_2.1

KC1.6 PREDPISI (P-ETZ) – število ur

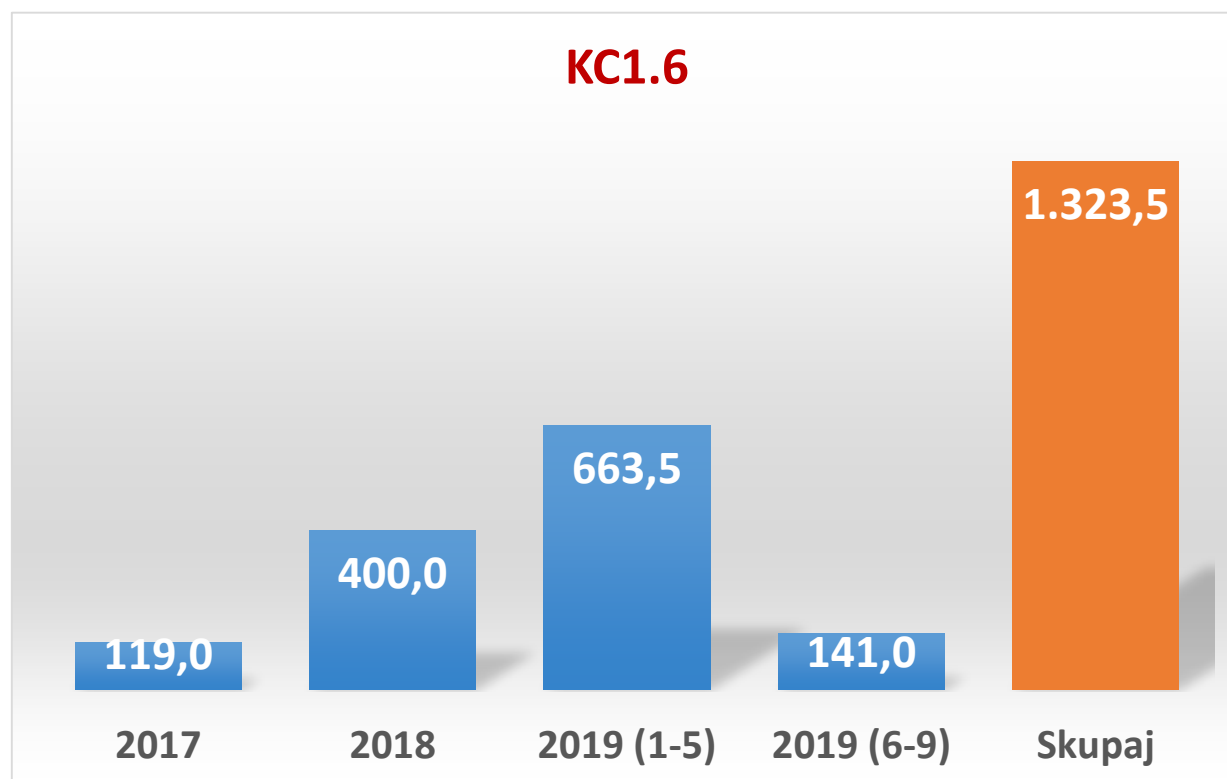

KC1.6 PREDPISI (P-ETZ)

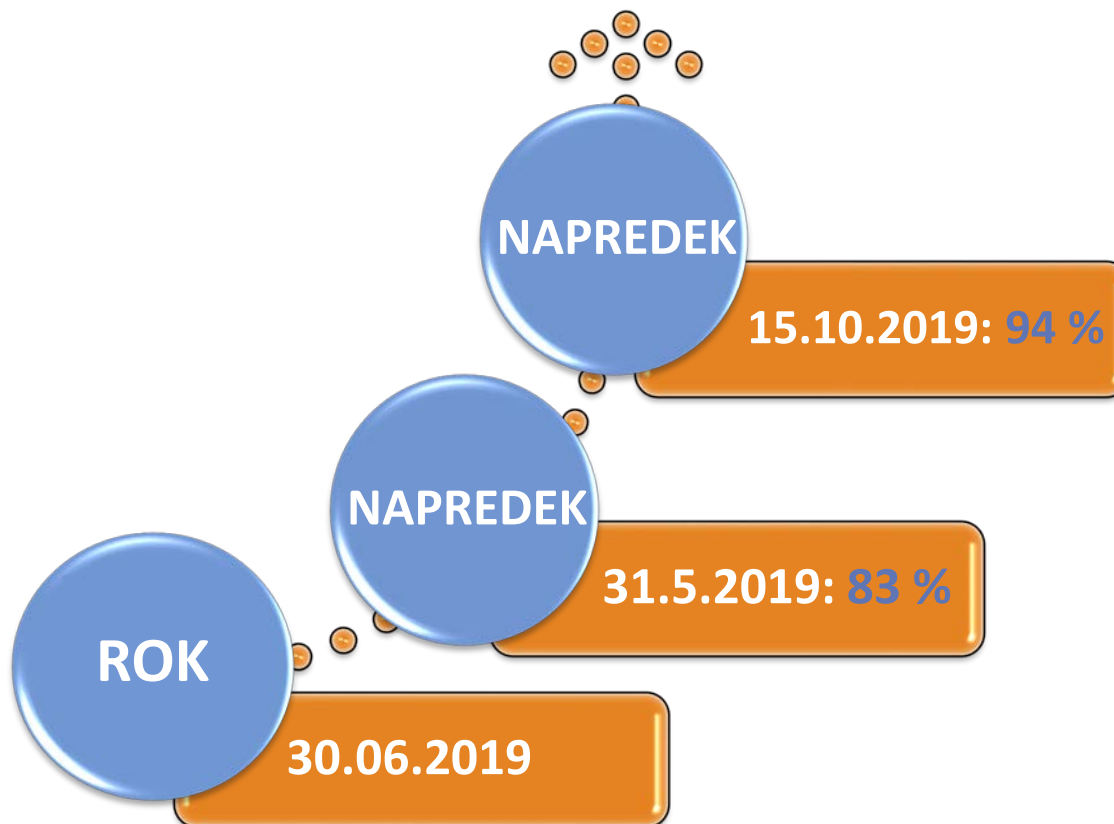

Šesti delovni sestanek projektne skupine e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Hvala za pozornost!

Tatjana Hajtnik

Vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Ljubljana 15. oktober 2019
