



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Julij 2026



Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

Razpoložljiva/prejeta sredstva iz Evropske unije:

MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST	Razpoložljiva sredstva	Prejeta sredstva*	Realizacija
Nepovratna sredstva	1,61 mrd EUR	1,34 mrd EUR	83,2 %
Posojila	469 mio EUR	466 mio EUR	99,4 %
SKUPAJ	2,08 mrd EUR	1,81 mrd EUR	87,0 %

* Časovnica izplačil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost:

- Predplačilo nepovratnih sredstev – 231 milijonov EUR nepovratnih sredstev ([september 2021](#));
- 1. zahtevak za plačilo – 50 milijonov EUR za 1. obrok nepovratnih sredstev ([april 2023](#));
- Predplačilo nepovratnih sredstev REPowerEU – 24 milijonov EUR ([december 2023](#));
- 2. zahtevak za plačilo – 536 milijonov EUR za 2. in 3. obrok nepovratnih sredstev ter 1. obrok posojil ([december 2023](#));
- 3. zahtevak za plačilo – 258 milijonov EUR plačila za 4. obrok nepovratnih sredstev in 2. obrok posojil ([oktober 2024](#));
- 4. zahtevak za plačilo – 440 milijonov EUR plačila za 5. in 6. obrok nepovratnih sredstev in 3. obrok posojil ([november 2025](#));
- 5. zahtevak za plačilo – 230 milijonov EUR plačila za 7. obrok nepovratnih sredstev ([april 2026](#));
- 6. zahtevak za plačilo – 41 milijonov EUR plačila za 8. obrok nepovratnih sredstev ([julij 2026](#)).

Izplačila končnim prejemnikom – nosilcem projektov:


Izplačila iz proračunskega sklada NOO** od 1. 2. 2020 →	do 31. 12. 2025	do 31. 7. 2026
** Evropska sredstva za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO.	1,31 mrd EUR	1,71 mrd EUR

Slovenija prejela plačilo šestega zahtevka

- Evropska komisija (EK) je **31. julija 2026 Sloveniji izplačala 41 milijonov EUR nepovratnih sredstev** iz Mehanizma za okrevanje.
- Slovenija je zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov/ciljev šestega zahtevka in zato prejela maksimalno plačilo.

Šesta sprememba Načrta za okrevanje in odpornost

- 10. julij 2026 – Svet EU je odobril šesto spremembo načrta.
- 18. junij 2026 – EK je pozitivno ocenila predlog šeste spremembe načrta.
- 26. maj 2026 – Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog šeste spremembe načrta in ga posredovala v potrjevanje v Bruselj.

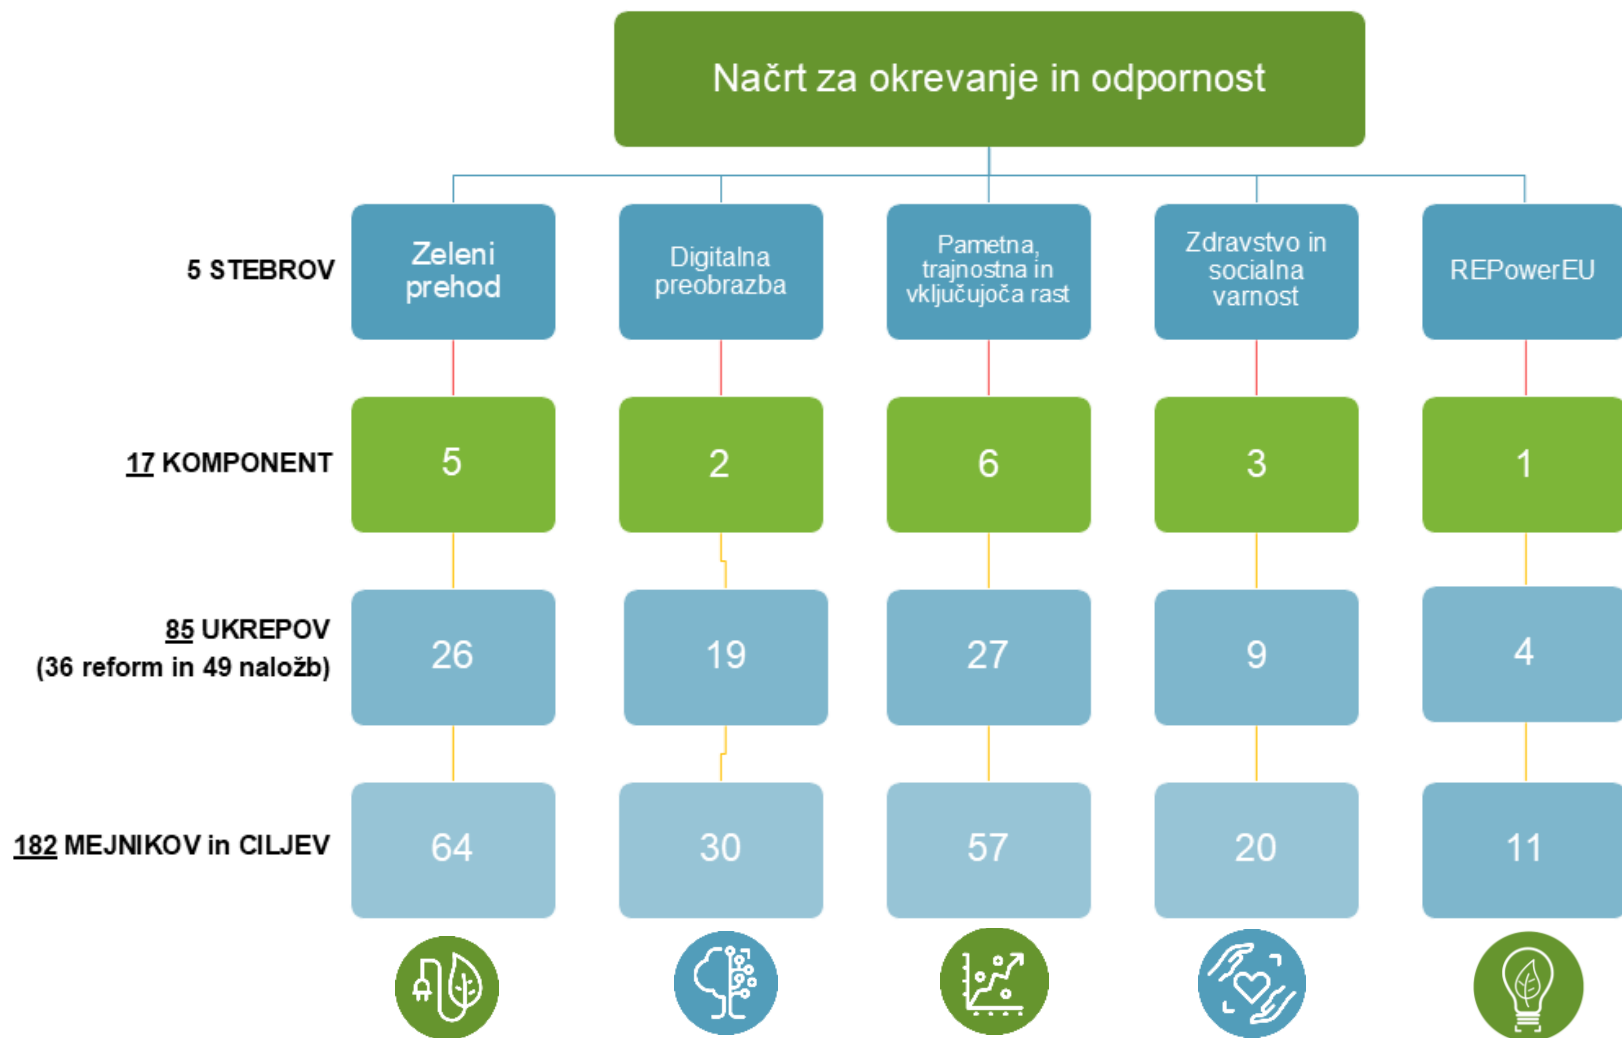

Razpoložljiva sredstva za izvedbo ukrepov po šesti spremembi načrta ostajajo nespremenjena – **1,61 milijarde EUR nepovratnih sredstev** in 469 milijona EUR posojil.

Načrt vključuje 85 ukrepov, od tega 36 reform in 49 naložb, s katerimi je povezanih **182 mejnikov in ciljev**.

Zaključevanje Načrta za okrevanje in odpornost

- 30. junij 2026 = [okvirni časovni razpored za dokončanje predvidenih mejnikov/ciljev ter izvajanja reform in naložb](#), zapisan v Izvedbenem sklepu Sveta EU o odobritvi ocene slovenskega načrta (Izvedbeni sklep Sveta EU).
- 31. avgust 2026 = skrajni rok za zaključek predvidenih mejnikov/ciljev ter reform in naložb, predviden v [uredbi EU 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost](#) (Uredba EU).
- 30. september 2026 = rok za oddajo zadnjega zahtevka za plačilo EK, predviden v finančnem sporazumu med Slovenijo in EK o izvajanju načrta.
- 31. december 2026 = rok za izplačilo zadnjega zahtevka, predviden v Uredbi EU.

Vsebinsko izvajanje

- Formalno izpolnjevanje mejnikov/ciljev oceni EK ob obravnavi zahtevka za plačilo.
- EK je Sloveniji do zdaj **izplačala maksimalni možen znesek vseh šestih zahtevkov za plačilo razpoložljivih sredstev NOO**, saj je izpolnila **vseh 122 z njimi povezanih mejnikov/ciljev**.

Mejniki in cilji izplačanih zahtevkov

Zahtevki za plačilo in obroki	Izpolnjeni mejniki/cilji po oceni EK
<u>1. zahtevek</u> = 1. obrok za nepovratna sredstva	12
<u>2. zahtevek</u> = 2. in 3. obrok za nepovratna sredstva ter 1. obrok za posojila	44
<u>3. zahtevek</u> = 4. obrok za nepovratna sredstva ter 2. obrok za posojila	8
<u>4. zahtevek</u> = 5. in 6. obrok za nepovratna sredstva ter 3. obrok za posojila	27
<u>5. zahtevek</u> = 7. obrok za nepovratna sredstva	16
<u>6. zahtevek</u> = 8. obrok za nepovratna sredstva	15
	122

Vsebinsko izvajanje

Sedmi (zadnji) zahtevek za plačilo

Predvidena oddaja zahtevka EK: september 2026

Sestava zahtevka: 9. obrok za nepovratna sredstva in 4. obrok za posojila

Vrednost zahtevka: 271,77 milijona EUR, od tega 268,67 milijona EUR nepovratnih sredstev in 3,1 milijona EUR posojil

Število mejnikov in ciljev: 60

Pogoji za izplačilo celotne vrednosti zahtevka: izpolnitev vseh z zahtevkom povezih mejnikov/ciljev in ohranitev veljave mejnikov/ciljev na naložbah in reformah, za katere je sredstva prejela v okviru že izplačanih zahtevkov za plačilo.

Vsebinsko izvajanje

Realizacija mejnikov in ciljev sedmega zahtevka za plačilo

- **31. avgusta 2026** poteče **skrajni rok za izvedbo aktivnosti za izpolnitev mejnikov/ciljev** po Uredbi EU, potem ko je 30. junija 2026 potekel rok okvirnega časovnega razporeda po Izvedbenem sklepu Sveta EU.
- Glede na skrajni rok za izvedbo aktivnosti za izpolnitev mejnikov/ciljev je po oceni ministrstev od skupno **60 mejnikov/ciljev sedmega zahtevka**:
 - v celoti izpolnjenih 26 = dosežene njihove ciljne vrednosti + predložena vsa dokazila;
 - v zaključevanja 34 mejnikov/ciljev, od tega so pri 24-ih ciljne vrednosti že dosežene.

Obroki sedmega (zadnjega) zahtevka za plačilo in obroki	Mejniki/cilji			
	Vsi po Izvedbenem sklepu Sveta EU	Izpolnjeni v celoti po oceni pristojnih ministrstev	V procesu zaključevanja	
			Ciljne vrednosti že dosežene, treba predložiti še dokazila	Ciljne vrednosti še niso dosežene
9. obrok za nepovratna sredstva	47	21	18	8
4. obrok za posojila	13	5	6	2
	60	26	24	10

Stanje - Deveti obrok nepovratnih sredstev = 47 mejnikov/ciljev

Mejnik/cilj			Odgovorno ministrstvo	Ciljna vrednost dosežena	Predložena dokazila	Status po oceni odgovornega ministrstva glede na skrajni rok predviden v uredbi EU 31. avgust 2026
Št.	Šifra	Naziv in ciljne vrednosti				
1.	T7	Število zgrajenih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj – 838 postaj	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
2.	T7bis	Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) – 260 kilometrov	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
3.	T25	Prenove stavb - 59.574 m2	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
4.	T31	Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi – 1.000 udeležencev	MORS	Da	Da	Izpolnjen
5.	T35	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami – 7 projektov	MOP	Da		V zaključevanju
6.	T35bis	Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda	MOP	Da		V zaključevanju
7.	T41	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo – 3 sistemov	MOP	Da		V zaključevanju
8.	T45	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo – 3 sistemov	MOP	Da		V zaključevanju
9.	T62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa – 70 kilometrov	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
10.	T65	Registracija polnilnih mest za brezemisijška vozila v nacionalnem registru polnilnih mest za električna vozila – 448 polnilnih mest	MZIE			V zaključevanju
11.	T76	Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa – 20 projektov	MGDŠ	Da		V zaključevanju
12.	T84	Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov – 7 poročil	MGDŠ	Da		V zaključevanju
13.	T96	Izplačilo 2.000.000 EUR – na projektu SiQUID	URSIV			V zaključevanju
14.	T98	Število potrdil o udeležbi, izdanih za dejavnosti usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor– 40.000 potrdil	MNZJU	Da	Da	Izpolnjen

Mejnik/cilj			Odgovorno ministrstvo	Ciljna vrednost dosežena	Predložena dokazila	Status po oceni odgovornega ministrstva glede na skrajni rok predviden v uredbi EU 31. avgust 2026
Št.	Šifra	Naziv in ciljne vrednosti				
15.	T99	Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom - 6.838 gospodinjstev	MNZJU	Da		V zaključevanju
16.	T104	Število e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva – 32 e-storitev	MKM	Da		V zaključevanju
17.	T105	Število informacijskih sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem pravosodja – 11 sistemov	MP	Da		V zaključevanju
18.	T108	Število aplikacij IT, povezanih s področjem izobraževanja – 11 aplikacij	MIZM	Da	Da	Izpolnjen
19.	T109	Število e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kulture – 6 e-storitev	MK			V zaključevanju
20.	M109bis	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU	MIZM			V zaključevanju
21.	T115	Izvajanje projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda – 4 projekti	MIZM	Da		V zaključevanju
22.	T118	Izvajanje projektov na področju zelenega prehoda – 122 projektov	MGDŠ	Da	Da	Izpolnjen
23.	T119	Pogodbe za podporo raziskovalcem – 33 pogodb	MIZM	Da	Da	Izpolnjen
24.	T122	Izvajanje RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov – 21 projektov	MGDŠ	Da	Da	Izpolnjen
25.	T130	Število projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva – 59 projektov	MGDŠ	Da		V zaključevanju
26.	T132	Število projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja – 198 projektov	MLSKRR	Da		V zaključevanju
27.	T134	Razvoj, nadgradnja ali razširitev ekonomsko-poslovnih površin – 11 območij	MLSKRR	Da	Da	Izpolnjen
28.	T151	Projekti glede turističnih nastanitev – 35 projektov	MGDŠ			V zaključevanju
29.	T155	Prenovljeni objekti kulturne dediščine – 15 objektov	MK	Da		V zaključevanju

Mejnik/cilj			Odgovorno ministrstvo	Ciljna vrednost dosežena	Predložena dokazila	Status po oceni odgovornega ministrstva glede na skrajni rok predviden v uredbi EU 31. avgust 2026
Št.	Šifra	Naziv in ciljne vrednosti				
30.	T158a	Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih – 14 projektov	MIZM	Da		V zaključevanju
31.	T158c	Programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti – 20 programov	MIZM	Da	Da	Izpolnjen
32.	T159	Prenovljeni visokošolski študijski programi – 67 programov	MIZM	Da		V zaključevanju
33.	T161	Pilotni projekti za prenovo visokošolskega izobraževanja za zeleni in/ali digitalni prehod – 30 projektov	MIZM	Da		V zaključevanju
34.	T162	Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno – 41 programov	MIZM	Da	Da	Izpolnjen
35.	T163	Projekti za usposabljanje mentorjev – 2 projekta	MIZM	Da		V zaključevanju
36.	T166	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove – 7 ustanov	MIZM	Da	Da	Izpolnjen
37.	T184bis	Zagotovljena usposabljanja o paliativni oskrbi, geriatričnih stanjih, duševnem zdravju in mišično-skeletnih bolečinskih stanjih – 4 programi usposabljanj	MZ	Da	Da	Izpolnjen
38.	T188	Gradnja heliporta	MZ	Da	Da	Izpolnjen
39.	T189	Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč – 38 vozil	MZ	Da	Da	Izpolnjen
40.	T191	Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor – 4 pospeševalniki	MZ	Da	Da	Izpolnjen
41.	M192	Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze	MZ			V zaključevanju
42.	T215	Dolžina distribucijskega omrežja – 227 kilometrov	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
43.	T215bis	Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega) – 806 kilometrov	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
44.	T217	Število sofinanciranih hranilnikov električne energije – 56 projektov	MZIE	Da		V zaključevanju
45.	T219	Registrirana polnilna mesta za brezemisijška vozila – 484 polnilnih mest	MZIE			V zaključevanju
46.	T220	Dobavljeni električni avtobusi in avtobusi na vodik – 5 avtobusov	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
47.	T221	Sofinanciranje brezemisijških vozil – 7.925 vozil	MZIE			V zaključevanju

Stanje - Četrty obrok za posojila = 13 mejnikov/ciljev

Mejnik/cilj			Odgovorno ministrstvo	Ciljna vrednost dosežena	Predložena dokazila	Status po oceni odgovornega ministrstva glede na skrajni rok predviden v uredbi EU 31. avgust 2026
Št.	Šifra	Naziv in ciljne vrednosti				
1.	T16	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov – 30 MW	MZIE	Da		V zaključevanju
2.	T27bis	Prenove stavb - 21.398 m2	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
3.	T27ter	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov - 8.965 m2	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
4.	T33	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov – 5 projektov	MOP	Da		V zaključevanju
5.	T48	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami – 5 projektov	MOP	Da		V zaključevanju
6.	M48bis	Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije	MOP	Da		V zaključevanju
7.	T51	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo – 10 sistemov	MOP	Da		V zaključevanju
8.	T53	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo – 10 sistemov	MOP	Da		V zaključevanju
9.	T68	Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica	MZIE	Da	Da	Izpolnjen
10.	M109ter	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU	MIZM			V zaključevanju
11.	T170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove – 2 ustanovi	MIZM	Da	Da	Izpolnjen
12.	T204	Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo – 516 postelj	MDDSZ			V zaključevanju
13.	T208	Javna najemna stanovanja – 480 stanovanj	MOP	Da	Da	Izpolnjen

eGozdarstvo: manj
administracije, boljši
podatki, več časa za gozd



Evropska sredstva za
boljši dostop do
interneta



V Celju poskrbeli za
zmanjšano poplavno
ogroženost

