



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)

**Poglavje 2:
Obrazec pogodbe, Splošni in posebni pogoji pogodbe
(SKLOP 1: Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza, cestne ureditve)**

Naročnik:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Hajdrihova ulica 28c 1000 Ljubljana
Predmet javnega naročila:	Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)
Vrsta javnega naročila:	Javno naročilo gradenj
Postopek:	Omejeni postopek (41. člen ZJN-3)
Oznaka javnega naročila:	43017-19/2020
Datum:	23.12.2020



POGODBA

za izvedbo projekta »SKLOP 1: Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza, cestne ureditve«
po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)

POGODBA DRSI št.

POGODBA Občina Železniki:.....

POGODBA izvajalca št......

sklenjena med

**NAROČNIKOM IN
INVESTITORJEM:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica ga. Ljiljana Herga (v nadaljevanju naročnik DRSI)
Identifikacijska številka za DDV: SI 75827735

in

SOINVESTITORJEM:

Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, ki jo zastopa župan mag. Anton Luznar (v nadaljevanju soinvestitor Občina)
Identifikacijska številka za DDV: 59920327

in

IZVAJALCEM:

.....
.....ki ga zastopa.....(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
ID za DDV:
Matična številka:
TRR:
(v primeru samostojne ponudbe)

J.V.

.....
.....
(v primeru skupine ponudnikov)

združeni po sporazumu o enotnem nastopu z dne..... po katerem je:

Vodilni partner:

.....
.....ki ga zastopa
.....(v nadaljnjem besedilu vodilni partner)
ID za DDV:



Matična številka:
TRR:

Partner:

.....
..... ki ga zastopa
.....(v nadaljnjem besedilu
partner)
ID za DDV:
Matična številka:
TRR:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je Naročnik dne na Portalu javnih naročil pod št.: objavil javno naročilo za izbor izvajalca po omejenem postopku za **Izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)** na osnovi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.

Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega naročila na podlagi omejenega postopka skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) in Odločitvi o izidu javnega naročila št. .../..... z dne ter v skladu s 33. členom ZJN-3 kot skupno javno naročanje.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode je po pooblastilu izvedlo skupno javno naročilo v imenu in za račun Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) in Občine Železniki (v nadaljevanju Občina).

Pod pojmom »naročnik« se v fazi javnega razpisa pojmuje vse tri (3) naročnike, ki so oddali skupno javno naročilo: Direkcija RS za vode (v nadaljevanju DRSV), Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), in Občina Železniki (v nadaljevanju Občina). Pri izvedbi SKLOPA 1 nastopata kot naročnika DRSI in Občina.

V času izvedbe SKLOPA 1 v imenu obeh naročnikov vlogo naročnika v celoti izvaja Direkcija RS za infrastrukturo.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to Pogodbo Naročnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:

IZVEDBO PROJEKTA »SKLOP 1: PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – I. FAZA, CESTNE UREDITVE«



S to pogodbo prevzeta dela se Izvajalec obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz Poglavja 3 - Tehnične specifikacije, Poglavja 6 – Tehnične specifikacije/posebni del in Poglavja 7 - Ponudbeni predračun ter Izvajalčeve ponudbe št. z dne

Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena od merske enote dogovorjenih del (cena na enoto) in znaša:

Pogodbena vrednost del	EUR
Vrednost DDV	EUR
Pogodbena vrednost del z DDV	EUR

Z besedo:

Vrednost DDV se obračunana po 22 % stopnji.

od tega:

delež MI, DRSI (96,88 % pogodbene vrednosti)	EUR
delež Občine Železniki (3,12 % pogodbene vrednosti)	EUR

4. člen

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.

5. člen

Denarna sredstva za financiranje deleža projekta investitorja so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, št. NRP 2415-06-0045, ter proračunu Občine Železniki na PP 13015.

IV. POGODBENI ROK

6. člen

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del pričeti takoj po uvedbi v delo in vsa Dela dokončati v skladu z naslednjimi pogodbenimi roki oz. vmesnimi roki:



ŠT. MEJNIKA	MEJNIKI	VMESNI ROKI
1.0	terminski in finančni plan dela	28 dni po sklenitvi pogodbe
1.1.	PRIPRAVLJALNA DELA Odsek 1: Cesta od P1 do P18 gradnja težnostnega zidu PZ-1, rolirane brežine	300 dni po sklenitvi pogodbe
1.2	DOKONČANJE DEL Odsek 1: Cesta od P1 do P18 vključno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava izvajalca o dokončanju del in zaprosilom za kvaliteten pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehničnim pregledom ter odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1 člen Splošnih pogojev FIDIC) in tehničnim pregledom (71.člen GZ)	450 dni po sklenitvi pogodbe
2.1	PRIPRAVLJALNA DELA Odsek 2: Cesta od P20 do P48 gradnja težnostnega zidu PZ-1 in PZ-2	300 dni po sklenitvi pogodbe
2.2	DOKONČANJE DEL Odsek 2: Cesta od P20 do P48 vključno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava izvajalca o dokončanju del in zaprosilom za kvaliteten pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehničnim pregledom ter odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1 člen Splošnih pogojev FIDIC) in tehničnim pregledom (71.člen GZ)	450 dni po sklenitvi pogodbe
3.2	DOKONČANJE DEL Odsek 3: Cesta od P18 do P20 in vsa zaključena dela na celotnem sklopu, na vseh odsekih ceste od P1 do P 48 vključno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), izjava izvajalca o dokončanju del in zaprosilom za kvaliteten pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu del, kvalitetnim in tehničnim pregledom ter odpravo bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1 člen Splošnih pogojev FIDIC) in tehničnim pregledom (71.člen GZ)	90 dni po uvedbi v delo
3.3	odprava bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu Odseka 1, Odseka 2 in Odseka 3 (10.1 člen Splošnih pogojev FIDIC) in tehničnem pregledu (71.člen GZ) in izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA O PREVZEMU	28 dni po dokončanju mejnika 3.2
3.4	izvedba vseh pogodbenih obveznosti in IZDAJA POTRDILA O IZVEDBI	90 dni po dokončanju mejnika 3.3

Izvajalec bo za Odsek 1 in Odsek 2 uveden v delo takoj po sklenitvi pogodbe, medtem ko bo za Odsek 3 uveden v delo takoj po izpolnitvi pogojev za pričetek del.

Izvajalec bo za posamezen Odsek uveden ločeno tudi v pripravljalna dela.

Rok za izvedbo vseh del je 720 dni po sklenitvi pogodbe.



7. člen

Do podaljšanja končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- če naročnik ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja do dneva uvedbe v delo;
- če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;
- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila,
- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,
- če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih,
- v soglasju z naročnikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Podaljšanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

8. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 7. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka z navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljšanje roka.

V. PODIZVAJALCI

9. člen

Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:

1.

Naziv:	
Naslov:	
Identifikacijska številka (ID za DDV):	
Matična številka:	



Podizvajalec zahteva neposredna plačila:	DA / NE
Transakcijski račun:	
Zakoniti zastopnik:	
Kontaktna oseba:	
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):	
Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje:	
Vrednost del brez DDV in vrednost del z DDV:	
Kraj izvedbe del:	
Rok izvedbe del:	

10. člen

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v dvajsetih (20) dneh od sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, količina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

11. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.



Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju zahtev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih zahtev.

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

12. člen

V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA

13. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika DRSI za izvedbo te pogodbe je

Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.

Odgovorna oseba naročnika DRSI za izvajanje te pogodbe je vodja projekta pri DRSI:

Djordje Pejanović, univ.dipl.inž.grad.

S strani **Inženirja: JV Projekt d.d. Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Ljubljana** je za **vodjo nadzora** imenovan:

Bojan Berlot, univ.dipl.inž.grad.

S strani Izvajalca je za **vodjo gradnje** imenovan:

.....



14. člen

Izvajalec mora v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe za ves čas trajanja te pogodbe zagotoviti sodelovanje naslednjih oseb:

1. Oseba, ki lahko **nadomešča vodjo gradnje** v skladu z Gradbenim zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščen inženir s področja gradbeništva ali kot vodja del s področja gradbeništva oz. za takšen vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- aktivno govori slovenski jezik,
- je zaposlen pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi
- v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila je kot odgovorni vodja del po Zakonu o graditvi objektov ali kot vodja gradnje v skladu z Gradbenim zakonom sodeloval pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega projekta. Naročnik bo kot referenčni projekt priznal:
 - novogradnjo ali rekonstrukcijo avtoceste in/ali hitre ceste in/ali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali občinske ceste dolžine 1.000 m ali več

Naročnik bo kot gradnjo upošteval gradnjo avtoceste in/ali hitre ceste in/ali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali občinske ceste na podlagi 8. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), s katerim so določeni sestavni del javne ceste ali drugega smiselno in vsebinsko primerljivega predpisa pred uveljavitvijo Zakona o cestah ali v drugi državi članici. Za gradnjo se šteje vsako gradnjo za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje ali dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdano v skladu z zakonom, ki ureja področje cest.

V skladu z veljavno zakonodajo se dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdaja na podlagi 18. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), uporabno dovoljenje se izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) oz. pred uveljavitvijo tega na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13). Za obdobje deset let pred objavo javnega naročila se upošteva datum izdanega dovoljenja.

2. Oseba, ki lahko nastopa kot **vodja del za gradnjo cest** v skladu z Gradbenim zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščen inženir s področja gradbeništva ali kot vodja del s področja gradbeništva oz. za takšen vpis izpolnjuje predpisane pogoje ali
- vpisan je v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS) Slovenije kot vodja del (mojster, delovodja) oz. za takšen vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- je zaposlen pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu
- v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila je kot vodja posameznih del po Zakonu o graditvi objektov (ali kot vodja del v skladu z Gradbenim zakonom) za področje



gradbeništva vodil gradnjo ceste pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega projekta. Naročnik bo kot referenčni projekt priznal katerikoli posel izmed navedenih:

- novogradnjo ali rekonstrukcijo avtoceste in/ali hitre ceste in/ali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali občinske ceste dolžine vsaj 1.000 m ali več.

Naročnik bo kot gradnjo upošteval gradnjo avtoceste in/ali hitre ceste in/ali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali občinske ceste na podlagi 8. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), s katerim so določeni sestavni del javne ceste ali drugega smiselno in vsebinsko primerljivega predpisa pred uveljavitvijo Zakona o cestah ali v drugi državi članici. Za gradnjo se šteje vsako gradnjo za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje ali dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdano v skladu z zakonom, ki ureja področje cest.

V skladu z veljavno zakonodajo se dovoljenje za neomejeno uporabo cest izdaja na podlagi 18. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), uporabno dovoljenje se izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) oz. pred uveljavitvijo tega na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13). Za obdobje deset let pred objavo javnega naročila se upošteva datum izdanega dovoljenja.

Izvajalec mora v 20 dneh od sklenitve pogodbe naročniku predložiti:

- dokazilo o vpisu v imenik pristojne zbornice za vsako posamezno osebo,
- kopijo pogodbe, na podlagi katere ima zagotovljeno sodelovanje vsake posamezne osebe,
- referenčno potrdilo za vsak naveden referenčni posel.

Naročnik lahko od izvajalca zahteva predložitve dodatnih listin glede izpolnjevanja zahtev iz tega člena.

VII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

15. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. členu te Pogodbe, so sestavni del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni:

- (1) Pogodba (pogodbeni sporazum)
- (2) Posebni pogoji Pogodbe
- (3) Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga, 1999)
- (4) Tehnične specifikacije
- (5) Ponudba in Dodatek k Ponudbi
- (6) Ponudbeni predračun
- (7) Načrti
- (8) Terminski in finančni plani



- (9) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
(10) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe

Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.

VIII. GARANCIJSKI ROK

16. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša:

- Za konstrukcije
(kot so premostitveni objekti, podvozi, oporni in podporni zidovi, kamnite zložbe, prepusti, betonske varovalne ograje,...),
vodotesnost objektov in hidroizolacije 10 let
- Prometna signalizacija
 - Označbe na vozišču
 - debelo slojne talne označbe 3 leta
 - tankoslojne talne označbe 1 leto (od drugega nanosa)
 - vertikalna signalizacija
 - prometni znaki in smerniki
 - postavitvev znakov in smernikov 5 let
 - s folijo I. klase (IG) 7 let
 - s folijo II. klase (HI) 10 let
 - Varnostno - odbojna ograja, protihrupna ograja
 - postavitvev 5 let
 - kvaliteta ograje 10 let
- Za vsa ostala razpisana dela 5 let

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Pred izdajo "Potrdila o izvedbi", bo Izvajalec predložil Naročniku Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del in jo nato po potrjeni končni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil.

V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejšnjem odstavku, ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo



pogodbenih obveznosti v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak in jo uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca.

17. člen

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva Naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva Naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi Naročnik Izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti bančno garancijo.

IX. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

X. RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:



- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XI. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:

- Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;
- Zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti.
- Odločb Inženirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v času oddaje ponudbe kadri, na katere se je Izvajalec skliceval v ponudbi, niso bili člani Inženirske zbornice Slovenije.
- Dokazila o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v ponudbi, ki niso državljani Republike Slovenije. Dokazila morajo biti izdana s strani uradno pooblašene institucije v Republiki Sloveniji.
- Zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo ponudbe v primeru, da pri izvedbi naročila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture);
- Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.



Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v 20-ih dneh od sklenitve Pogodbe.

Pravice in obveznosti iz Pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

21. člen

Pogodbene stranke se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) strinjajo, da izvajalec svojih terjatev ne sme prenesti na drugega.

22. člen

Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 20. člena te pogodbe. Vsaka pogodbeni stranka prejme po dva (2) izvoda pogodbe.

Za datum sklenitve te Pogodbe se šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC (vodilni partner v primeru skupine ponudnikov):	INVESTITOR: Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo Ljiljana Herga direktorica
PARTNER 1:	SOINVESTITOR: Občina Železniki Anton Luznar župan
PARTNER 2:	

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Ponudnikov žig:



SPLOŠNI POGOJI IZJAVA

Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z določili **Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga)**, ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel: +41 227 994 905
Fax: +41 227 994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
<http://www.fidic.org>

Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP
Dimičeva ul. 13
1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254
Fax: +386 01 58 98 100
<http://www.gzs.si>

Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), in z njo tudi razpolaga. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, pravnomočno podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščen za podpis ponudbe.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Ponudnikov žig:



POSEBNI POGOJI

SPLOŠNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem iz Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga).

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.



1 SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Definicije

1.1.1 Pogodba

Podčlenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:

»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podčlenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:

»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Podčlenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina

»Zahteve naročnika« pomeni tudi Tehnične specifikacije oz. Projektna naloga oz. dokumentacija z zvezi z oddajo javnega naročila in obratno.

Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:

»**Ponudba**« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec).

1.1.2 Stranke in osebe

Podčlenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:

»**Naročnik**« je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga

»**Soinvestitor**« je Občina Železniki, ki jo zastopa župan mag. Anton Luznar

Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»**Inženir**« ali »**Svetovalec**« ali »**Nadzornik**« izvaja storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu.

»**Odgovorni inženir**« je pooblaščen predstavnik Inženirja, imenovan v pogodbi. Določila podčlena 3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja oz. tudi na druge zaposlene pri inženirju za katere Inženir s pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca, da je osebje Inženirja, ki sodeluje pri realizaciji Pogodbe.

Odgovorni inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. členom GZ.

Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»**Osebe naročnika oz. pooblaščen predstavnik naročnika**« pomeni odgovorno osebo naročnika pooblaščen za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, navedenega v pogodbi oz. drugo osebo Naročnika, za katerega Naročnik obvesti Izvajalca, da je to osebo Naročnika.



Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo:

- 1.1.2.11 **»Skupina ponudnikov - Joint Venture«** pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.
- 1.1.2.12 **»Organ upravljanja«** je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje

Podčlen 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in za brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.

1.1.4 Denar in plačila

Podčlen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbena cena« pomeni ceno, določeno v podčlen 14.1 Pogodbena cena in vključuje prilagoditve v skladu pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se upošteva »Pogodbena vrednost del z DDV«, kot je določena v v 3. členu Pogodbe.

Podčlen 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem plačilu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

Podčlen 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi:

»Več dela oziroma presežna dela« so količina izvedenih del, ki presegajo ocenjene količine del. Obračunavajo se na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer z uporabo predračunskih postavk iz Ponudbe Izvajalca z upoštevanjem popusta, ob uporabi določil osnovne Pogodbe.

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja Naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti Inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži Naročniku.

1.1.6 Druge definicije

Podčlen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:



»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in podzakonske akte Republike Slovenije.

Doda se podčlen 1.1.6.10, ki se glasi:

1.1.6.10 »**Gradbeni dnevnik**« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

1.3 Sporočanje

Podčlenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«



1.4 Pravo in jezik

Podčlen 1.4 se spremeni, tako da se glasi:

V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.

1.5 Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zaporedju določenem v Pogodbi (Pogodbenem sporazumu).

1.6 Pogodbeni sporazum

Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdelava na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavlja 2 dokumentacije z zvezi z oddajo javnega naročila.

1.13 Skladnost z zakoni

Zbriše se prva alineja (a) podčlena 1.13.



2 NAROČNIK

2.2 Dovoljenja, licence in soglasja

Drugi odstavek (b) podčlena 2.2 se izbriše. Za prvim odstavkom se doda naslednja vsebina:

Naročnik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo. Dokumentacijo bo prejel ob uvedbi v delo za vsak odsek posebej.

Naročnik bo za izvedbo del pridobival delna gradbena dovoljenja. Delna gradbena dovoljenja bodo izdana predvidoma ločeno za vsak posamezen pododsek oz. kadar bo mogoče, za odsek.

Veljavno gradbeno dovoljenje (ali več njih), ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji mora biti zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in ga je potrebno predati naprej izvajalcu skupaj z obvestilom o datumu začetka del.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na račun njegovih stroškov.

2.5 Zahtevki naročnika

Za zadnjim odstavkom podčlena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Če naročnik oceni, da ima inženir zaradi neupravičenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov izvajalca podanih v skladu z 20 podčlenom (Zahtevki, spori in arbitraža) dodatne stroške, je izvajalec dolžan kriti stroške dodatnega dela inženirja. Dodatni stroški dela se obračunajo v primeru, da gre za očitno neupravičene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10% pogodbene vrednosti. Stroški dela inženirja se obračunajo po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naročnik. Urna postavka inženirja je priporočena cena projektantske ure projektanta za inženirske storitve (IZS, januar 2018) in znaša 47 EUR ter DDV.

Doda se nov podčlen 2.6, ki se glasi:

2.6 Splošne obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja Del za posamezen Odsek Izvajalca uvesti v delo s tem, da mu izroči:

- Vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, v enem (1) izvodu (tiskanem ali elektronskem),
- zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet te Pogodbe v skladu s terminskim planom,
- gradbeno dovoljenje oz. delno gradbeno dovoljenje,
- oz. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek Del.

V kolikor naročnik za posamezen odsek ne bo uspel pridobiti vseh dokazil za razpolaganje z zemljišči in bo pridobil delno gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela za posamezen



odsek, je izvajalec dolžan pričeti z deli na pripravljalnih delih.

V primeru, da naročnik ne pridobi gradbenega dovoljenja ali delnega gradbenega dovoljenja za posamezen odsek, lahko naročnik ali inženir s pisnim dopisom izvajalca obvesti o odloženem pričetku del za obdobje do 12 mesecev. Izvajalec se zavezuje dela izvesti v okviru predvidenih ponudbenih cen brez, da bi bil zaradi odloženega pričetka del upravičen do dodatnega plačila.

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Naročnikovega / Inženirjevega poziva Izvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo. Izvajalec se mora takšnemu pozivu nemudoma odzvati, najkasneje pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo štelo, da je izvajalec uveden v delo, razen če se naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naročnik po v takšnem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo.



3 INŽENIR

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena 3.1 se doda:

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:

- (a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe;
- (b) odobril (potrdil) stroške, določene v podčlenu 4.12, 13 in 20.1;
- (c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;
- (d) odobril spremembe in prilagoditve po podčlenu 13;
- (e) določil cene po podčlenu 12.

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.

3.4 Zamenjava inženirja

V prvem stavku 3.4 podčlena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora **najmanj 42 dni** pred nameravanim datumom,.....

sedaj glasi:

Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora **najmanj 21 dni** pred nameravanim datumom,.....



4 IZVAJALEC

4.1 Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu podčlena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Naročniku oziroma Inženirju, ki ga bo imenoval Naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1. da bo dela izvršil kvalitetno v skladu s Tehničnimi specifikacijami in Popisom del ter zahtevami naročnika iz Pogodbe;
2. da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;
3. da v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neažurnega dela na zahtevo naročnika zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in sicer s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;
4. da bo pred pričetkom del izdelal tehnološki elaborat del, katerega potrdi Inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavlja 3 – Tehnične specifikacije.
5. da bo vsaj 10 dni pred začetkom izvajanja gradnje Inženirju in v vednost Naročniku posredoval izpolnjen obrazec Prijava začetka gradnje s prilogami skladno s 63. členom GZ, ki ga v nadaljevanju Naročnik ali Inženir posreduje pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve;
6. da bo vsaj 18 dni pred začetkom del Inženirju in v vednost Naročniku posredoval izpolnjen obrazec Prijave gradbišča v skladu s 5. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih odrih, ki ga v nadaljevanju Inženir posreduje inšpekciji za delo;
7. da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del
8. da bo izvedel zakoličbo;
9. da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe naročniku posredoval podroben terminski in finančni plan, predhodno potrjen s strani Inženirja;
10. da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;
11. da bo naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti,
12. da bo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa,
13. da bo Dela izvršil skladno z izdanimi gradbenimi dovoljenji in projektno dokumentacijo za izvedbo ;
14. da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inženirja;
15. da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;
16. da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča; pred



pričetkom del predal naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom

17. da bo na posameznih zemljiščih, na katerih ima naročnik z lastnikom zemljišča sklenjeno Pogodbo o ustanovitvi služnosti (ali je bila izdana odločba UE), dela izvajal skladno z vsebino te pogodbe, upošteval vrsto in obseg služnosti ter določbo o vrnitvi zemljišča v prvotno stanje
18. da bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče
19. da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec
20. da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi naročnik; sestavni del poročila je tudi vsakokratno ažuriran terminski načrt izstavljanja računov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh računov, podatki o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo;
21. da bo Naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
22. da bo izdelal projekt izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja zemljišča po dokončani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki vključuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje ter monitoring,
23. da bo kopijo prijave začetka gradnje namestil na vidno mesto;
24. da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja obveščanja in informiranja javnosti;
25. da bo gradbišče in vso izdelano projektno dokumentacijo označeval v skladu z »Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 – 2020« in zagotovil postavitev in vzdrževanje dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU,
26. da bo ob zaključku gradnje postavil spominsko tablo v skladu z »Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 – 2020«,
27. da bo z gradbenimi odpadki na gradbišču ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
28. da bo po pooblastilu naročnika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list;
29. da bo naročniku izročil končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi;
30. da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja;
31. da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča) in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj



- že pridobljenega zemljišča za gradnjo;
32. da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v razpisnih pogojih navedeno drugače;

Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbeni dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.

Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga postavi Naročnik, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovčitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naročnik tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

4.2 Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi:

"Izvajalec bo Naročniku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 20 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije. Kopijo garancije bo poslal tudi Inženirju.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti garant v garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala banka v Republiki Sloveniji.

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo.

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za odstotek povečanja pogodbene cene. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja."

Izvajalec mora zagotoviti, da je **Garancija za dobro** izvedbo veljavna in izterljiva še **150 dni** po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko



garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

Pred izdajo **Potrdila o izvedbi**, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti izvršenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano **Potrdilo o izvedbi**, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

4.3 Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek:

»Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela na terenu. Knjigo obračunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje.«

4.4 Podizvajalci

Podčlen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi oz. zamenjavi podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naročanja. V primeru, da Izvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi priložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga želi zamenjati.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je šteti:



- okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;
- potreba po več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;
- specialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;
- časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbeni dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s Pogodbo.

Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni službi Naročnika. Le-ta vlogo s predlogom v roku 14 ni ponovno preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev predlaga izdajo soglasja k predlogu Izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu Izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrnil predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.

4.9 Zagotavljanje kakovosti

Podčlen 4.9 se spremeni tako, da se glasi:

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in sicer zlasti:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
- Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS št. 59/1999)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011)
- Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/13)
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l. RS, št. 17/2011)

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah, ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oz. Ministrstvo za infrastrukturo (od leta 2000 dalje). Le te so na voljo na spletni strani:

<https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnice-specifikacije-za-cestel/>



Tehnične specifikacije za ceste predstavljajo tehnične standarde, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije in izvedbi. Na voljo so aktualne tehnične specifikacije, tiste, ki so v pripravi ter ukinjene tehnične specifikacije za ceste.

Pri projektiranju premostitvenega objekta je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde (kot npr. SISI EN 1337 za ležišča, SISI EN 1317 za varnostne ograje,.). Projektant naj upošteva tudi TSC 07 Smernice za projektiranje premostitvenih objektov

4.18 Varstvo okolja

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v soglasjih in gradbenem dovoljenju.

Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnološko – ekonomskem elaboratu.

Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal načrt monitoringa hrupa, zraka, vibracij, podtalnice, površinskih voda in rastlin. Stroške za izdelavo načrta monitoringa, tehnološko ekonomskega elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik zajel v cenah na enoto mere.

Pred pričetkom del mora Izvajalec izvesti posnetek ničelnega stanja okolja (hrupna obremenjenost, prašne usedline, vibracije, vodni režim, kvaliteta vodotokov in rastlin) in evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno – energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Pred pričetkom gradnje mora Izvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih, gospodarskih) v območju gradbišča in obvoznih poti in izvesti posnetek ničelnega stanja na teh objektih (foto in video tehnika) in med gradnjo spremljati stanje na teh objektih.

Za preprečitev oz. sanacijo poškodb zaradi vibracij na objekte je Izvajalec dolžan:

- pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja,
- takoj zagotoviti sanacijo nastalih poškodb.

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima Izvajalec naslednje obveznosti:

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
- pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo,



- opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo,
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in same gradnje,
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,
- zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku,
- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno – energetske oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno – energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci in dobavitelji komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija);
- si pred pričetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti. Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč,
- sprotno rekultivirati območja posegov,
- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,
- preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),
- upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov (energetski infrastrukturi) pod napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,
- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb,
- varovati objekte in območja kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo - čez objekte in območja KD ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, ipd.,
- med gradnjo mora izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporiščih nadzemnih vodov ne sme biti zmanjšana statika oporišč,



- izvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)
- izvajati dela v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)
- izvajati dela v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1),
- izvajati dela v skladu z določili Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)
- upoštevati posebne zahteve navedene v Poglavju 3 – Tehnične specifikacije.

Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, grede v odgovornost in breme Izvajalca.

4.19 Električna, voda in plin

Prvi in zadnji odstavek 4.19 podčlena se izbrišeta. Doda se besedilo:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del.

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta.

5 IMENOVANI PODIZVAJALCI 5. člen se v celoti izbriše

6 KADRI IN DELAVCI

6.5 Delovni čas Na koncu podčlena 6.5 se doda besedilo:

Pogodbena dela se izvajajo vse svetle dele dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (v nadaljevanju dela prosti dnevi, določeni s predpisi), pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami (glej preglednico).

Obdobje leta	Polne ure dneva
1. januar – 27. januar	8:00 – 17:00 h
28. januar – 19. februar	8:00 – 17:00 h
20. februar – 8. marec	7:00 – 17:00 h
9. marec – 22. marec	7:00 – 18:00 h
23. marec – 23. april	6:00 – 18:00 h
24. april – 21. avgust	6:00 – 19:00 h
22. avgust – 21. september	6:00 – 19:00 h
22. september – 30. september	6:00 – 19:00 h
1. oktober – 24. oktober	7:00 – 17:00 h
25. oktober – 13. november	7:00 – 17:00 h
14. november – 31. december	8:00 – 17:00 h



Sprememba delovnega časa je mogoča le zaradi spoštovanja pogojev iz gradbenega dovoljenja (npr. posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih zakonskih omejitev.

Po potrebi se morajo dela v času, ko je to mogoče, izvajati tudi na več odsekih hkrati.

V primeru potreb gradnje pa na zahtevo Inženirja tudi 24 ur na dan.

6.7 Zdravje in varnosti

Prvi odstavek 6.7 podčlenen se nadomesti z naslednjo vsebino:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebe v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19 morajo biti prisotni na gradbišču dnevno evidentirani. Inženirju in Naročniku morajo biti na razpolago tudi vsi podatki o prisotnih na gradbišču v skladu z vsakokratnimi ukrepi za preprečevanje epidemije.

6.9 Osebe izvajalca

Doda se podčlen, ki se glasi:

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebe izvajalca oblačila označena z logotipi podjetja, kjer je zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoče slediti izvajanju določil iz prvega odstavka podčlena 6.7.

6.12 Tuji kadri in delavci

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebo, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da ima to osebo potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.



7 OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

7.1 Način izvedbe

Na koncu Podčlena 7.1 se doda besedilo:

"Pred pričetkom Del bo Izvajalec na gradbišču zagotovil na svoj strošek laboratorij, z ustrežno atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo Inženirja, z namenom izvedbe preiskav na gradbišču, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."

7.4 Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

7.8 Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

(c) začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.



8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

8.1 Začetek del

Prvi stavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec prične z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku **osemindvajset (28) dni** po sklenitvi pogodbe.

8.3 Program

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s podčlenom 8.1 [*Začetek del*] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe inženirju posredovati podroben terminski plan za vsak posamezen Odsek.

Pri pripravi terminskega plana mora upoštevati, da bo za gradnjo Odseka 2 in 3 uveden kasneje in da bo za posamezne Odseke uveden ločeno tudi v pripravljala dela (težnostni zidovi PZ-1, PZ-2 in rolirana brežina).

Izvajalec bo za Odsek 1 uveden v delo takoj po sklenitvi pogodbe, medtem ko bo za Odsek 2 in 3 uveden v delo takoj po izpolnitvi pogojev za pričetek del (pridobitvi gradbenega dovoljenja).

Izvajalec mora pri načrtovanju terminskega plana upoštevati, da bo sočasno potekala tudi gradnja na Sklop 2 in delo v največji možni meri organizirati tako, da ne bo moten terminski plan gradnje sklopa 2.

Za točko (d) podčlena 8.3 se doda besedilo:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanaša na terminski plan. Tudi Finančni plan – plan realizacije po mesecih.

V terminskem planu naj bodo ločeno in podrobno obdelan način napredovanja del pri gradnji težnostnih zidov (PZ-1 in PZ-2), ki mejita na območje gradbišča Sklopa 2.

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje

Točka (a) podčlena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(a) spremembe (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev roka za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (Postopek spremembe)) ali kakšne druge bistvene spremembe v količini neke postavke del, ki jo zajema Pogodba v primeru, ko količina več Del preseže 10 % pogodbene vrednosti Del brez razlik v ceni po določilih 13.7 in 13.8. člena Splošnih pogojev;

Točka (c) podčlena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v času izvajanja Pogodbe, ki bi presegli 30 letno povprečje za več kot 30 % glede števila deževnih dni ali količino padavin, po podatkih najbližje hidrometeorološke postaje.



8.7 Odškodnina za zamudo

Podčlena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Če Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih vmesnih rokih (M2 in M3) ali v dogovorjenem roku za dokončanje, je dolžan plačati Naročniku pogodbeno kazen 2‰ (dveh promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Če Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pripravljalnih del na odseku 2: Cesta od P20 do P48, tj. gradnje težnostnega zidu PZ-1 in PZ-2, se zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,75% od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar skupaj ne več kot 15% vrednosti pogodbenih Del z DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 15 % (petnajst odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Če je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta naročila ni mogoče uporabljati v času garancijskega roka, je dolžan Izvajalec plačati Naročniku pogodbeno kazen 2‰ (dveh promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoče uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmožnosti uporabe objekta ne more presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 15.000,00 (petnajsttisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 1% vrednosti pogodbenih del z DDV.

V primeru, da izvajalec v roku 15 dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaže naročniku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 0,5% za vsak dan do predložitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 10% vrednosti pogodbenih del z DDV.

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode Naročniku. Povračilo tako nastale škode bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9 PRESKUSI OB DOKONČANJU

9.1 Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podčlena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehničnih specifikacij in veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo uporabnih dovoljenj v roku, določenem v Dodatku k ponudbi.



10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.1 Prevzem del in odsekov del

Alineja (a) 3 odstavka podčlena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:

- (a) izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokončani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjša še neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake odpravljene); ali

Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju:

- projekt izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja zemljišča po dokončani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki vključuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje ter monitoring,
- potrjene Gradbene dnevnike in Knjige obračunskih izmer,
- počistiti in odstraniti vso opremo, odvečni material, ruševine, odpadke in začasna dela s tistega dela gradbišča na katere se potrdilo o izvedbi nanaša.

Podčlen 10.2 – Prevzem delov del

Besedilo drugega odstavka podčlena se briše.

V tretjem odstavku se briše navedba »ali uporabe«.



11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE

11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo »**Potrdila o izvedbi**« naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora znašati **10 let** v obliki bančne garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala banka v Republiki Sloveniji.

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati na zahtevo naročnika tudi do 24 ur na dan.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.



12 MERJENJE IN OCENA

12.1 Merjenje del

Podčlenu 12.1 se doda besedilo, ki se glasi:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del morajo biti evidentirane skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ). Priloga knjige obračunskih izmer mora biti tudi fotodokumentacija izvedenih del vseh faz gradnje.

12.2 Način merjenja

Doda se naslednji odstavek:

"Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani, se bodo merile v skladu z določili navedenimi v Poglavju 3 (Tehnične specifikacije) razpisne dokumentacije«.



13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.



14 POGODBENA CENA IN PLAČILO

14.2 Predplačila

Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil.

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljenega dela bo Izvajalec obračunal po cenah za enoto iz Ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Opravljenega dela bo izvajalec obračunal na podlagi z Inženirjem predhodno usklajene in potrjene vmesne situacije, situacije ob dokončanju in končne situacije.

Račun s priloženo potrjeno začasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naročniku v potrditev v roku osem (8) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Kot dan opravljenih storitev (gradbenih Del) se šteje zadnji dan v mesecu.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Potrjene začasne in končne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v 3 izvodih v roku v roku osem (8) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa plačati trideseti (30) dan od prejema. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane.

V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne situacije in končna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naročnik Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačila pa izvedena na transakcijski račun le-tega.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil potrjene račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča Naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.



Naročnik je dolžan namesto Izvajalca poravnati Podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, za kar Podizvajalec predloži pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu računu oz. situaciji priložil izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitna dodatna Dela naročena s strani Naročnika, ki so vpisana v Gradbeni dnevnik in potrjena s strani Inženirja, bosta pogodbenika pred izčrpanjem sredstev po tej Pogodbi oziroma po zahtevi Naročnika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri čemer bosta ceno za to Delo določila na podlagi pogodbeno določenih režijskih cenikov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodnih potrditvi zahtevka Izvajalca, podanega v skladu z določilom podčlena 20.1 Splošnih pogojev pogodbe.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Točki (d) in (e) drugega odstavka podčlena 14.3 se črtata.

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

Črta se prvi odstavek podčlena 14.6 in nadomesti:

Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Garancije za dobro izvedbo.

Izvajalec mora do konca meseca za tekoči mesec dostaviti inženirju osnutek vmesne situacije. Inženir do petega (5.) dne v naslednjem mesecu pregleda in potrdi situacijo ter izda izvajalcu Potrdilo o vmesnem plačilu s priloženimi ustreznimi dokumenti. Izvajalec do osmega (8.) dne v naslednjem mesecu izstavi račun naročniku, katerega priloge so Potrdilo o vmesnem plačilu in Vmesna situacija.

V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki

Izvajalec mora v 58 dneh po prejemu Potrdila o prevzemu del inženirju predložiti obračun situacije ob dokončanju, inženir nato v 28 dneh izda Potrdilo o vmesnem plačilu z ustreznimi dokumenti. Izvajalec v 8 dneh po prejemu Potrdila o vmesnem plačilu izstavi račun naročniku, katerega priloge so Potrdilo o vmesnem plačilu in obračun situacije ob dokončanju.

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inženirju predložiti osnutek končnega obračuna. Če se inženir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka končnega obračuna, mu mora izvajalec predložiti podatke, kot jih lahko inženir upravičeno zahteva, in mora napraviti popravke v tem osnutku tako, kot se z inženirjem dogovorita. Izvajalec mora v 56 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inženirju predložiti dogovorjeni končni obračun in dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po Pogodbi ali v zvezi s Pogodbo. Inženir mora v 28 dneh po prejemu končnega obračuna in dokumenta o končni poravnavi naročniku izstaviti Potrdilo o končnem plačilu, izvajalec nato



v 8 dneh izstavi račun naročniku, katerega priloge so končni obračun in Potrdilo o končnem plačilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov. V primeru ugotovljenih nepravilnosti in kršitev si pridržuje pravico zavrni račun.

14.7 Plačilo

Črta se točka (a) Podčlena 14.7. Točka (b) in (c) se spremenita tako, da se glasita:

- (b) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu 30. dan po tem, ko naročnik prejme elektronski račun, vsebinsko in vrednostno skladen z obsegom opravljenih del;
- (c) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o končnem plačilu 30. dan po tem, ko naročnik prejme elektronski račun, vsebinsko in vrednostno skladen z obsegom opravljenih del.

14.11 Prošnja za potrdilo o končnem plačilu

Črta se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora **v 30 dneh** po prejemu Potrdila o izvedbi inženirju predložiti šest (6) izvodov osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:

- (a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
- (b) vse nadaljne vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače.

V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentiranih vrednosti).

14.15 Valute plačil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeči stavek:

Obračunska valuta v pogodbi je EUR.

Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v eurih (EUR) na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.



17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST

17.1 Odškodnine

Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena.

Na koncu 17.1. podčlena se doda stavek:

Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v členu 17. za ves čas trajanja pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

18 ZAVAROVANJE

18.1 Splošne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podčlena 18.1, ki se glasi:

Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo, s pooblaščenimi zavarovalnimi družbami, ki jih je odobril Naročnik in v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Rok za predložitev zavarovanja je **dvajset (20) dni** po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 podčlenom Splošnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek podčlena 18.2, ki se glasi:

Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je določen v Dodatku k Ponudbi.

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in je strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

19 VIŠJA SILA

Doda se nova podtočka 19.2, ki se glasi:

19.2 Višja sila

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob



sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v treh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot višja sila ne upošteva epidemija virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19.

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

20.1 Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati **Naročniku** in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.

Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca iz te ponudbe. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.

20.6 Arbitraž

(a) točka prvega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:

»je treba spor dokončno rešiti v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, s sedežem arbitraže v Ljubljani. Glede vsebine spora se bo uporabljalo pravo Republike Slovenije.«

DODATNI ČLENI

Doda se 21 člen s podčleni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21 DAJATVE

21.1 Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj Naročnikove države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajalčeve opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi.



21.2 Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na Izvajalčevo opremo, naprave, materiale in proizvode (stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno določilo Pogodbe ne razreši Izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so v državi Naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova Pogodbe.

21.3 Dajatve na dohodek za osebje


Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v Republiki Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki bodo v tem času v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo naloženo s temi zakoni in predpisi.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Ponudnikov žig:

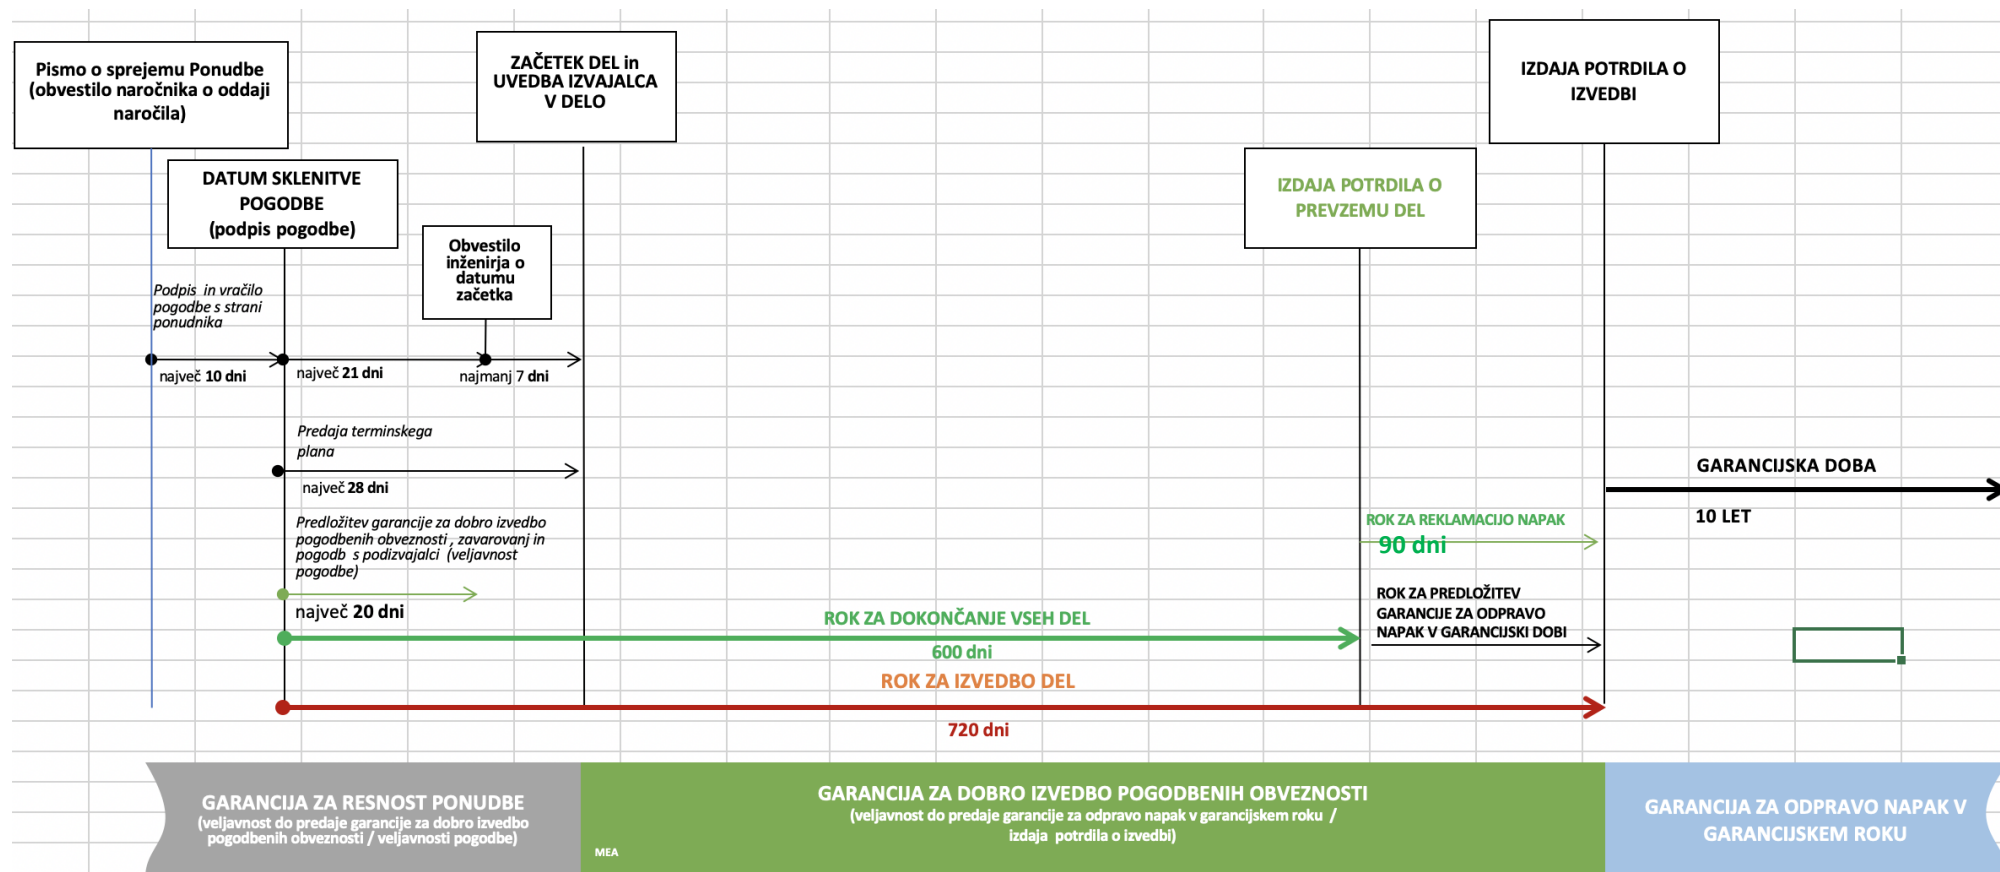

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Diagramom zaporedja dogodkov ter soglašamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa: _____



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE



VEČJA
POPLAVNA
VARNOST
ŽELEZNIKOV




EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST


Ponudnikov žig:



VSAKO MESEČNO PLAČILO (ZAČASNA SITUACIJA)

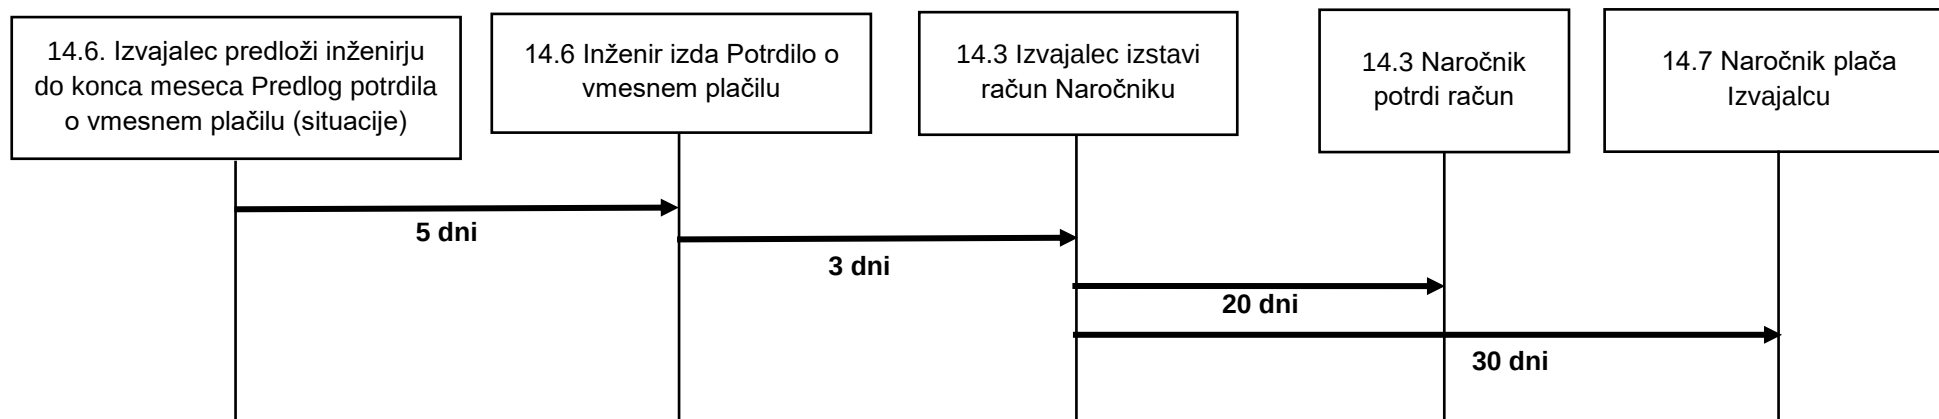


SITUACIJA OB DOKONČANJU

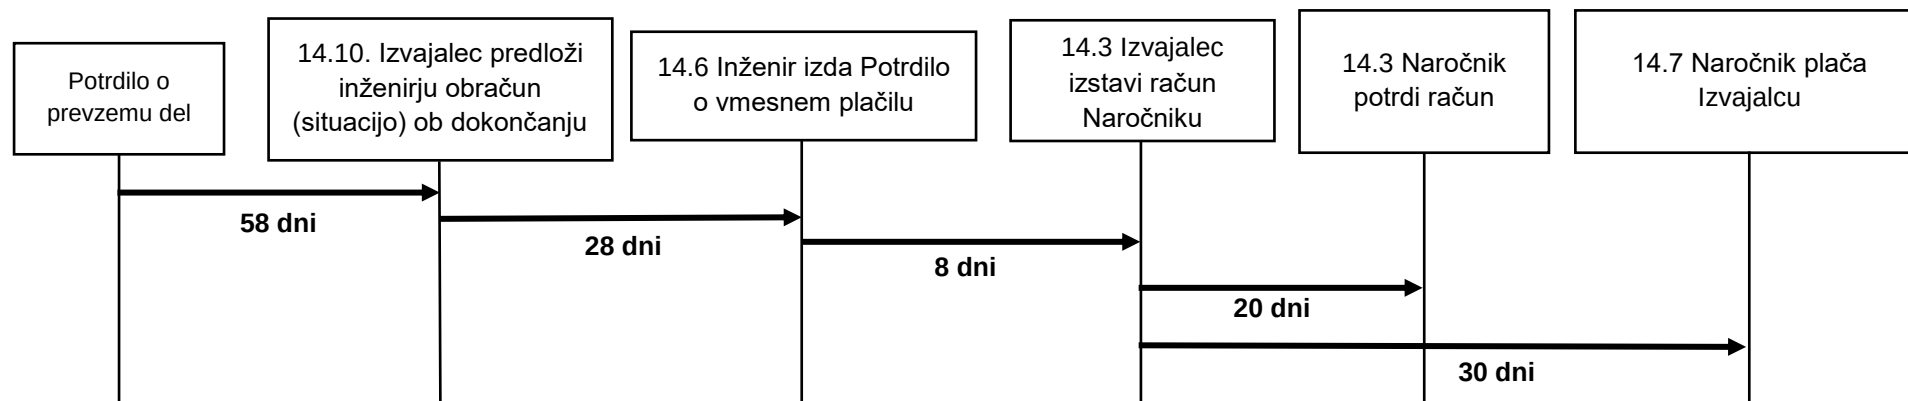



KONČNO PLAČILO (KONČNA SITUACIJA)

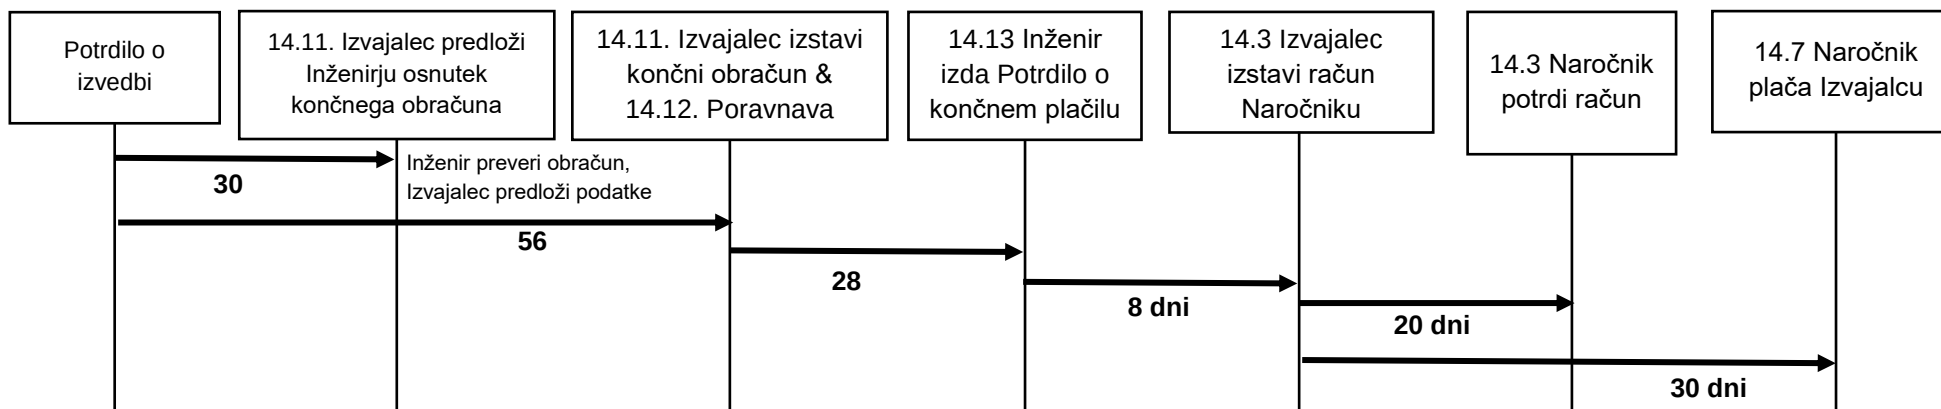

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Običajnim zaporedjem plačilnih dogodkov ter soglašamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Ponudnikov žig: _____
